Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

PARA: Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

Sra. Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
Responsable de realizar el Seguimiento y Evaluacion de las Recomendaciones de la Contraloria

ASUNTO: Adjuntando Información para el Cumplimiento a las Recomendaciones Nros. 03, 05, 07, 08, 14, 17 y 20, de la Contraloría General del Estado.

Saludos cordiales,

En cumplimiento al Memorando Nro. GADMCL-A-2026-3992-M-GD, de fecha 04 de agosto de 2026, suscrito por la máxima autoridad en el cual hace referencia al Memorando Nro. GADMCL-GPS-2026-0474-M-GD, de fecha 30 de julio de 2026, suscrito por la Abg. Paola Villafuerte - RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA, DISPONGO a ustedes, de manera inmediata, trabajen exclusivamente en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes contenidas en el Informe Nro. DPO-0007-2025, así como a la recopilación, revisión y validación de los medios de verificación correspondientes. Para el efecto, se concede un plazo máximo e improrrogable hasta el día 12 de agosto de 2026, fecha en la que deberán remitir la totalidad de los medios de verificación y documentación de respaldo debidamente organizada y completa.

En virtud de lo anteriormente indicado, y a fin de dar cumplimiento, en calidad Director remito información recopilada por la ing. Carol carrera ex-SP6 - Analista de Obras Publicas en calidad de Fiscalizadora y Administradora de Contratos de obra del GAD Municipal del Cantón Loreto, presento la siguiente información:

- **RECOMENDACIÓN No. 03.-**"A los servidores designados como Fiscalizadores de contratos de obra, en los casos que identifiquen errores u omisiones en los planos y/o diseños, justificar las modificaciones que hicieren falta, en base a criterios técnicos y en coordinación con los responsables de su elaboración, así como someter a aprobación por parte de las instancias correspondientes, previo a autorizar y controlar su aplicación en obra; y, a los administradores, supervisar su cumplimiento."

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

En calidad de Fiscalizadora de la obra correspondiente al procedimiento COTO-GADML-2025-01, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30x40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI", se efectuó la revisión y análisis técnico de la documentación del proyecto previo al inicio de los trabajos. Como resultado de dicha revisión se identificaron errores, omisiones e inconsistencias en planos y documentación técnica, respecto de los cuales se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones técnicas para su subsanación previo al inicio de la obra. El memorando de Fiscalización evidencia el análisis de planos estructurales, implantación, memoria de cálculo, cargas de viento y demás documentación, complementado con inspección en sitio.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
05/03/2026 al 14/04/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD, de 05/03/2026.
2. Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD, de 14/04/2026.

- **RECOMENDACIÓN No. 05.-** "Cuando se designe o contrate fiscalizadores externos, se les disponga, revisar en conjunto con los diseñadores, los planos y estudios, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción, y de ser el caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Esta disposición se recomienda impartir a los Administradores de Contratos para que supervisen el cumplimiento."

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:
En calidad de Administradora del Contrato MCO-GADML-2025-03, correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO…", se realizó el seguimiento y supervisión de la revisión de la documentación estructural del proyecto, en coordinación con Fiscalización y el Proyectista. Ante la identificación de un error en la denominación de los diámetros de los estribos de las columnas, que incidía en el volumen de acero de refuerzo, se dio seguimiento a la actualización de los cálculos y planos estructurales. Posteriormente, mediante Acta de Reunión de Trabajos Nro. 01, se formalizó la solución técnica adoptada, dejando constancia del uso de estribos de Ø10 mm en columnas y vigas superiores del escenario, en cumplimiento de la normativa estructural, solución incorporada posteriormente en los planos AS-BUILT.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

20/02/2026 al 24/04/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD, de 20/02/2026, y anexos técnicos.
2. Acta de Reunión de Trabajos Nro. 01, de 24/04/2026.
3. Planos AS-BUILT de la obra MCO-GADML-2025-03.

- **RECOMENDACIÓN No. 07.-** Recomendación dirigida a los servidores designados y/o miembros de las Comisiones Técnicas, respecto de verificar que la documentación presentada por los oferentes se ajuste a los requisitos establecidos en los pliegos, para determinar su cumplimiento y continuidad en el procedimiento.

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:
En calidad de Presidenta de la Comisión Técnica del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, se efectuó la revisión y verificación de la documentación presentada por el oferente, de conformidad con los requisitos mínimos y condiciones establecidos en los pliegos. La Comisión Técnica verificó la integridad de la oferta, la existencia de errores susceptibles de convalidación y, posteriormente, el cumplimiento de los requisitos mínimos y parámetros de evaluación establecidos en los documentos precontractuales, dejando constancia de los resultados en las respectivas actas y en el Informe de Recomendación para Adjudicación. El Acta 004 deja constancia de la verificación de integridad y requisitos mínimos, mientras que el Acta 005 señala que se verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes y condiciones técnicas, legales y económicas exigidas.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
13/07/2026 al 04/08/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Acta de Designación de Secretaria de la Comisión Técnica, de 13/07/2026.
2. Acta Nro. 004 – Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, de 23/07/2026.
3. Acta Nro. 005 – Evaluación y Calificación por Puntaje, de 04/08/2026.
4. Informe de Recomendación para Adjudicación del procedimiento LICO-GADML-2026-03.

- **RECOMENDACIÓN No. 08.-**"Dispondrá a los servidores que actúen como Fiscalizadores de contratos de obra, verificar que los trabajos incluidos en las planillas cuenten con todos los anexos y demostrativos de cálculo, y, a los Administradores de los Contratos, supervisar su cumplimiento."

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:
En calidad de Fiscalizadora del contrato COTO-GADML-2025-01, se verificó que los trabajos incluidos en las planillas de avance de obra cuenten con los respectivos anexos de cantidades y demostrativos de cálculo que sustentan técnicamente las cantidades ejecutadas y planilladas. Esta verificación se materializó mediante la revisión y suscripción de las planillas y sus anexos, en los cuales se detallan dimensiones, elementos, cantidades ejecutadas, acumuladas y cantidades a cobrar.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
07/05/2026 al 30/06/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Acta de Inicio de Obra del contrato COTO-GADML-2025-01.
2. Informe de Fiscalización Nro. 001-GADML-DOPM-FISC-CVCV-2026. Planilla Nro. 01 de Avance de Obra, período 07/05/2026–31/05/2026.
4. Anexo de Cantidades de la Planilla Nro. 01.
5. Planilla Nro. 02 de Avance de Obra, período 01/06/2026–30/06/2026.
6. Anexo de Cantidades de la Planilla Nro. 02.

- **RECOMENDACIÓN No. 14.-** "En el cumplimiento de funciones en calidad de administradores de contratos de obras, verifiquen la existencia de los instrumentos jurídicos que respalden la legalidad de la ejecución de obras públicas en predios que no sean de propiedad de la entidad, tales como convenios de uso, comodato o transferencia, e informen oportunamente a las autoridades competentes en caso de ausencia o irregularidad de dichos documentos."

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:

En calidad de Administradora del Contrato MCO-GADML-2025-04, correspondiente a la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI…", se verificó la existencia del instrumento jurídico habilitante para la intervención municipal en los predios de la institución educativa. Previo a autorizar el inicio del plazo contractual, se dejó constancia de que no era procedente iniciar la ejecución mientras se encontraba en trámite la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional. Una vez verificada su vigencia, mediante Oficio Nro. 014-GADML-DOPM-CVCV-2026 se autorizó el inicio del plazo contractual a partir del 21/04/2026.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
11/02/2026 al 20/04/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

1. Convenio de Autorización para que la entidad municipal intervenga en los predios de la Escuela Fiscomisional Mons. Antonio Cabri.
2. Oficio Nro. 005-GADML-DOPM-CVCV-2026, de 11/02/2026.
3. Oficio Nro. 014-GADML-DOPM-CVCV-2026, de 20/04/2026.

- **RECOMENDACIÓN No. 17.-** "Dispondrá y verificará que los servidores designados en calidad de Fiscalizadores efectúen la supervisión sobre la toma de muestras y ejecución de los ensayos; y, a los Administradores de los Contratos, verificar el cumplimiento de estos y de las cláusulas establecidas en los contratos."

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:
En calidad de Administradora del contrato MCO-GADML-2025-04 (Escuela Fiscomisional Mons. Antonio Cabri), se efectuó el seguimiento y control de la ejecución contractual y de la documentación relacionada con los ensayos de control de calidad de los materiales, verificándose la existencia de los resultados de ensayos de resistencia a la compresión y documentación técnica de respaldo. Asimismo, en calidad de Fiscalizadora del contrato COTO-GADML-2025-01 (U.E. Fiscomisional P. Ricardo Nardi), se efectuó el control técnico de la ejecución y la supervisión directa de los ensayos de resistencia a la compresión del hormigón, con presencia durante la ejecución de los ensayos. El informe de laboratorio identifica a la Ing. Carol Carrera Vélez como Fiscalizadora y deja constancia de su presencia en los ensayos.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
28/05/2026 al 04/06/2026

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Documentación contractual y técnica del MCO-GADML-2025-04 – Antonio Cabri.
2. Oficio Nro. 05-SCSS-CH-2026, de 28/05/2026.
3. Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-155-O, de 28/05/2026.
4. Informe LAB-EN-RG-008 – Ensayo de resistencia a la compresión.
5. Certificado de calibración de balanza.
6. Certificado de calibración de prensa de compresión.
7. Planilla Nro. 01 y documentación de control de calidad del COTO-GADML-2025-01 – Ricardo Nardi.
8. Oficio Nro. 06-CRJ-HJ-2026, de 03/06/2026.
9. Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-165-O, de 04/06/2026

- **RECOMENDACIÓN No. 20.-** "Dispondrá y supervisará que los servidores designados como Administradores de Contrato compilen, registren y mantengan actualizada en el portal del SOCE, toda la información correspondiente a la fase de ejecución de los procedimientos de contratación, a fin de asegurar que la documentación sea completa, actualizada, confiable y disponible para fines de consulta y control, por parte de los usuarios internos y externos."

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS:
En calidad de Administradora de los contratos correspondientes a los procedimientos SIE-GADML-2025-30, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", y SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", se efectuó la gestión y seguimiento de la fase contractual, contando con los respectivos expedientes y registros generados en el Portal de Contratación Pública. Como medio de comprobación del estado de los procedimientos, se verificó en el Portal que ambos constan en estado "Finalizada". El SIE-GADML-2025-30 consta como "Finalizada" en la consulta del Portal realizada el 21/08/2026.
El SIE-GADML-2025-42 igualmente consta como "Finalizada" en la consulta realizada el 21/08/2026.

FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN:
Durante la fase contractual de cada procedimiento; verificación del estado en Portal: 21/08/2026.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN:
1. Contrato Nro. 51 – SIE-GADML-2025-30, en el que consta la designación de la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez como Administradora.
2. Constancia del Portal de Contratación Pública del SIE-GADML-2025-30, estado "Finalizada", consultada el 21/08/2026.
3. Contrato Nro. 06 – SIE-GADML-2025-42, en el que consta la designación como Administradora y la obligación de organizar el expediente de la gestión contractual.
4. Constancia del Portal de Contratación Pública del SIE-GADML-2025-42, estado "Finalizada", consultada el 21/08/2026.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
EDISON ALBERTO
EGUEZ CEVALLOS

Ing. Edison Alberto Egüez Cevallos
DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

Referencias:
- GADMCL-A-2026-3992-M-GD

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-2707-M-GD

Loreto, 04 de septiembre de 2026

Anexos:
- INFORME -FINAL-CGE (1) INF. APROBADO 2025-09-15.pdf
- GADMCL-GPS-2026-0030-M-GD (1).pdf
- GADMCL-GPS-2026-0030-M-GD (5).pdf
- GADMCL-GPS-2026-0474-M-GD.pdf
- INFORME REC CONTRALORIA CAROL CARRERA.pdf
- MEDIOS DE VERIFICACION CAROL CARRERA.zip

NUT: GADMCL-2026-5918

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Andrea Katherine Rodríguez Borja	DGOPM	2026-09-02

N.º	RECOMENDACIÓN DE CONTRALORÍA	ACCIONES O ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN	MEDIO DE VERIFICACIÓN
3	"A los servidores designados como Fiscalizadores de contratos de obra, en los casos que identifiquen errores u omisiones en los planos y/o diseños, justificar las modificaciones que hicieren falta, en base a criterios técnicos y en coordinación con los responsables de su elaboración, así como someter a aprobación por parte de las instancias correspondientes, previo a autorizar y controlar su aplicación en obra; y, a los administradores, supervisar su cumplimiento."	En calidad de Fiscalizadora de la obra correspondiente al procedimiento COTO-GADML-2025-01, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30x40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI", se efectuó la revisión y análisis técnico de la documentación del proyecto previo al inicio de los trabajos. Como resultado de dicha revisión se identificaron errores, omisiones e inconsistencias en planos y documentación técnica, respecto de los cuales se formularon las correspondientes observaciones y recomendaciones técnicas para su subsanación previo al inicio de la obra. El memorando de Fiscalización evidencia el análisis de planos estructurales, implantación, memoria de cálculo, cargas de viento y demás documentación, complementado con inspección en sitio.	05/03/2026 al 14/04/2026	1. Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD, de 05/03/2026. 2. Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD, de 14/04/2026.
5	"Cuando se designe o contrate fiscalizadores externos, se les disponga, revisar en conjunto con los diseñadores, los planos y estudios, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción, y de ser el caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Esta disposición se recomienda impartir a los Administradores de Contratos para que supervisen el cumplimiento."	En calidad de Administradora del Contrato MCO-GADML-2025-03, correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO…", se realizó el seguimiento y supervisión de la revisión de la documentación estructural del proyecto, en coordinación con Fiscalización y el Proyectista. Ante la identificación de un error en la denominación de los diámetros de los estribos de las columnas, que incidía en el volumen de acero de refuerzo, se dio seguimiento a la actualización de los cálculos y planos estructurales. Posteriormente, mediante Acta de Reunión de Trabajos Nro. 01, se formalizó la solución técnica adoptada, dejando constancia del uso de estribos de Ø10 mm en columnas y vigas superiores del escenario, en cumplimiento de la normativa estructural, solución incorporada posteriormente en los planos AS-BUILT.	20/02/2026 al 24/04/2026	1. Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD, de 20/02/2026, y anexos técnicos. 2. Acta de Reunión de Trabajos Nro. 01, de 24/04/2026. 3. Planos AS-BUILT de la obra MCO-GADML-2025-03.
7	Recomendación dirigida a los servidores designados y/o miembros de las Comisiones Técnicas, respecto de verificar que la documentación presentada por los oferentes se ajuste a los requisitos establecidos en los pliegos, para determinar su cumplimiento y continuidad en el procedimiento.	En calidad de Presidenta de la Comisión Técnica del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, se efectuó la revisión y verificación de la documentación presentada por el oferente, de conformidad con los requisitos mínimos y condiciones establecidos en los pliegos. La Comisión Técnica verificó la integridad de la oferta, la existencia de errores susceptibles de convalidación y, posteriormente, el cumplimiento de los requisitos mínimos y parámetros de evaluación establecidos en los documentos precontractuales, dejando constancia de	13/07/2026 al 04/08/2026	1. Acta de Designación de Secretaria de la Comisión Técnica, de 13/07/2026. 2. Acta Nro. 004 – Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, de 23/07/2026. 3. Acta Nro. 005 – Evaluación y Calificación

		los resultados en las respectivas actas y en el Informe de Recomendación para Adjudicación. El Acta 004 deja constancia de la verificación de integridad y requisitos mínimos, mientras que el Acta 005 señala que se verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes y condiciones técnicas, legales y económicas exigidas.		por Puntaje, de 04/08/2026. 4. Informe de Recomendación para Adjudicación del procedimiento LICO-GADML-2026-03.
8	"Dispondrá a los servidores que actúen como Fiscalizadores de contratos de obra, verificar que los trabajos incluidos en las planillas cuenten con todos los anexos y demostrativos de cálculo, y, a los Administradores de los Contratos, supervisar su cumplimiento."	En calidad de Fiscalizadora del contrato COTO-GADML-2025-01, se verificó que los trabajos incluidos en las planillas de avance de obra cuenten con los respectivos anexos de cantidades y demostrativos de cálculo que sustentan técnicamente las cantidades ejecutadas y planilladas. Esta verificación se materializó mediante la revisión y suscripción de las planillas y sus anexos, en los cuales se detallan dimensiones, elementos, cantidades ejecutadas, acumuladas y cantidades a cobrar.	07/05/2026 al 30/06/2026	1. Acta de Inicio de Obra del contrato COTO-GADML-2025-01. 2. Informe de Fiscalización Nro. 001-GADML-DOPM-FISC-CVCV-2026. 3. Planilla Nro. 01 de Avance de Obra, período 07/05/2026–31/05/2026. 4. Anexo de Cantidades de la Planilla Nro. 01. 5. Planilla Nro. 02 de Avance de Obra, período 01/06/2026–30/06/2026. 6. Anexo de Cantidades de la Planilla Nro. 02.
14	"En el cumplimiento de funciones en calidad de administradores de contratos de obras, verifiquen la existencia de los instrumentos jurídicos que respalden la legalidad de la ejecución de obras públicas en predios que no sean de propiedad de la entidad, tales como convenios de uso, comodato o transferencia, e informen oportunamente a las autoridades competentes en caso de ausencia o irregularidad de dichos documentos."	En calidad de Administradora del Contrato MCO-GADML-2025-04, correspondiente a la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI…", se verificó la existencia del instrumento jurídico habilitante para la intervención municipal en los predios de la institución educativa. Previo a autorizar el inicio del plazo contractual, se dejó constancia de que no era procedente iniciar la ejecución mientras se encontraba en trámite la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional. Una vez verificada su vigencia, mediante Oficio Nro. 014-GADML-DOPM-CVCV-2026 se autorizó el inicio del plazo contractual a partir del 21/04/2026.	11/02/2026 al 20/04/2026	1. Convenio de Autorización para que la entidad municipal intervenga en los predios de la Escuela Fiscomisional Mons. Antonio Cabri. 2. Oficio Nro. 005-GADML-DOPM-CVCV-2026, de 11/02/2026. 3. Oficio Nro. 014-GADML-DOPM-CVCV-2026, de 20/04/2026.
17	"Dispondrá y verificará que los servidores designados en calidad de Fiscalizadores efectúen la supervisión sobre la toma de muestras y ejecución de los ensayos; y, a los Administradores de los Contratos, verificar el cumplimiento de estos y de las cláusulas establecidas en los contratos."	En calidad de Administradora del contrato MCO-GADML-2025-04, correspondiente a la obra "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI…", se efectuó el seguimiento y control de la ejecución contractual y de la documentación relacionada con los ensayos de control de calidad de los materiales, verificándose la existencia de los resultados de ensayos de resistencia a la compresión y documentación técnica de respaldo. En	28/05/2026 al 04/06/2026	1. Documentación contractual y técnica del MCO-GADML-2025-04 – Antonio Cabri. 2. Oficio Nro. 05-SCSS-CH-2026, de 28/05/2026. 3. Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-155-O, de 28/05/2026. 4. Informe LAB-EN-RG-008

		calidad de Fiscalizadora del contrato COTO-GADML-2025-01, correspondiente a la obra de la U.E. Fiscomisional P. Ricardo Nardi, se efectuó el control técnico de la ejecución y la supervisión directa de los ensayos de resistencia a la compresión del hormigón, con presencia durante la ejecución de los ensayos. El informe de laboratorio identifica a la Ing. Carol Carrera Vélez como Fiscalizadora y deja constancia de su presencia en los ensayos.		– Ensayo de resistencia a la compresión. 5. Certificado de calibración de balanza. 6. Certificado de calibración de prensa de compresión. 7. Planilla Nro. 01 y documentación de control de calidad del COTO-GADML-2025-01 – Ricardo Nardi. 8. Oficio Nro. 06-CRJ-HJ-2026, de 03/06/2026. 9. Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-165-O, de 04/06/2026.
20	"Dispondrá y supervisará que los servidores designados como Administradores de Contrato compilen, registren y mantengan actualizada en el portal del SOCE, toda la información correspondiente a la fase de ejecución de los procedimientos de contratación, a fin de asegurar que la documentación sea completa, actualizada, confiable y disponible para fines de consulta y control, por parte de los usuarios internos y externos."	En calidad de Administradora de los contratos correspondientes a los procedimientos SIE-GADML-2025-30, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NO CATALOGADOS PARA VEHÍCULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", y SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", se efectuó la gestión y seguimiento de la fase contractual, contando con los respectivos expedientes y registros generados en el Portal de Contratación Pública. Como medio de comprobación del estado de los procedimientos, se verificó en el Portal que ambos constan en estado "Finalizada". El SIE-GADML-2025-30 consta como "Finalizada" en la consulta del Portal realizada el 21/08/2026. El SIE-GADML-2025-42 igualmente consta como "Finalizada" en la consulta realizada el 21/08/2026.	Durante la fase contractual de cada procedimiento; verificación del estado en Portal: 21/08/2026.	1. Contrato Nro. 51 – SIE-GADML-2025-30, en el que consta la designación de la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez como Administradora. 2. Constancia del Portal de Contratación Pública del SIE-GADML-2025-30, estado "Finalizada", consultada el 21/08/2026. 3. Contrato Nro. 06 – SIE-GADML-2025-42, en el que consta la designación como Administradora y la obligación de organizar el expediente de la gestión contractual. 4. Constancia del Portal de Contratación Pública del SIE-GADML-2025-42, estado "Finalizada", consultada el 21/08/2026.

Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD

Loreto, 14 de abril de 2026

PARA: Sra. Ing. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - Ingeniero Civil

ASUNTO: INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PREVIO AL INICIO DE OBRA COTO-GADML-2025-01

En atención al Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD, de fecha 05 de marzo de 2026 , mediante el cual se remite la documentación técnica del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30x40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI"**, y se solicita la revisión técnica previo al inicio de obra, me permito informar que se ha realizado el análisis técnico del expediente, el cual comprende planos estructurales, implantación, memoria de cálculo, documento de cargas por viento y demás documentación habilitante, complementado con una inspección en sitio.
La presente revisión se realiza en cumplimiento de las atribuciones del fiscalizador de obra, conforme a la Norma de Control Interno 408-18 – Fiscalización, la cual establece la responsabilidad de verificar la existencia de errores, omisiones o imprevisiones técnicas en los documentos contractuales y proponer oportunamente las medidas correctivas necesarias para garantizar la adecuada ejecución del proyecto. De igual manera, en concordancia con los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública, se actúa bajo criterios de legalidad, calidad, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, conforme lo dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como su Reglamento General, el cual establece que los procedimientos contractuales deben sujetarse al principio de juridicidad y al cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado de la revisión efectuada, se determina que la documentación técnica presenta inconsistencias y omisiones relevantes que inciden directamente en la viabilidad técnica del proyecto, particularmente en lo referente a la definición de niveles, coherencia estructural y ausencia de componentes de diseño indispensables para su correcta ejecución, aspectos que contravienen los criterios establecidos en la Norma Ecuatoriana de la Construcción y las buenas prácticas de ingeniería.
En este contexto, se identifican las siguientes observaciones técnicas:

- Se evidencia una inconsistencia en el anclaje del refuerzo longitudinal de las columnas tipo C-1 (marca 107), donde se dispone una pata aproximada de 20 cm dentro de un plinto de 0.40 m de altura. De acuerdo con la NEC-SE-HM y el ACI 318 (Capítulo 25), el acero debe desarrollar una longitud suficiente para garantizar la transmisión de esfuerzos, la cual para barras de Ø14 mm se encuentra en el orden de 40 a 50 veces el diámetro (≈ 60 cm). En este caso, la longitud disponible no permite

Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD

Loreto, 14 de abril de 2026

desarrollar adecuadamente el refuerzo, por lo que el anclaje resulta insuficiente y no se garantiza la correcta transferencia de cargas entre la columna y la cimentación.

- No se evidencian planos ni detalles del sistema de drenaje pluvial, incluyendo bajantes y conducción de aguas lluvias, lo cual constituye una omisión técnica relevante considerando la superficie de cubierta proyectada y las condiciones climáticas de la zona.
- El expediente técnico no incluye planos eléctricos, en tal sentido, se recomienda solicitar el apoyo técnico de un ingeniero eléctrico del GAD de Loreto, a fin de desarrollar el diseño eléctrico integral de la nueva cancha, considerando los rubros contractuales, las condiciones reales de uso de la infraestructura y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.
- No se presenta un detalle constructivo específico del área correspondiente al escenario (altar patrio), el cual, de acuerdo con los planos, se ubica a un nivel superior respecto al nivel de piso terminado de la cancha. En este sentido, no se evidencia el diseño de su sistema de cimentación ni de los elementos necesarios para su conformación, tales como muros de contención, rellenos estructurales, ni detalles constructivos de la grada de acceso y rampa para personas con discapacidad. Esta omisión impide verificar la estabilidad, funcionalidad y accesibilidad del elemento, debiendo considerarse su diseño conforme a las normativas vigentes aplicables, tanto en lo estructural (NEC) como en criterios de accesibilidad universal.
- Se identifica la presencia de un muro posterior de mampostería (escenario para el altar patrio) sin elementos de confinamiento ni arriostramiento, lo cual no es técnicamente viable considerando la luz aproximada de 30 m de la estructura, siendo necesario incorporar columnetas y elementos estructurales de amarre conforme a lo establecido en la NEC-SE-MP.

En virtud de lo expuesto, se concluye que la documentación técnica presentada no se encuentra completamente conforme ni es suficiente para su aplicación durante la ejecución de la obra, diseño estructural, y ausencia de componentes técnicos esenciales, lo cual podría afectar la correcta ejecución del proyecto y el cumplimiento de la normativa vigente.

Por lo tanto, se recomienda que previo al inicio de obra se proceda con la subsanación integral de las observaciones señaladas, ajuste del diseño estructural y la incorporación de los diseños faltantes, a fin de garantizar condiciones técnicas adecuadas para la ejecución del proyecto.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD

Loreto, 14 de abril de 2026

Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - ANALISTA DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:
- GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD

Anexos: DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA INICIO DEL PROCESO CONTRATACIÓN
- DISPOSICION ELABORAR PROYECTO.pdf
- ESPECIFICACIOENES TECNICAS - RICARDO NARDI-signed.pdf
- INFORME DE NECESIDAD - RICARDO NARDI-signed-signed.pdf
- PRESUPUESTOS.zip
- CANCHA CUBIERTA RICARDO NARDIMMMMM.dwg
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.zip
- Of. Sol. construccion de cancha cubierta en el bloque N°2 (Jose Chimbo).PDF
- PROYECTO SENPLADES - RICARDO NARDI-signed.pdf
- Of. Sol. rotulo (Jose Chimbo).PDF
- PLANILLA DE HIERRO Y ESTRUCTURA METALICA.xlsx
- GADMCL-DGOPM-2025-0794-M-GD (2).pdf
- convenio -unidad educativa ricardo nardi.pdf
- CERTIFICACION 031 UGR 2024 COLEGIO P NARDI Construccion Cancha Cubierta Altar-signed (1).pdf
- Certificado Ambiental Mantenimiento U E R Nardi.rar
- Certificación POA-signed.pdf
- ACTA UE. RICARDO NARDI MURIALDO FINAL.pdf
- DISPOSICION PARA ACTUALIZACION DE PROYECTO.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-0265-M-GD.pdf
- GADMCL-CPC-2025-0036-M-GD.pdf
- CERTIF. 0494 MISION JOSEFINA MURIALDO-signed.pdf
- RESOLUCION-001-TRASPASOS-CREDITOS-signed.pdf
- Certificación POA-signed.pdf
- CERTIFICACION-PAC-signed.pdf
- certificacion 470 cancha.pdf
- Resolucion-segunda-reforma-PAC-signed.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-0839-M-GD.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0103-M-GD.pdf
- Oficio Nro. MINEDUC-CZ2-22D02-DAJ-2023-0051-O.pdf
- MINEDUC-CZ2-22D02-DAJ-2024-0114-O.pdf
- RUC27012025.pdf
- NOTARIADO REPRESENTANTE LEGAL P LUIS ZAMBRANO.pdf
- NOMBRAMIENTO PADRE LUIS ZAMBRANO.pdf
- Borrador Convenio GADML-IE Fisc -Ricardo Nardi.doc
- GADMCL-GPS-2025-0120-M-GD.pdf
- Convenio definitiivo GADML-IE Fisc -Ricardo Nardi-signed-signed.pdf
- REQUERIMIENTOS NARDI-signed-signed.pdf
- TERMINACIÓN CONVENIO nardi-signed.pdf
- PLIEGOS.rar
- GADMCL-DGOPM-2025-1137-M-GD.pdf
- PLIEGO-signed.pdf
- RESOLUCION-INICIO-signed.pdf
- contratacion_pli_cotobr.rar

Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD

Loreto, 14 de abril de 2026

- VOLUMENES_RICARDO NARDI.xlsx
- ACTA 001 DESIGNACIÓN DE SECRETARIA COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- PLANILLA DE HIERRO Y ESTRUCTURA METALICA (1).xlsx
- ACTA_002_PREGUNTAS_Y_RESPUESTAS_PROCESO_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0099-M-GD.pdf
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part1.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part2.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part5.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part3.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part4.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part6.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part8.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part7.rar
- ACTA_004_CONVALIDACION_DE_ERRORES_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO OFERENTE 2-signed-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO OFERENTE 1-signed-signed-signed-signed.pdf
- RESPUESTAS-CONVALIDACION-ERRORES.rar
- MYPES y EPS.rar
- ACTA_006_CALIFICACION_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_005_DE_APERTURA_CONVALIDACION_COTO_GADML_2025_01-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_003_APERTURA_DE_OFERTAS_FINAL_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0116-M-GD.pdf
- INFORME_EVALUACION_RECOMENDACION_ADJUDICACION_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed (1)-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0123-M-GD.pdf
- 27-RESOLUCION-DE-ADJUDICACION-signed.pdf
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte8.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte9.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte7.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte10.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte6.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte3.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte4.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte2.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte5.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte1.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte1.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte2.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte3.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte2.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte1.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte3.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte4.rar
- CONTRATO CONSTRUCCION CANCHA MURIALDO-signed-signed.pdf
- POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO.pdf
- CERTIFICADO BANCARIO-signed (1).pdf

Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0385-M-GD

Loreto, 14 de abril de 2026

- POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO.pdf
- CERTIFICADO NO ADEUDAR Y TIMBRE DE CONTRATISTA-signed.pdf
- documentos consorcio.pdf
- NO ADEUDAR HUGO ZAPATA-signed.pdf
- PAGO DEL PLIEGO-signed.pdf
- RESOL. Nº 0136-COTO-GADML-2025-01-FISCALIZADOR-Ing-Carol Velez-signed.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0211-M-GD.pdf
- OFICIO Nro. 001-GADML-DOPM-COTO-01-DSS-2025
- GADMCL-DGOPM-2025-1660-M-GD.pdf
- IMPLANTACION.pdf
- PLANO 2.pdf
- PLANO 1.pdf
- ESTUDIO DE SUELOLS LORETO.rar
- MEMORIA DE CALCULO ESPACIO CUBIERTO R NARDI-signed.pdf
- CARGA POR VIENTO MURIALDO II ok (1)-signed.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-1911-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2025-4065

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD

Loreto, 05 de marzo de 2026

PARA: Srta. Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Publicas

ASUNTO: Remisión de documentación técnica y solicitud de revisión previo al inicio de obra COTO-GADML-2025-01

En base a lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO**, específicamente en el numeral **12.6 referente a las atribuciones del Fiscalizador de la Obra**, conforme lo determinado en la **Norma de Control Interno 408-18 emitida por la Contraloría General del Estado**, se establece entre sus responsabilidades:

a) Revisar en conjunto con el jefe de fiscalización los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica que pueda afectar la construcción de la obra y, de presentarse este caso, sugerir oportunamente la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas.
b) Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o cuando se requiera ejecutar obras adicionales.
c) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

En este contexto, y en atención al **Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0043-M-GD**, suscrito por la proyectista, mediante el cual se indica lo siguiente:
“Señor Director, en atención a lo solicitado por segunda ocasión, informo a usted que las observaciones ya fueron subsanadas mediante memorando Nro. GADMCL-DAGMCL-DGOPM-2025-1911-M-GD de fecha 18 de agosto de 2025, en el cual se expone: ‘…Ante lo expuesto y como técnico responsable de la etapa preparatoria remito la documentación faltante, la cual fue elaborada en el tiempo previo a la publicación del proceso en el Portal de Compras Públicas, y que por error involuntario no ha sido subida como expediente dentro del trámite, ya que el proyecto fue elaborado en el año 2024 y, por disposición del Director de Obras Públicas mediante memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2025-0031-M-GD de fecha 07 de enero de 2025, se solicitó la actualización del proyecto con los nuevos valores de mano de obra 2025.”

Por lo expuesto, remito la documentación técnica antes señalada, a fin de que, en el ámbito de sus competencias como Fiscalizadora de la obra, se sirva realizar la revisión y análisis técnico correspondiente del cálculo estructural, planos y demás documentos técnicos del proyecto, verificando su coherencia y suficiencia técnica para la ejecución del mismo.

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD

Loreto, 05 de marzo de 2026

De igual manera, solicito se elabore y remita el informe técnico correspondiente, en el cual se determine si la documentación técnica presentada se encuentra conforme para su aplicación durante la ejecución de la obra, o en su defecto se establezcan las observaciones y recomendaciones técnicas que correspondan.

Cabe indicar que la obra aún no cuenta con orden de inicio, debido a que se encuentra pendiente la actualización del convenio necesario para la intervención en el predio donde se ejecutará el proyecto; por lo que la presente revisión técnica permitirá contar con la validación correspondiente previo al inicio de los trabajos.

Lo solicitado tiene la finalidad de validación correspondiente previo al inicio de los trabajos y así garantizar la correcta ejecución técnica del proyecto y el cumplimiento de la normativa vigente.

Particular que informo para fines pertinentes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
DALIA SILVANA SANMARTIN TORRES

Ing. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - INGENIERO CIVIL

Referencias:
- GADMCL-CCMI-2026-0043-M-GD

Anexos: DOCUMENTACIÓN HABILITANTE PARA INICIO DEL PROCESO CONTRATACIÓN
- ESPECIFICACIOENES TECNICAS - RICARDO NARDI-signed.pdf
- INFORME DE NECESIDAD - RICARDO NARDI-signed-signed.pdf
- PRESUPUESTOS.zip
- CANCHA CUBIERTA RICARDO NARDIMMMMM.dwg
- DISPOSICION ELABORAR PROYECTO.pdf
- Of. Sol. construccion de cancha cubierta en el bloque N°2 (Jose Chimbo).PDF
- PROYECTO SENPLADES - RICARDO NARDI-signed.pdf
- Of. Sol. rotulo (Jose Chimbo).PDF
- PLANILLA DE HIERRO Y ESTRUCTURA METALICA.xlsx
- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.zip
- GADMCL-DGOPM-2025-0794-M-GD (2).pdf
- CERTIFICACION 031 UGR 2024 COLEGIO P NARDI Construccion Cancha Cubierta Altar-signed (1).pdf
- Certificado Ambiental Mantenimiento U E R Nardi.rar
- Certificación POA-signed.pdf
- ACTA UE. RICARDO NARDI MURIALDO FINAL.pdf
- convenio -unidad educativa ricardo nardi.pdf
- DISPOSICION PARA ACTUALIZACION DE PROYECTO.pdf

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD

Loreto, 05 de marzo de 2026

- GADMCL-DGOPM-2025-0265-M-GD.pdf
- GADMCL-CPC-2025-0036-M-GD.pdf
- RESOLUCION-001-TRASPASOS-CREDITOS-signed.pdf
- Certificación POA-signed.pdf
- CERTIFICACION-PAC-signed.pdf
- CERTIF. 0494 MISION JOSEFINA MURIALDO-signed.pdf
- certificacion 470 cancha.pdf
- Resolucion-segunda-reforma-PAC-signed.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-0839-M-GD.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0103-M-GD.pdf
- Oficio Nro. MINEDUC-CZ2-22D02-DAJ-2023-0051-O.pdf
- MINEDUC-CZ2-22D02-DAJ-2024-0114-O.pdf
- RUC27012025.pdf
- NOMBRAMIENTO PADRE LUIS ZAMBRANO.pdf
- NOTARIADO REPRESENTANTE LEGAL P LUIS ZAMBRANO.pdf
- Borrador Convenio GADML-IE Fisc -Ricardo Nardi.doc
- GADMCL-GPS-2025-0120-M-GD.pdf
- Convenio definitiivo GADML-IE Fisc -Ricardo Nardi-signed-signed.pdf
- REQUERIMIENTOS NARDI-signed-signed.pdf
- TERMINACIÓN CONVENIO nardi-signed.pdf
- PLIEGOS.rar
- GADMCL-DGOPM-2025-1137-M-GD.pdf
- RESOLUCION-INICIO-signed.pdf
- PLIEGO-signed.pdf
- contratacion_pli_cotobr.rar
- ACTA 001 DESIGNACIÓN DE SECRETARIA COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- VOLUMENES_RICARDO NARDI.xlsx
- PLANILLA DE HIERRO Y ESTRUCTURA METALICA (1).xlsx
- ACTA_002_PREGUNTAS_Y_RESPUESTAS_PROCESO_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0099-M-GD.pdf
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part2.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part5.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part3.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part1.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part4.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part6.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part8.rar
- OFERTAS-TECNICAS-MFC-USHAY.part7.rar
- ACTA_004_CONVALIDACION_DE_ERRORES_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO OFERENTE 2-signed-signed-signed-signed.pdf
- OFICIO OFERENTE 1-signed-signed-signed-signed.pdf
- MYPES y EPS.rar
- RESPUESTAS-CONVALIDACION-ERRORES.rar
- ACTA_006_CALIFICACION_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_005_DE_APERTURA_CONVALIDACION_COTO_GADML_2025_01-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_003_APERTURA_DE_OFERTAS_FINAL_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0116-M-GD.pdf

Memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0604-M-GD

Loreto, 05 de marzo de 2026

- INFORME_EVALUACION_RECOMENDACION_ADJUDICACION_COTO-GADML-2025-01-signed-signed-signed (1)-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0123-M-GD.pdf
- 27-RESOLUCION-DE-ADJUDICACION-signed.pdf
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte8.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte9.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte7.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte10.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte6.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte3.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte4.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte2.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte5.rar
- Oferta-COSMOS-INGENIERIA-CONSTRUCCION-SAS-parte1.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte1.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte2.rar
- Oferta-PDF-LANDA-BAYAS-JOSEPH-ROBERTO-parte3.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte2.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte1.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte3.rar
- Oferta-RIVERSWEET-CONSTRUCCIONES-CIA-LTDA-parte4.rar
- CONTRATO CONSTRUCCION CANCHA MURIALDO-signed-signed.pdf
- POLIZA BUEN USO DE ANTICIPO.pdf
- CERTIFICADO BANCARIO-signed (1).pdf
- POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO.pdf
- CERTIFICADO NO ADEUDAR Y TIMBRE DE CONTRATISTA-signed.pdf
- documentos consorcio.pdf
- NO ADEUDAR HUGO ZAPATA-signed.pdf
- PAGO DEL PLIEGO-signed.pdf
- RESOL. Nº 0136-COTO-GADML-2025-01-FISCALIZADOR-Ing-Carol Velez-signed.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0211-M-GD.pdf
- OFICIO Nro. 001-GADML-DOPM-COTO-01-DSS-2025
- GADMCL-DGOPM-2025-1660-M-GD.pdf
- IMPLANTACION.pdf
- PLANO 2.pdf
- PLANO 1.pdf
- ESTUDIO DE SUELOLS LORETO.rar
- MEMORIA DE CALCULO ESPACIO CUBIERTO R NARDI-signed.pdf
- CARGA POR VIENTO MURIALDO II ok (1)-signed.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-1911-M-GD.pdf

NUT: GADMCL-2025-4065

Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD

Loreto, 20 de febrero de 2026

PARA: Srta. Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Publicas

ASUNTO: ALCANCE A LA ENTREGA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA

De mi consideración:

Posterior a un cordial saludo, deseándole éxito en las funciones de Administrador de Contrato a su persona encomendadas; por medio de la presente me dirijo hacia su persona en calidad de Proyectista que elaboro el proyecto " **CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**", con la finalidad de informar y a la vez solicitar que se tome en cuenta dentro de la fase contractual la variación dentro del rubro 013 Acero de Refuerzo, el cual inicialmente consta en el plano de cimentacion, detalles constructivos y planilla de hierro exite una cantidad de 1583.00 kg, y posterior a un análisis debido a un error involuntario dentro de la denominación de diámetros específicamente en los aceros de estribos de las correspondientes columnas existe un incremento de volumen de 110.33 kg, estableciéndose de forma total una cantidad de 1693.33kg.

Esta solicitud se la realiza para que se pueda tomar en cuenta dentro de la ejecución del respectivo contrato en cumplimiento de la normativa legal vigente, cabe señalar que esta actualizacion no afectaria al presupuesto referencial Contractual.

A este documento se anexan el cálculo de volúmenes de aceros de refuerzo, planos de detalle en formato editable y firmados electrónicamente.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
ALEXANDER EDUARDO ACOSTA SUPE

Mgs. Alexander Eduardo Acosta Supe
SP5-PROFESIONAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD

Loreto, 20 de febrero de 2026

Anexos:
- CUADRO DE HIERROS ALCANCE-signed-signed.pdf
- DETALLE DE COLUMNAS ALCANCE-signed-signed.pdf
- ESCENARIO SAN LORENZO alcance.dwg
- Hoja de cálculo en ESCENARIO SAN LORENZO 2-1-2-1-signed.pdf
- Hoja de cálculo en ESCENARIO SAN LORENZO 2.xlsx

Copia:
Sr. Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos
Coordinador de Fiscalización

Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
Director de Planificación

NUT: GADMCL-2026-2567

ACTA DE REUNION DE TRABAJOS No. 01

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	FROMALIZACIÓN DE AJUSTES TÉCNICOS Y CAMBIOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".
Código de Proceso:	**MCO-GADML-2025-03**
Contratante:	GADM LORETO
Contratista:	**CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS,** Procurador común: Ing. Andrés Fabián Chiquito Yumbo.
Ubicación:	Comunidad San Lorenzo, Parroquia Puerto Murialdo, Cantón Loreto.
Fecha:	24 de abril de 2026
Asistentes:	Ing. Carol Valeria Carrera Vélez (Administrador de contrato) Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos (Fiscalizador de obra) Arq. Alexander Eduardo Acosta Supe (Proyectista de obra) Ing. Andrés Fabián Chiquito Yumbo (Contratista de obra)

1. COMPARECIENTES. -

Comparecen a la celebración de la presente Acta, por una parte, la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez (Administrador de contrato), Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos (Fiscalizador de obra), Arq. Alexander Eduardo Acosta Supe (Proyectista de obra); técnicos de la entidad contratante "Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto"; y el Ing. Andrés Fabián Chiquito Yumbo, Procurador Común del Consorcio "MURIALDO LOREBRAS", (Contratista de obra).

2. ANTECEDENTES. -

Con fecha 20 de febrero de 2026, se suscribió el ACTA DE INICIO de la obra "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", con un monto referencial de $ 104.467,60 y un plazo de noventa (90 días).

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0379-M-GD, de fecha 20 de febrero de 2026, el Arq. Alexander Eduardo Acosta Supe (Proyectista de obra), presenta a la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez (Administrador de contrato), y al Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos (Fiscalizador de obra), ALCANCE al cálculo de volúmenes de aceros de refuerzo, y planos estructurales, debido al cambio de diámetros de los estribos de columnas y vigas superiores del escenario a construir.

Con Oficio No21-CF-CNVB-GADML-2026, de fecha 23 de febrero de 2026, Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos (Fiscalizador de obra), notifica al contratista, sobre los cumplimientos a tener en cuenta en el desarrollo de los trabajos, asimismo entrega el ALCANCE de cálculos de volúmenes de aceros de refuerzo, y planos estructurales finales de diseño, para la construcción del escenario de la Cancha cubierta.

Con Oficio N.º 001-2026-SL, de fecha 25 de febrero de 2025, el Sr. Alcides Tan, PRESIDENTE de la comunidad San Lorenzo, SOLICITA a la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez (Administrador de contrato), se realice una apertura a los costados del escenario para que facilite el acceso hacia los baños que se encuentra en lados laterales, de la misma manera se coloquen puertas que facilite el ingreso y salida hacia los vestidores y escenario, a fin de dar mejor utilidad y funcionabilidad en los actos sociales y culturales reuniones que realizamos como comunidad.

3. ANALISIS TÉCNICO DE CAMBIOS Y AJUSTES EN LA OBRA. -

Con los antecedentes expuestos, los intervinientes en la presente Acta, realizaron los recorridos en el sitio de la obra, analizaron la factibilidad de los requerimientos, asimismo, se revisaron los Planos de diseño definitivo, Rubros contractuales, Especificaciones Técnicas; con la finalidad de garantizar, la funcionalidad de la obra.

La Administración del contrato, Fiscalización, Técnico Proyectista, y Contratista, FORMALIZAN mediante la presente ACTA, los AJUSTES TÉCNICOS Y CAMBIOS, EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO Y GRADERÍO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"; mismos que se describen a continuación:

- Estribos en columnas y vigas superiores del escenario, son de 10 mm, en cumplimiento de la normativa estructural.
- Se deja un espacio de 1.20 metros de ancho entre el escenario y los graderíos a construir, en los lados izquierdo y derecho de la cancha cubierta, que permitan la salida e ingreso hacia los baños de mujeres y hombres respectivamente, desde el interior de la cancha cubierta.
- Se incrementan (2) dos puertas de en los camerinos a construir en el escenario, que permitan el ingreso y salida de los mismos, hacia las aceras perimetrales de la cancha cubierta.
- Se aclara, que el friso a colocar entre cubierta del escenario a construir, y la cercha superior de la cancha cubierta existente, queda con su acabado liso hacia el exterior, es decir la estructura de perfilería metálica de soporte del mismo, queda hacia el interior de la cancha cubierta.
- Se acuerda también, construir junto al escenario, una estructura de hormigón armado (Plinto, columna y Loseta superior), con la finalidad de colocar a una altura no menor a (3) tres metros, el "TANQUE PVC RESERVORIO 1000 LT (INC. ACCESORIOS)" Rubro No. 40; ya que, al no existir Red de distribución de Agua en la comunidad, se debe garantizar la dotación de agua para los baños a construir en el Escenario, esto liberaría el Rubro No. 41 "TANQUE HIDRONEUMATICO 20 GLN, INC. BOMBA 1/2 HP", con la finalidad de generar diferencia de costos en el balance final del proyecto, dentro del monto contractual.
- Se acuerda también, colocar por seguridad, un pasamanos de 5.65 ml, en la grada superior a el espacio diseñado como espacio especial (sillas de rueda), en el graderío lado izquierdo del graderío a construir.
- En referencia al rubro No. 56, "PORCELANATO ESMALTADO DE 50X100CM PARA PISOS", de acuerdo al contrato, se paga por metro cuadrado, y de acuerdo a la disponibilidad del mercado, podría cambiarse a medidas cuadradas, siempre y cuando cumplan con la característica de composición, y no menor a 50cm x 50cm.

Todo lo antes descrito, constará en los PLANOS ASBUILT, de finalización de obra, en la planilla de liquidación.

Para constancia y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO 001,** por parte de las personas que intervienen en esta diligencia.

Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Firmado electrónicamente por:
CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
Validar únicamente con FirmaEC


Ing. Carlos Vélez Burgos
FISCALIZADOR DEL CONTRATO

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ALEXANDER EDUARDO ACOSTA SUPE

Arq. Alexander Eduardo Acosta Supe
Técnico Proyectista-GADML


Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
ANDRES FABIAN CHIQUITO YUMBO

Ing. Andrés Fabián Chiquito Yumbo
CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS
CONTRATISTA

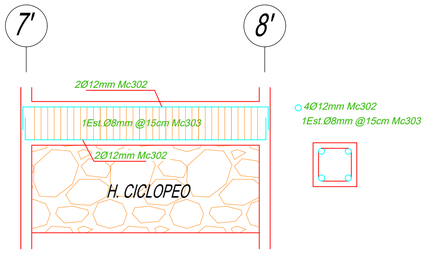


ARMADO DE CADENAS EJES A', B', E', F'


ESCALA HORIZONTAL.....1 : 100
ESCALA VERTICAL.....1 : 20

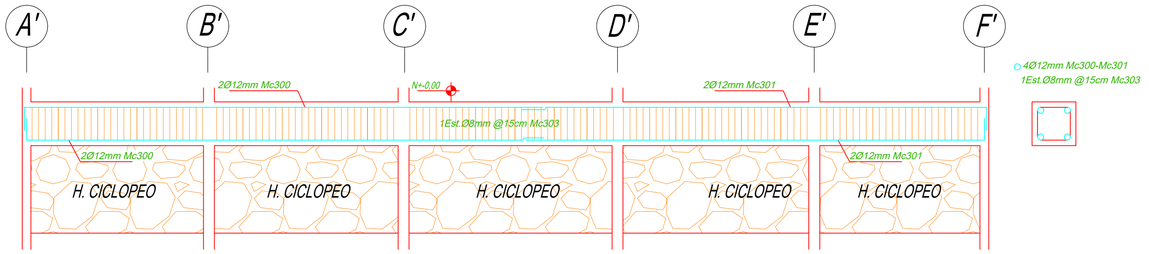

ARMADO DE CADENAS EJES 7' Y 8'


ESCALA HORIZONTAL.....1 : 100
ESCALA VERTICAL.....1 : 20




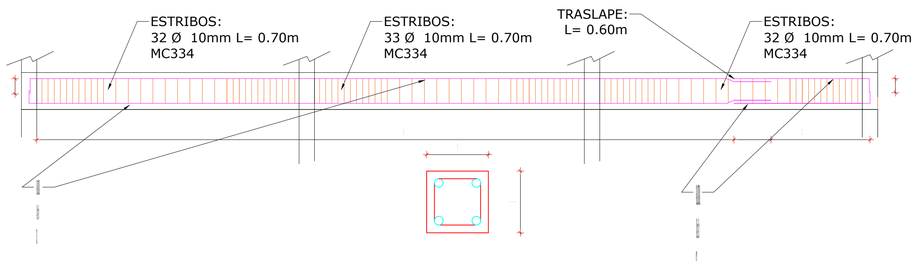

ARMADO DE VIGAS EJE, 8'


1Est.Ø10mm @L/4 10cm - L/2 20cm Mc334

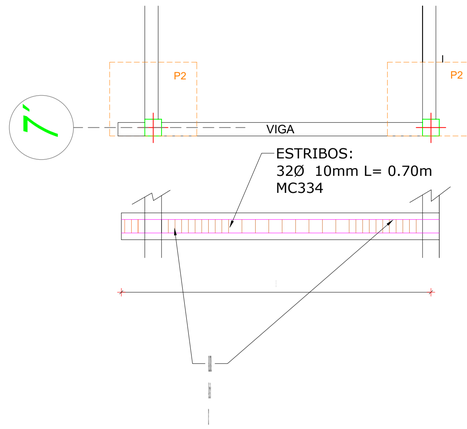



1Est.Ø10mm @10 @20cm Mc334

ARMADO DE VIGAS EJE 7', 8'

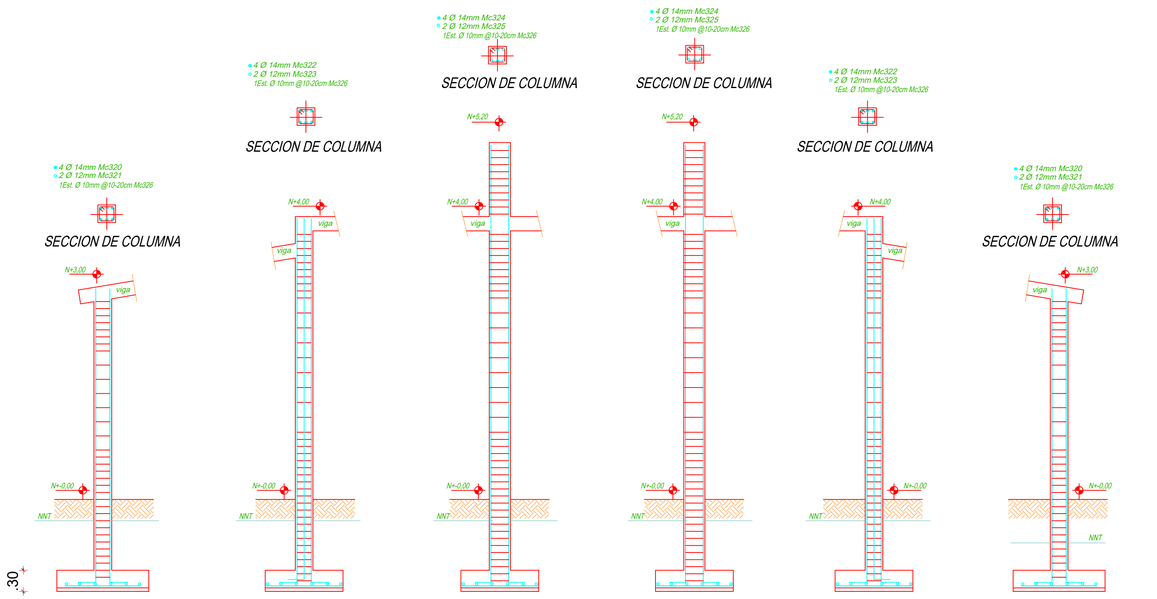

COLUMNA 7-A';8-A'

ESCALA.....1 : 50

COLUMNA 7-B';8-B'

ESCALA.....1 : 50

COLUMNA 8'-C'

ESCALA.....1 : 50

COLUMNA 8'-D'

ESCALA.....1 : 50


COLUMNA 7-E';8-E'

ESCALA.....1 : 50

COLUMNA 7-F';8-F'

ESCALA.....1 : 50

ARMADO DE VIGAS EJES A', B', E', F'

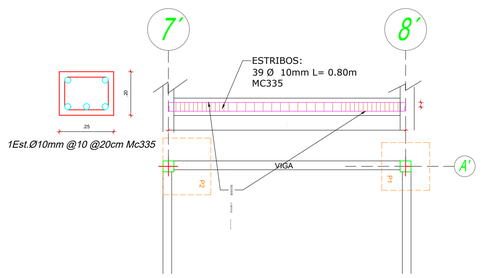

PLANILLA DE HIERRO

Mc	Φ (mm)	Tipo	No.	DIMENSIONES a	b	c	d	g	Tras	Longitud desarrollo	Longitud total	Peso Kg
PLINTOS												
300	12	C	112	1.00	0.10	0.10				1.20	134.40	*119.35*
301	12	C	36	1.20	0.10	0.10				1.40	50.40	*44.76*
CADENAS INFERIORES Y SUPERIORES												
310	12	L	8	10.40	0.10					10.50	84.00	*74.59*
311	12	L	8	11.90	0.10					12.00	96.00	*85.25*
312	12	C	24	5.20	0.10	0.10				5.40	129.60	*115.08*
313	12	L	4	2.08	0.10					2.18	8.72	*7.74*
314	12	L	4	11.90	0.10					12.00	48.00	*42.62*
315	8	O	547	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10		0.70	382.90	*151.25*
COLUMNAS												
320	14	L	16	4.20	0.30					4.50	72.00	*86.98*
321	12	L	8	4.20	0.30					4.50	36.00	*31.97*
322	14	L	16	5.20	0.30					5.50	88.00	*106.30*
323	12	L	8	5.20	0.30					5.50	44.00	*39.07*
324	14	L	8	6.30	0.30					6.60	52.80	*63.78*
325	12	L	4	6.30	0.30					6.60	26.40	*23.44*
326	10	O	378	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10		0.90	340.20	*209.90*
VIGAS												
330	12	C	20	5.45	0.10	0.10				5.65	113.00	*100.34*
331	12	C	16	5.13	0.10	0.10				5.33	85.28	*75.73*
332	12	L	4	2.21	0.10					2.31	9.24	*8.21*
333	12	L	4	11.90	0.10					12.00	48.00	*42.62*
334	10	O	225	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10		0.70	157.50	*97.18*
335	10	O	156	0.20	0.15	0.20	0.15	0.10		0.80	124.80	*77.00*
CHICOTES COLUMNAS Y MURO Y DINTELES												
400	12	L	26	1.00	0.20					1.20	31.20	*27.7056*
401	8	L	90	0.60	0.10					0.70	63.00	*24.89*
402	12	I	12	1.10						1.10	13.20	*11.72*

RESUMEN DE HIERRO


Diam	6	8	10	12	14	16	18	20	25	28	RESUMEN TOTAL HIERRO (Kg)
Elemen											
Peso/ml	0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.853	4.834	
Long.(m)	0.00	445.90	622.50	957.44	212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Peso (Kg)	0.00	176.13	384.08	850.21	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1667.48**

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".


CONTIENE:
- PLANOS AS-BUILT
- DETALLE DE COLUMNAS-VIGAS
- DETALLE DE CADENA - MURO H.C
- RESUMEN DE ACERO REFUERZO


FECHA DE INICIO DE OBRA: FEBRERO DEL 2026	FECHA FIN DE OBRA: MAYO DEL 2026	ESCALAS: INDICADAS	LAMINA: 1/8
DIBUJO: ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA			
PROYECTISTA : ARQ. ALEXANDER ACOSTA SPS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ADMINISTRADORA DE CONTRATO : ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	FISCALIZADOR : ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	CONTRATISTA: ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMUN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

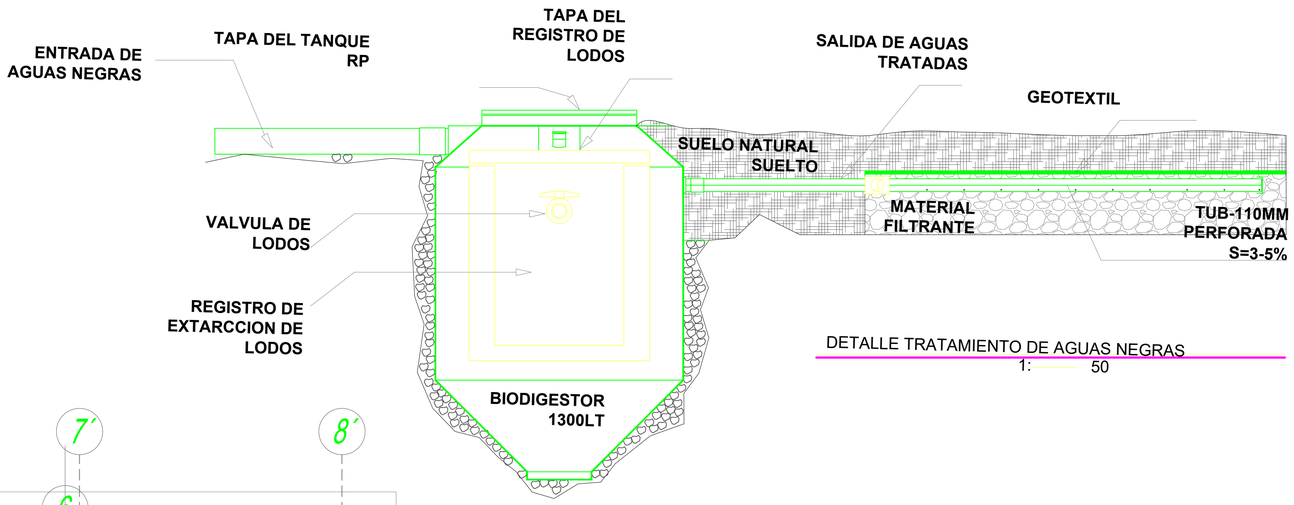


DETALLE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS
1: 50

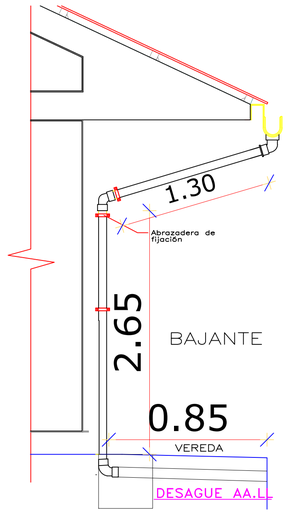

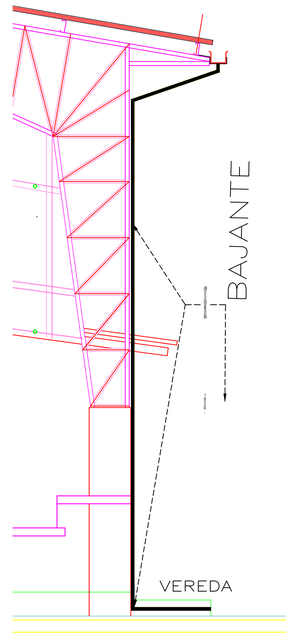

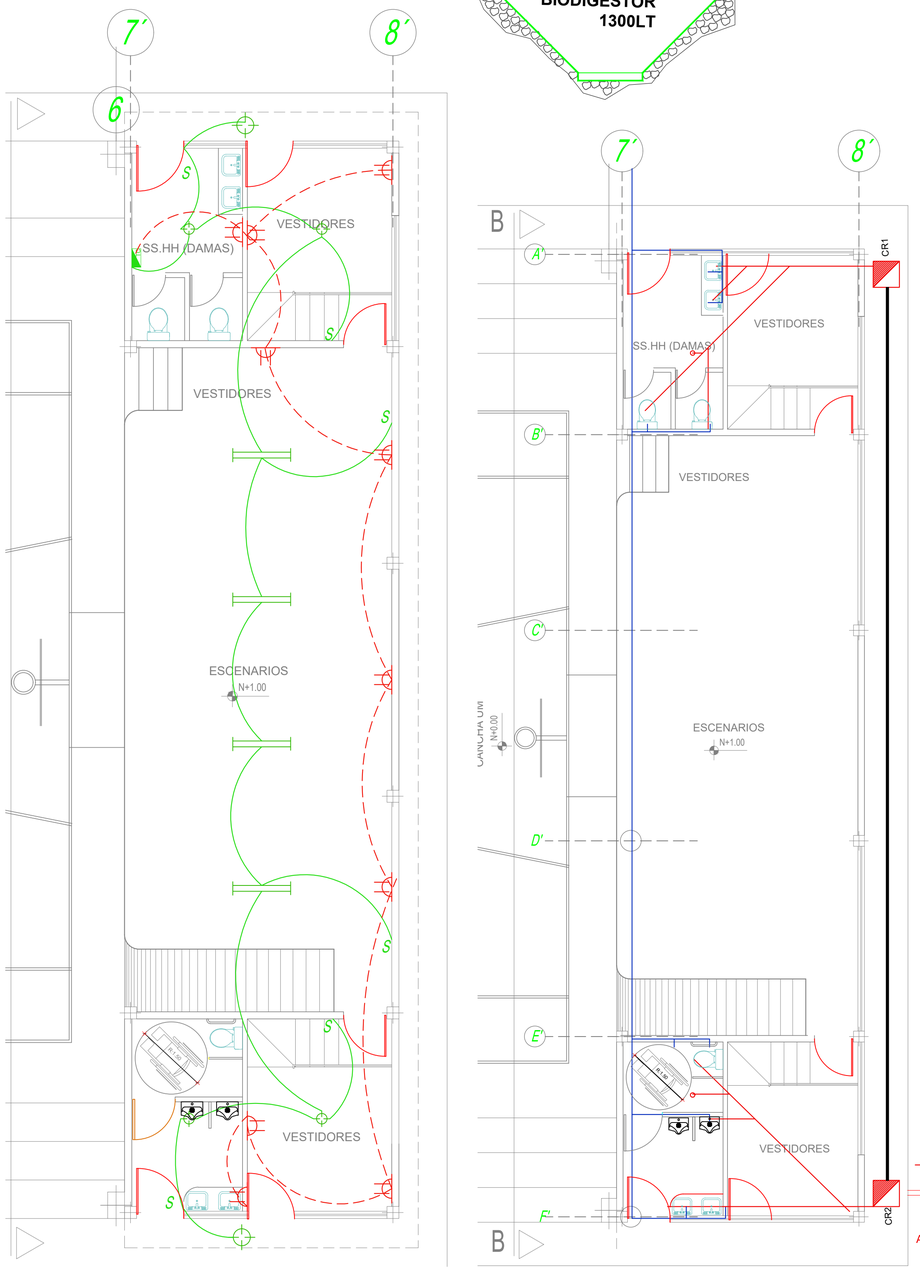

INSTALACIONES SANITARIAS

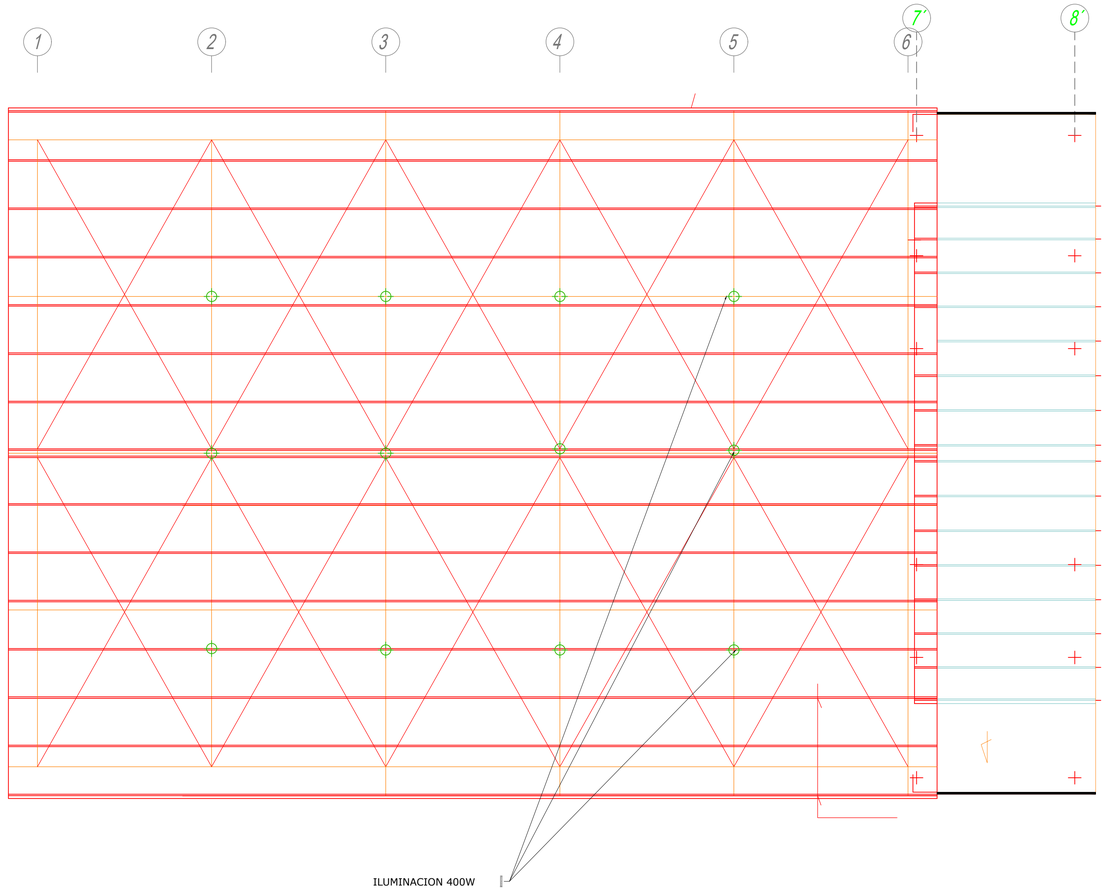


INSTALACION ELECTRICA PLANTA DE CUBIERTA

ESC: ----------S/E





CAMARA DE INFILTRACION



INSTALACIONES ELECTRICAS

ESC: ----------1/100

INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

ESC: ----------S/E


G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE:
- PLANOS AS-BUILT
- DETALLE INSTALACIONES ELECTRICAS
- DETALLE INSTALACION HIDROSANITARIA AA.SS
- DETALLE BIODIGESTOR

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	2/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA


PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SPS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMUN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

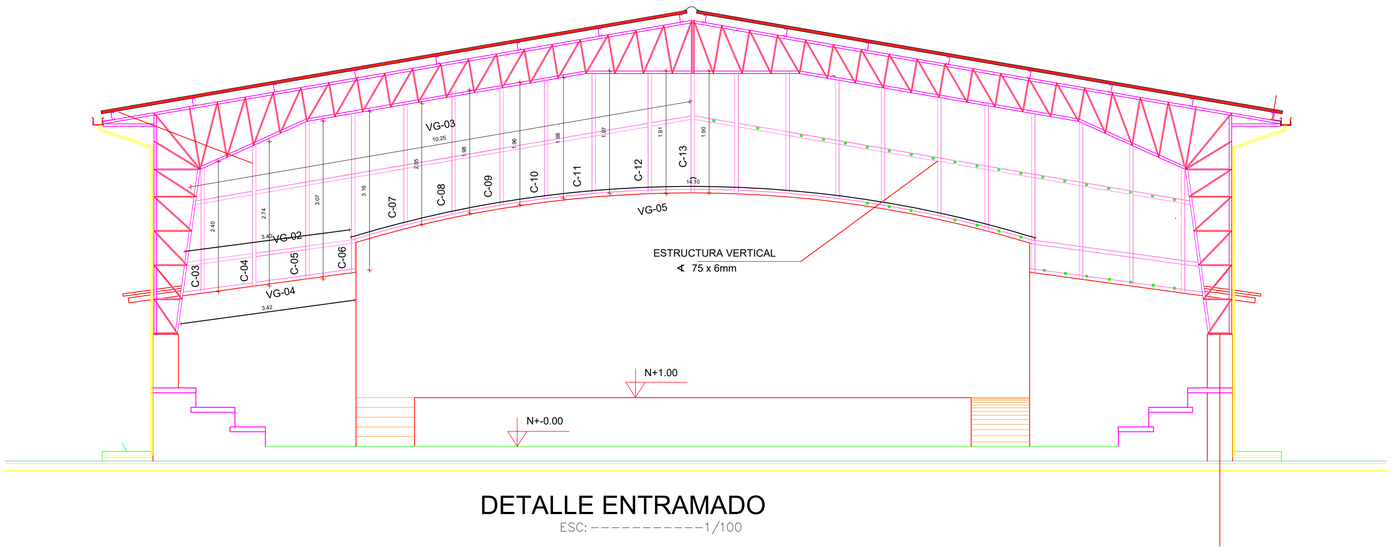

DETALLE ENTRAMADO


ESC: ----------1/100

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ESPESOR	PESO	PESO TOTAL
	(U)	(M)	(MM)	ML (KG)	KG
LARGUEROS					
ANGULO L 75 X 75 X 6 **VG-05**	1.00	14.10	6.00	7.07	99.69
ANGULO L 75 X 75 X 6 **VG-04**	2.00	3.42	6.00	7.07	48.36
ANGULO L 75 X 75 X 6 **VG-03**	2.00	10.25	6.00	7.07	144.94
ANGULO L 75 X 75 X 6 **VG-02**	2.00	3.40	6.00	7.07	48.08
MONTANTES					
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-03**	2.00	2.40	6.00	7.07	33.94
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-04**	2.00	2.74	6.00	7.07	38.74
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-05**	2.00	3.07	6.00	7.07	43.41
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-06**	2.00	3.16	6.00	7.07	44.68
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-07**	2.00	2.05	6.00	7.07	28.99
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-08**	2.00	1.98	6.00	7.07	28.00
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-09**	2.00	1.96	6.00	7.07	27.71
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-10**	2.00	1.98	6.00	7.07	28.00
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-11**	2.00	1.97	6.00	7.07	27.86
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-12**	2.00	1.91	6.00	7.07	27.01
ANGULO L 75 X 75 X 6 **C-13**	2.00	1.90	6.00	7.07	26.87
					696.28

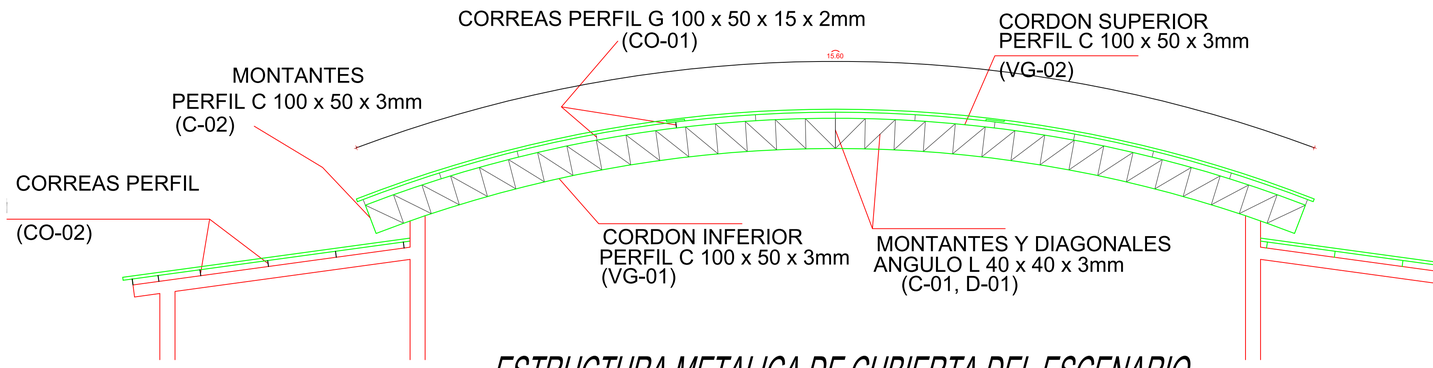


ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA DEL ESCENARIO

ESC: ----------S/E

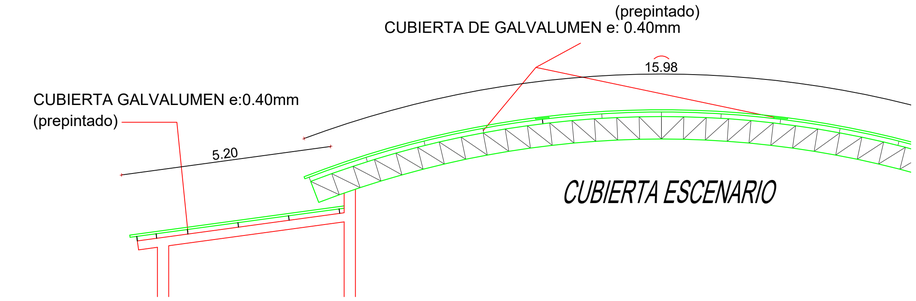

DETALLE CUBIERTA ESCENARIO

ESC: ----------S/E

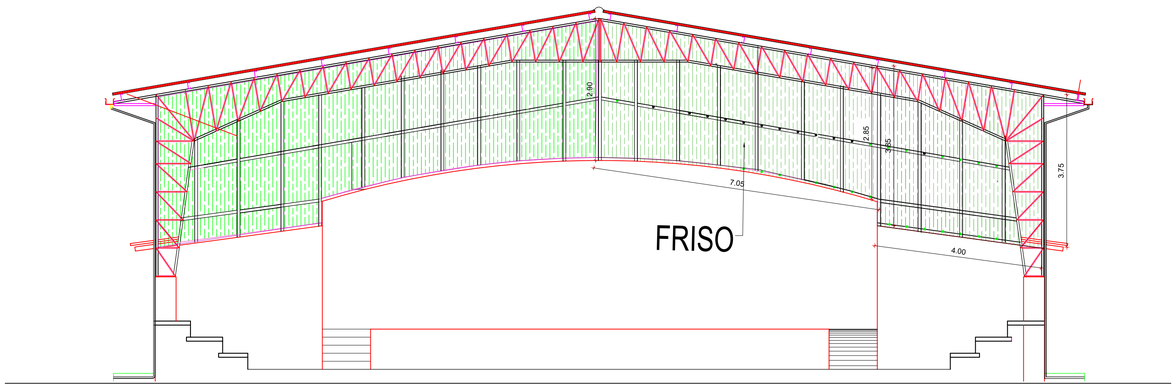

DETALLE FRISO

ESC: ----------1/100

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ESPESOR	PESO	PESO TOTAL
	(U)	(M)	(MM)	ML (KG)	KG
CORREAS LONGITUDINALES					
PERFIL G 100X50X15X2 **CO-01**	13.00	6.89	2.00	3.04	272.29
PERFIL G 100X50X15X3 **CO-02**	12.00	6.89	3.00	4.95	409.27
APOYO CORREAS PERFIL C 100X50X3	26.00	0.08	3.00	4.48	9.32
CORDONES TRANVERSALES CERCHA					
PERFIL C 100X50X3 **VG-02**	2.00	15.60	3.00	4.48	139.78
PERFIL C 100X50X3 **VG-01**	2.00	15.64	3.00	4.48	140.13
MONTANTES					
PERFIL C 100X50X3 **C-02**	4.00	0.50	3.00	4.48	8.96
ANGULO L 40 X40 X3 **C-01**	120.00	0.48	3.00	1.77	101.95
DIAGONALES					
ANGULO L 40 X40 X3 **D-01**	124.00	0.64	3.00	1.77	140.47
					1222.17


G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE:
- PLANOS AS-BUILT
- DETALLE ENTRAMADO ESCENARIO
- ACERO ESTRUCTURAL
- DETALLE CUBIERTA ESCENARIO

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	3/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA


PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
Firmado electrónicamente por: ALEXANDER EDUARDO ACOSTA SUPE	Firmado electrónicamente por: CAROL VALERIA CARRERA VELEZ	Firmado electrónicamente por: CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS	Firmado electrónicamente por: ANDRES FABIAN CHIQUITO YUMBO
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SP5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMÚN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

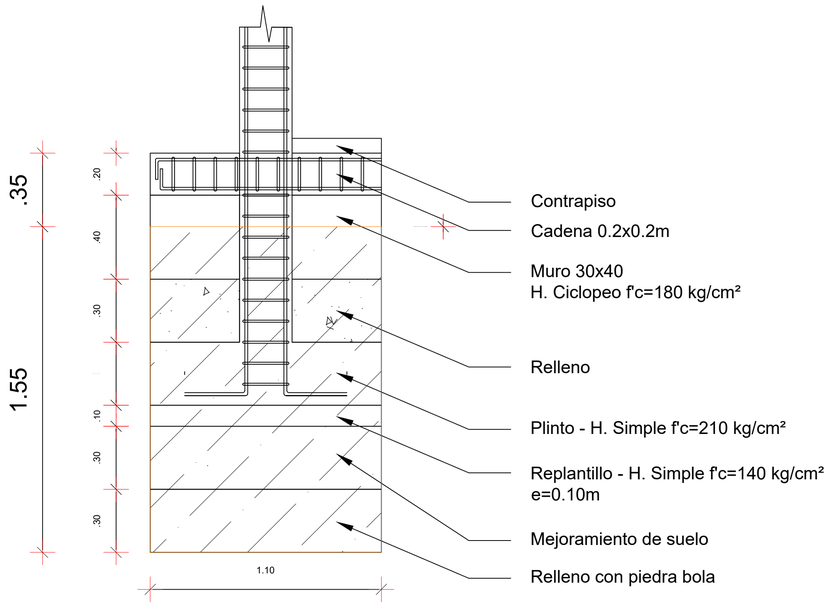

PLINTO TIPO P1-P2


ESC: ----------1/100

PLINTO TIPO I




ARMADO DE PLINTO TIPO A
8" (A', B, C', D', E' , F')
ESCALA..... 1 : 50

PLINTO TIPO II




ARMADO DE PLINTO TIPO B
7" (A', B', E' , F')
ESCALA..... 1 : 50

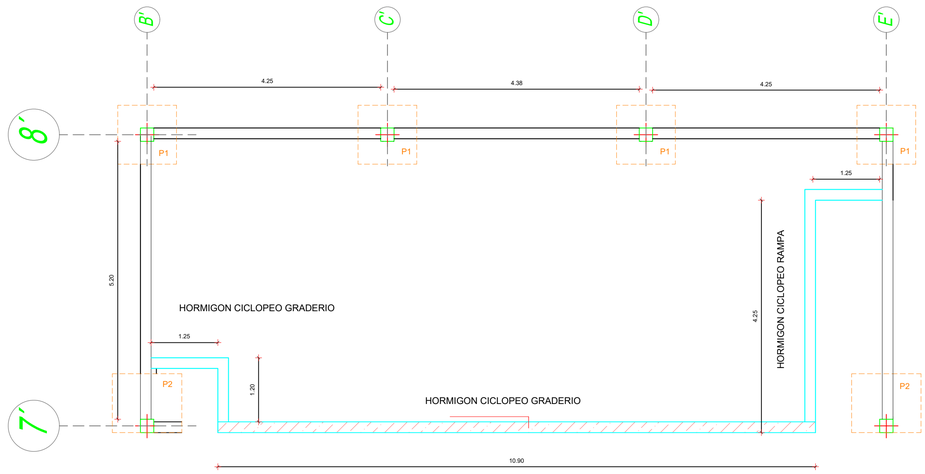


DETALLE MURO CORTE RAMPA Y GRADERIO

ESC: ----------1/100

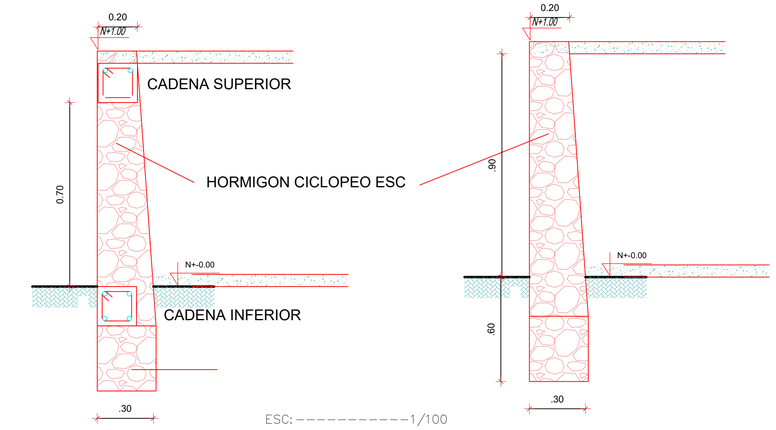


ESC: ----------1/100

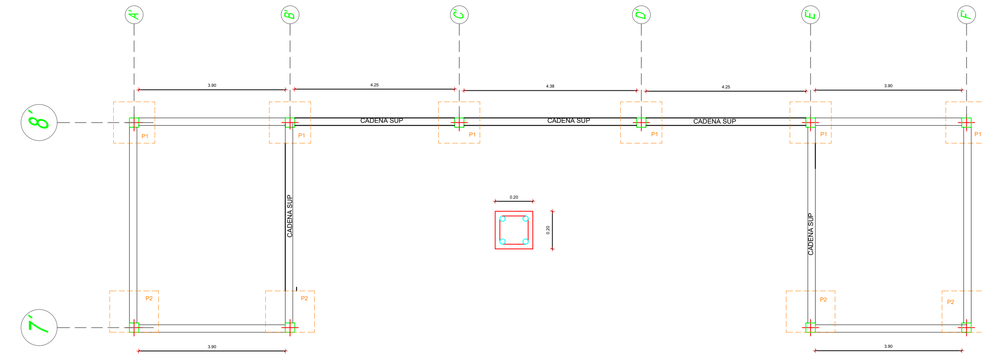


DETALLE HORMIGON SIMPLE CADENA SUPERIOR

ESC: ----------1/100

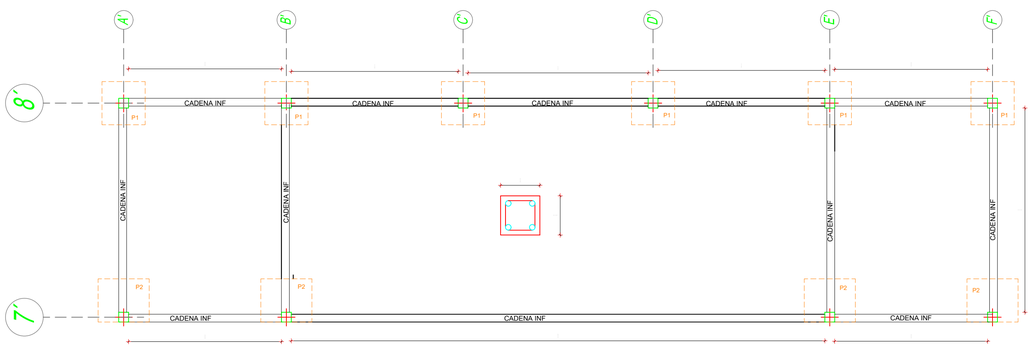

DETALLE HORMIGON SIMPLE CADENA INFERIOR

ESC: ----------1/100

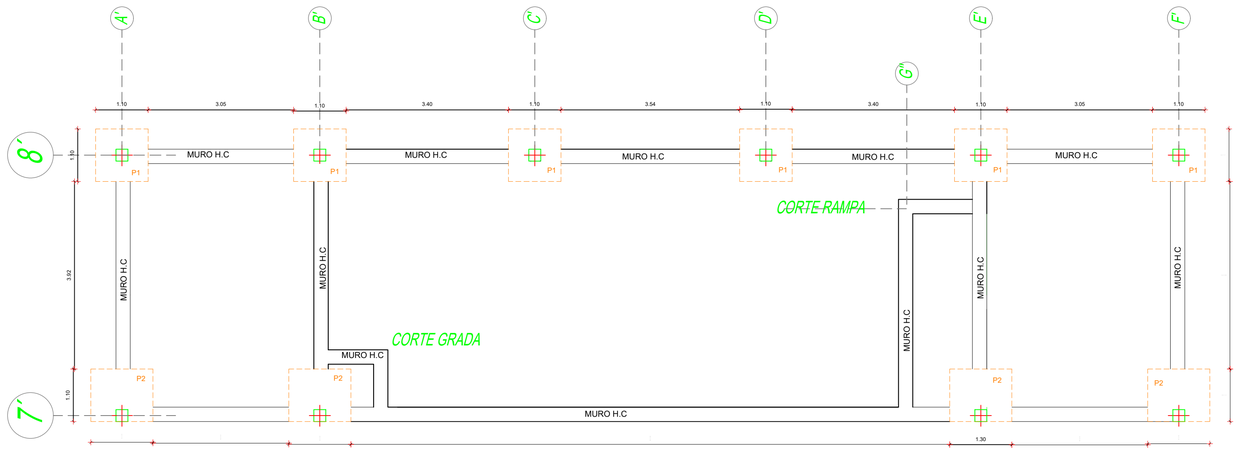

PLANTA DE CIMENTACION

ESC: ----------1/100


G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".


CONTIENE:
PLANOS AS-BUILT
DETALLE PLANTA DE CIMENTACION: PLINTO
DETALLE DE CADENAS INFERIOR Y SUPERIOR
DETALLE DE MUROS DE H. CICLOPEO

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	4/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA


PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SP5 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMÚN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS




CORTE DINTEL HORIZONTAL



SECCION DE RIOSTRA VERTICAL

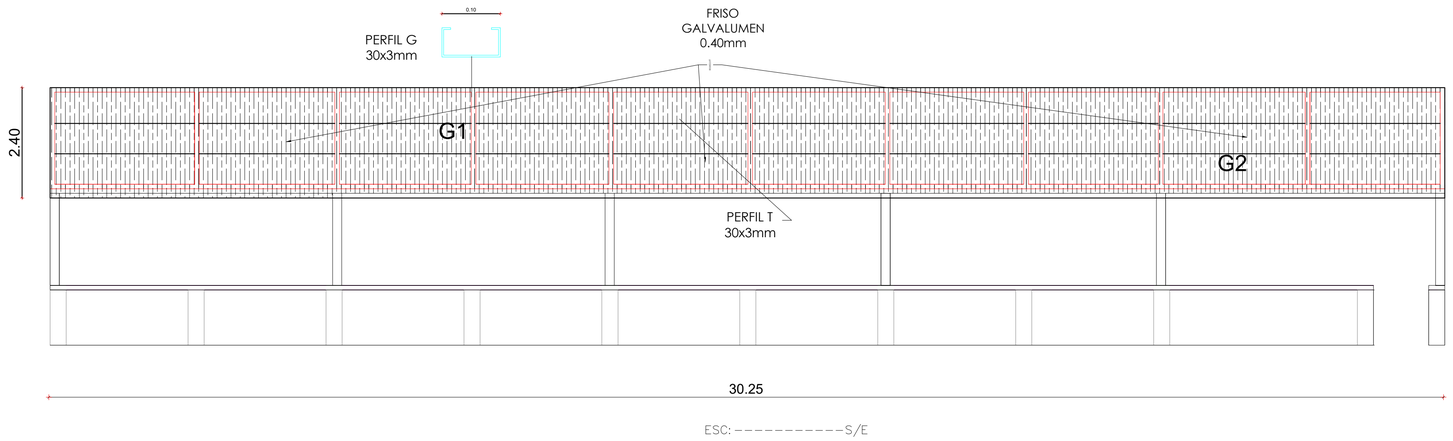

ESC: ----------S/E

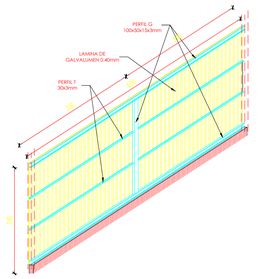


DETALLE FRIZO


ESC: ----------1: 25

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ESPESOR	PESO	PESO TOTAL
	(U)	(M)	(MM)	ML (KG)	KG
TEE LONGITUDINALES					
PERFIL T 30 X 30 X 3 **T**	4.00	29.15	3.00	1.41	164.41
G LONGITUDINALES Y VERTICALES					
PERFIL G 100X50X15X3 **G2**	4.00	30.25	3.00	4.95	598.95
PERFIL G 100X50X15X3 **G1**	22.00	2.00	3.00	4.95	217.80
					981.16

ESC: ----------S/E

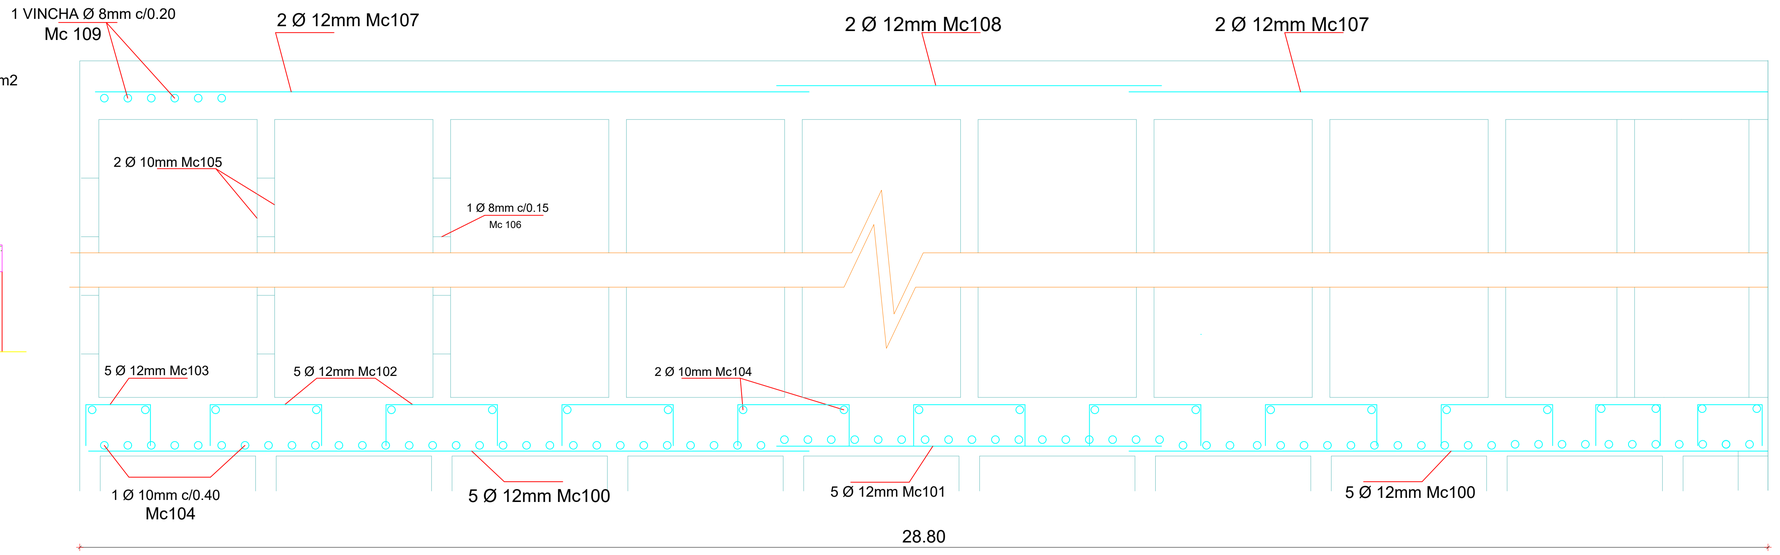

RESUMEN DE HIERRO												
Mc	ϕ (mm)	Tipo	No.	DIMENSIONES a	b	c	d	g	Tras	Longitud desarrollo	Longitud total	Peso Kg
GRADERIOS												
PANTALLA												
90	12	|	291	0.40						0.40	116.40	*103.36*
GRADAS												
100	12	I	60	12.00						12.00	720.00	*639.36*
101	12	I	30	4.70						4.70	141.00	*125.21*
DES	12	I	5	5.60						5.60	28.00	*24.86*
102	12	C	225	1.90	0.05	0.05				2.00	450.00	*399.60*
102A	12	L	10	0.95	0.05					1.00	10.00	*8.88*
103	12	C	90	1.10	0.05	0.05				1.20	108.00	*95.90*
104	10	I	550	0.75						0.75	412.50	*254.51*
RIOSTRA												
105	10	L	44	2.15	0.20					2.35	103.40	*63.80*
106	8	C	293	0.15	0.05	0.05				0.25	73.25	*28.93*
107	12	I	8	12.00						12.00	96.00	*85.25*
108	12	I	4	4.70						4.70	18.80	*16.69*
109	8	C	288	0.07	0.05	0.05				0.17	48.96	*19.34*
RESUMEN DE HIERRO												
Diam		6	8	10	12	14	16	18	20	25	28	**RESUMEN**
Elemen												**TOTAL**
Peso/ml		0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.853	4.834	**HIERRO**
Long.(m)		0.00	122.21	515.90	1632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**(Kg)**
Peso (Kg)		0.00	48.27	318.31	1449.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1815.97**

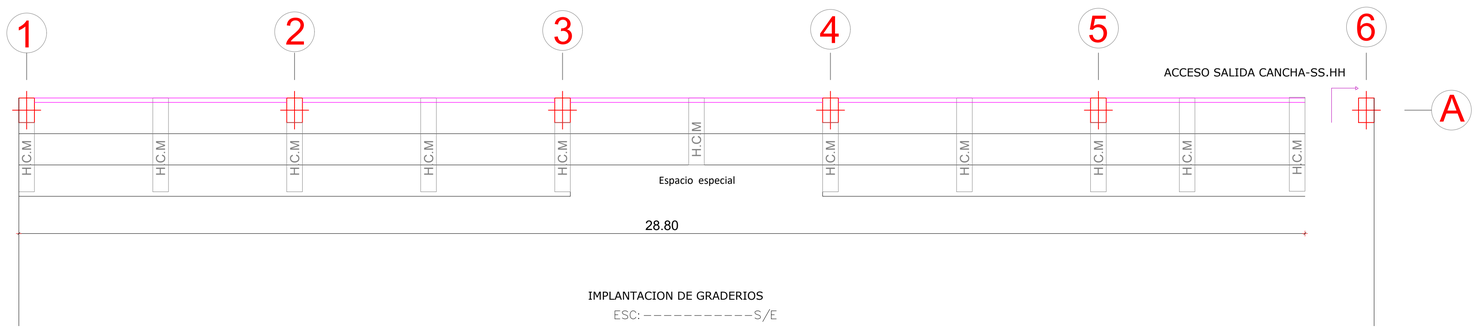

IMPLANTACION DE GRADERIOS

ESC: ----------S/E


G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE:
PLANOS AS-BUILT
DETALLE FRISO GRADERIOS
IMPLANTACION DE GRADERIOS-MURO GRADERIOS
RESUMEN DE ACERO REFUERZO Y ACERO ESTRUCTURAL ENTRAMADO

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	5/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA

PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SPS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMÚN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

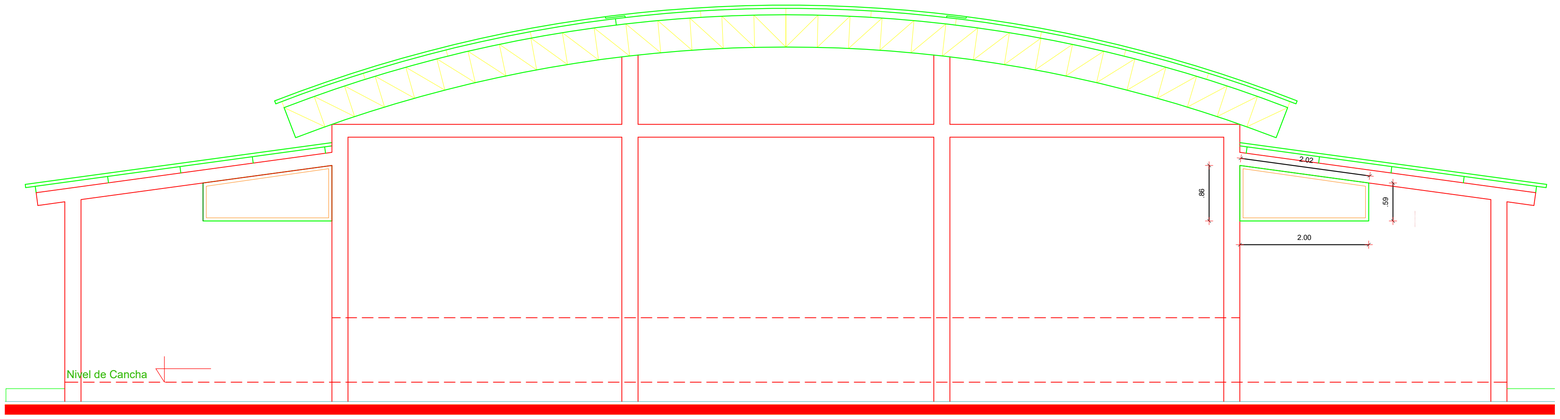


FACHADA POSTERIOR DEL ESCENARIO

ESC: ----------S/E



FACHADA LATERAL DEL ESCENARIO A'-F'

ESC: ----------S/E

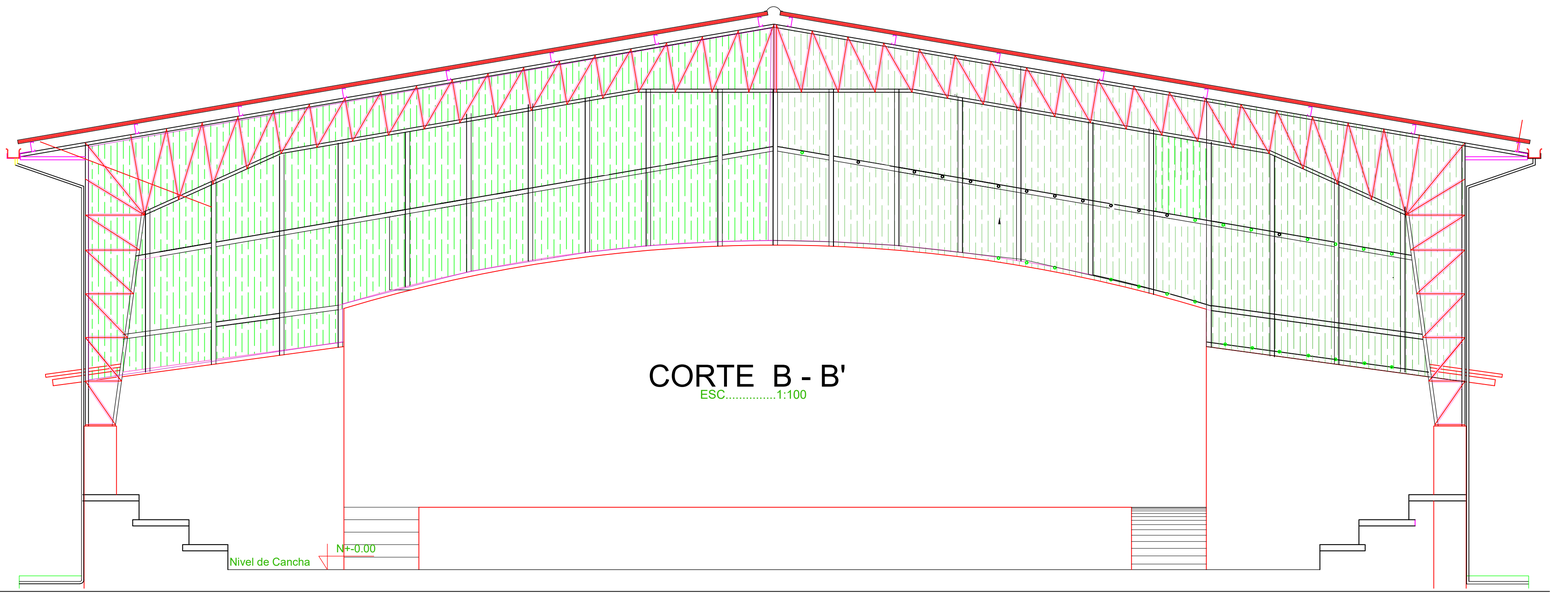


CORTE B - B'

ESC.....1:100


FACHADA FRONTAL DEL ESCENARIO


ESC: ----------S/E



DETALLE LINEA CONDUCCION AA.PP

ESC: ----------S/E

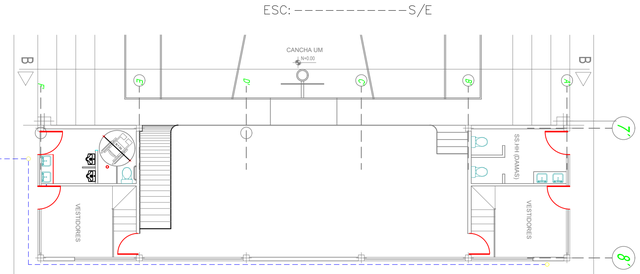

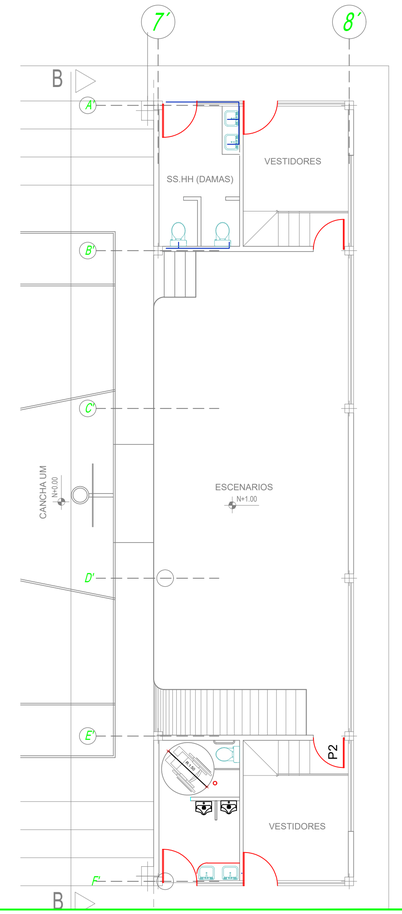

PLANTA ARQUITECTONICA IMPLANTACION

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE:
- PLANOS AS-BUILT
- FACHADAS
- IMPLANTACION ARQUITECTONICA ESCENARIO
- DETALLE LINEA AGUA FRIA

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	6/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA


PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SPS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMÚN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

DETALLE HIDRAULICO CR AA.LL

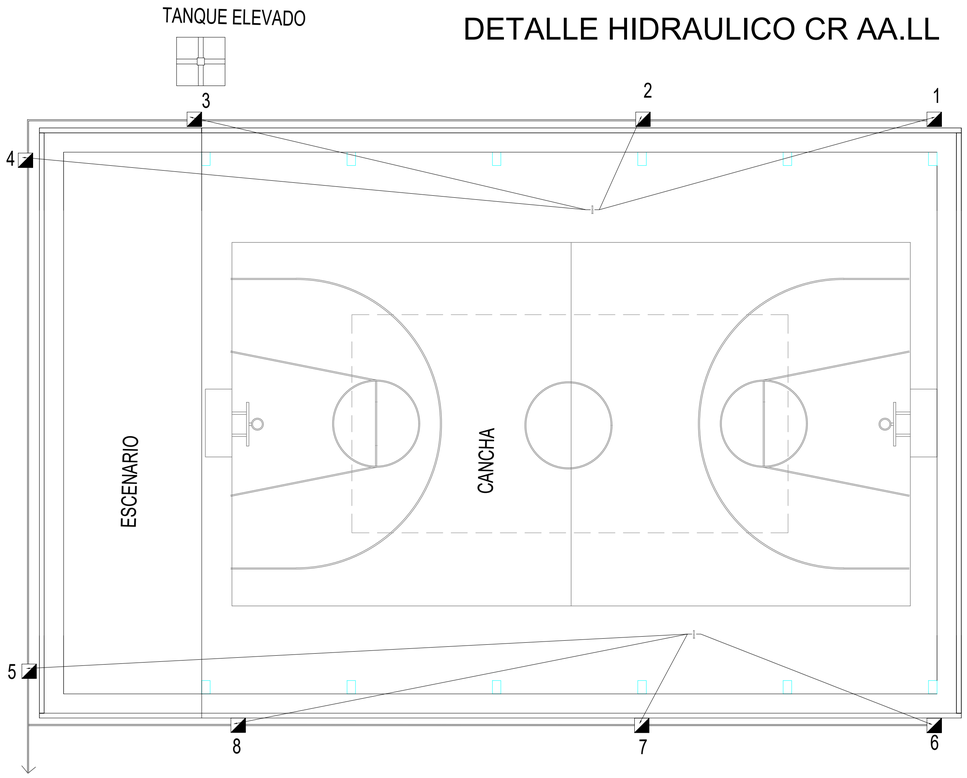


CANCHA CUBIERTA

IMPLANTACION GENERAL ESC: ----------S/E

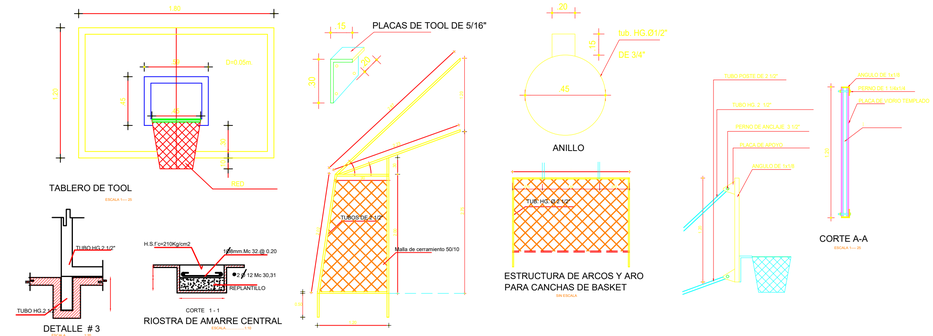

DETALLE DE ESTRUCTURA BIFUNCIONAL ARCOS Y TABLERO

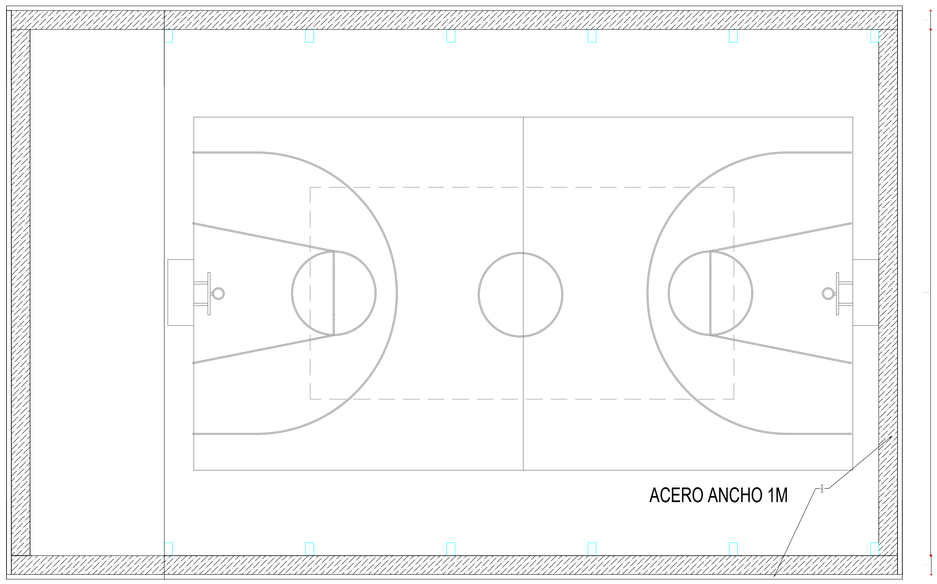


CANCHA CUBIERTA

IMPLANTACION GENERAL

DETALLE DE ACERA

ESC: ----------S/E

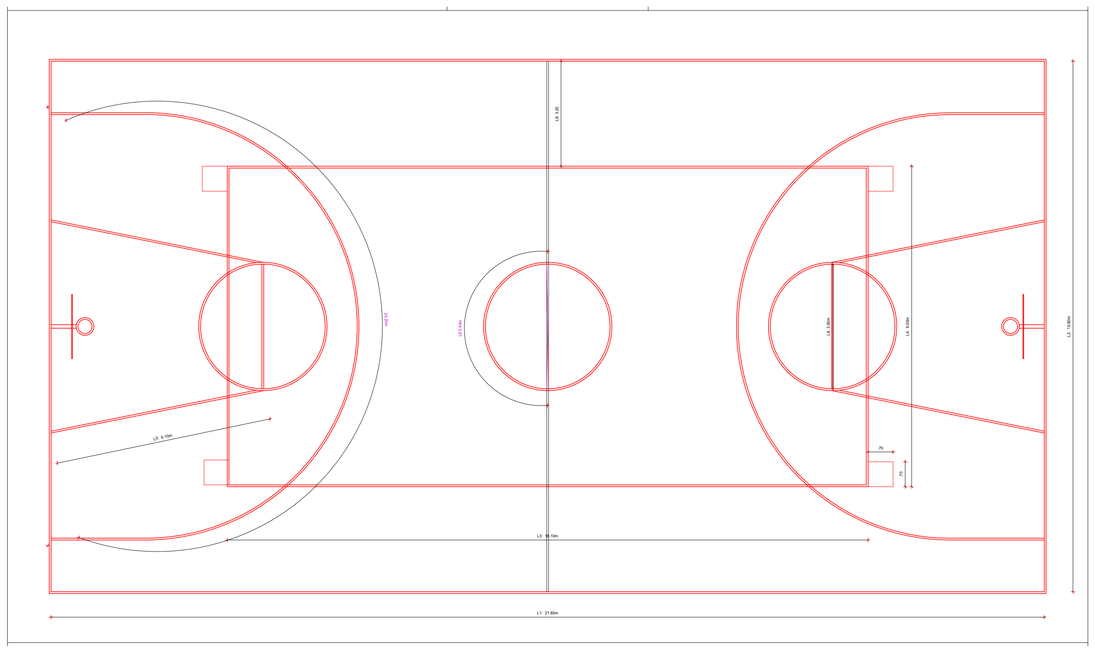

ESC: ----------S/E

DETALLE SENALIZACION AREA DEPORTIVA


G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO


"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE:
- PLANOS AS-BUILT
- DETALLE SENALIZACION DEPORTIVA
- DETALLE CONSTRUCTIVO ARCOS Y TABLERO
- DETALLE DE IMPLANTACION PERIMETRAL

FECHA DE INICIO DE OBRA:	FECHA FIN DE OBRA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
FEBRERO DEL 2026	MAYO DEL 2026	INDICADAS	7/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE DE OBRA

PROYECTISTA :	ADMINISTRADORA DE CONTRATO :	FISCALIZADOR :	CONTRATISTA:
Firmado digitalmente por: ALEXANDER EDUARDO ACOSTA SUPE	Firmado digitalmente por: CAROL VALERIA CARRERA VELEZ	Firmado digitalmente por: CARLOS ROBERTO VELEZ BURGOS	Firmado digitalmente por: ANDRES FABIAN CHIQUITO TUMBO
ARQ. ALEXANDER ACOSTA SPS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA. ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VELEZ B. Coordinador de Fiscalización DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMÚN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS






COLUMNA TIPO


ESCALA: 1 ——— 10

PLANILLA DE HIERRO TANQUE ELEVADO												
Mc	Φ (mm)	Tipo	No.	DIMENSIONES a	b	c	d	g	Tras	Longitud desarrollo	Longitud total	Peso Kg
PLINTOS												
500	12	C	22	1.50	0.15	0.15				1.80	39.60	*35.16*
COLUMNA												
501	12	L	2	3.85	0.30					4.15	8.30	*7.37*
502	14	L	4	3.85	0.30					4.15	16.60	*20.05*
505	10	O	45	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10		1.10	49.50	*30.54*
VIGA-LOSETA												
550	12	C	4	1.70	0.10	0.10				1.90	7.60	*6.75*
551	14	C	8	1.70	0.10	0.10				1.90	15.20	*18.36*
552	12	C	24	1.70	0.08	0.08				1.86	44.64	*39.64*
553	10	O	24	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10		0.70	16.80	*10.37*
RESUMEN DE HIERRO												
Diam		6	8	10	12	14	16	18	20	25	28	RESUMEN TOTAL HIERRO (Kg)
Elemen												
Peso/ml		0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.853	4.834	
Long	(m)	0.00	0.00	66.30	100.14	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Peso	(Kg)	0.00	0.00	40.91	88.92	38.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**168.24**

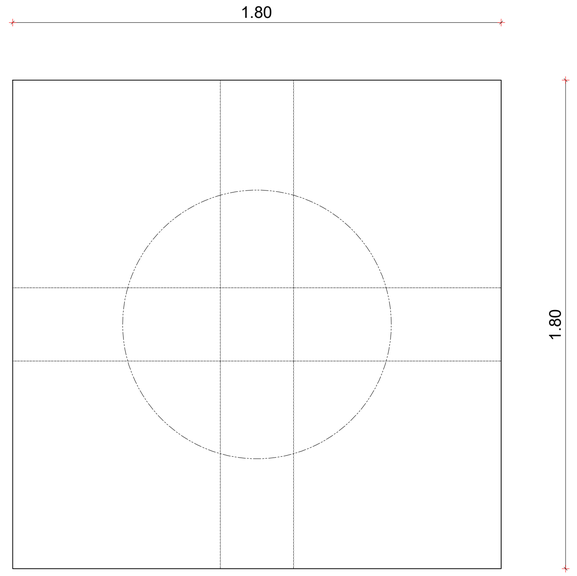


IMPLANTACIÓN LOSETA

ESCALA: 1 ——— 25

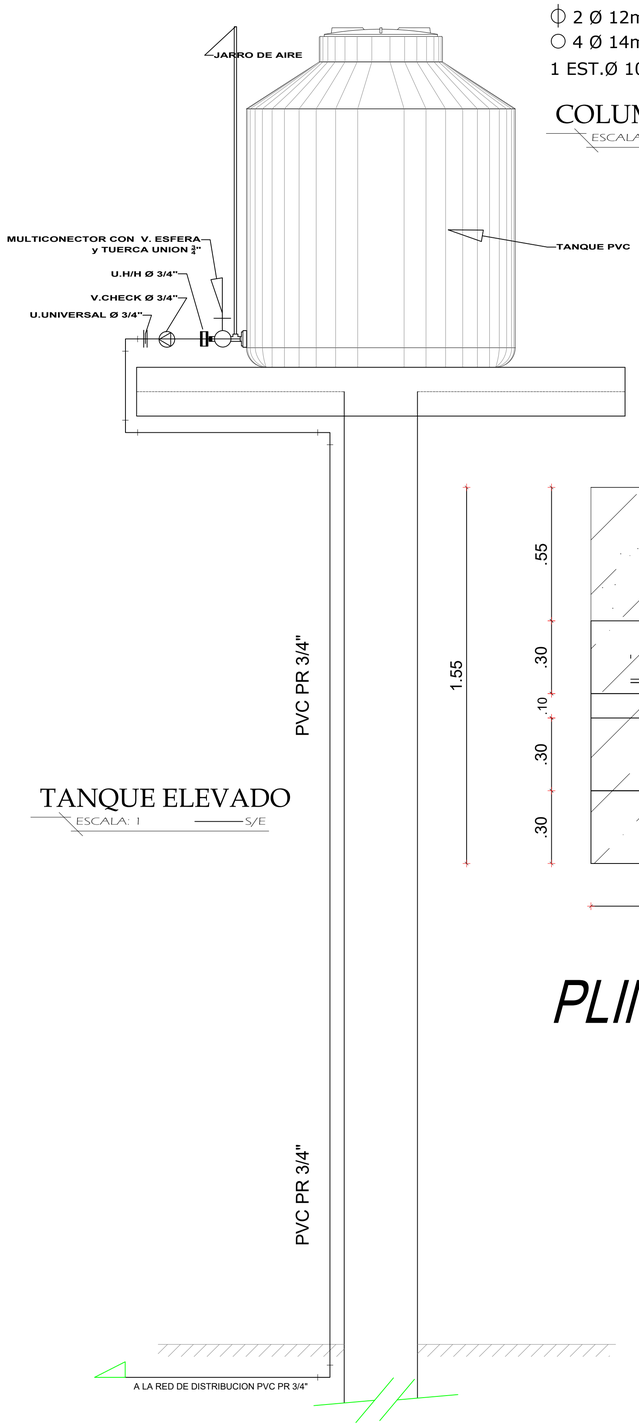


TANQUE ELEVADO

ESCALA: 1 ——— S/E

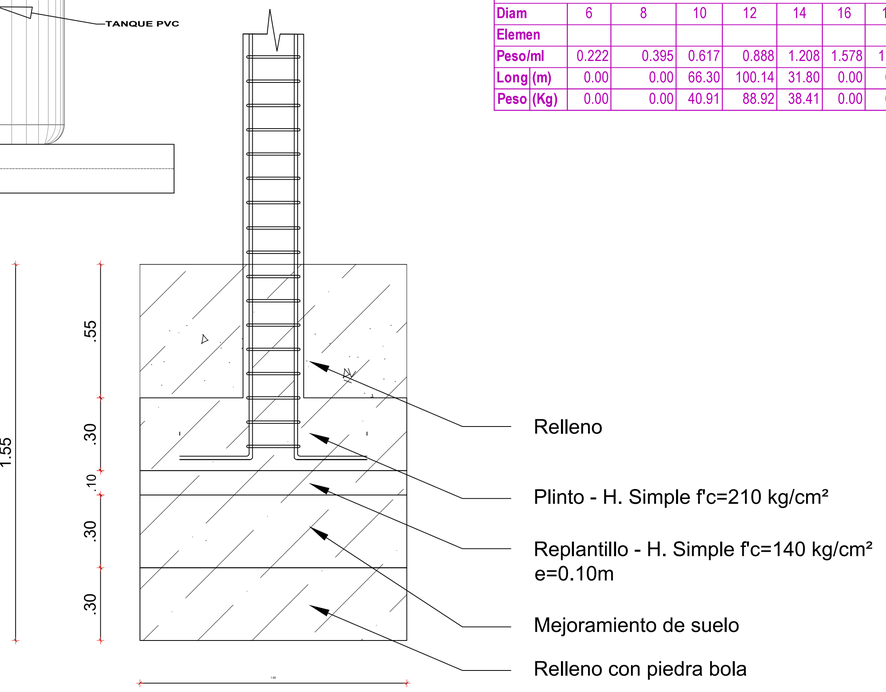


PLINTO TIPO TANQUE ELEVADO

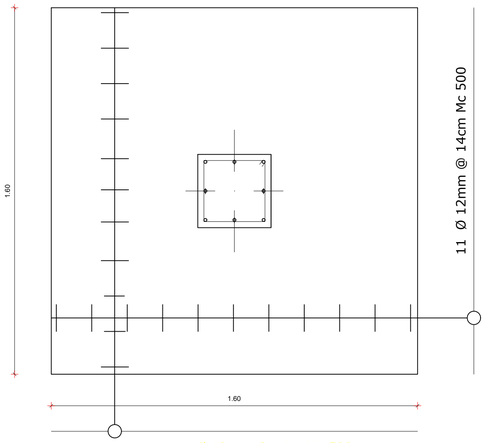

PLINTO TIPO

ESCALA: 1 ——— 25

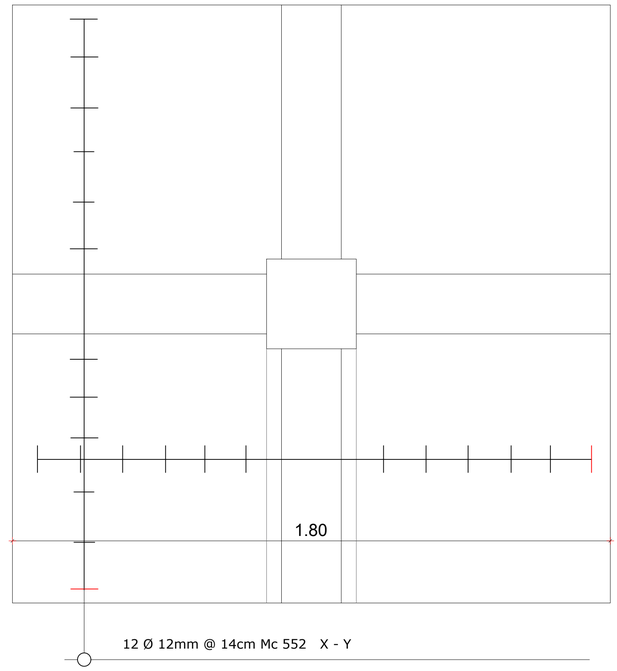

DETALLE ARMADO LOSETA

ESCALA: 1 ——— S/E

G.A.D. MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y GRADERIO PARA LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD KICHWA SAN LORENZO, PARROQUIA PUERTO MURIALDO, CANTON LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.".

CONTIENE: TANQUE ELEVADO/COLUMNA TIPO
IMPLANTACIÓN LOSETA
ASBUILT

FECHA:	ESCALAS:	LAMINA:	DIBUJO:
MAYO DE 2026	INDICADAS	8/8	ING. ANDRES CHIQUITO RESIDENTE

PROYECTISTA :	FISCALIZADOR :	ADMINISTRADOR:	CONTRATISTA
ALEXANDER EDUARDO ACOSTA SUVE	CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS	CAROL VALERIA CARRERA VELEZ	ANDRES FABIAN CHIQUITO TUNDO
ARQ. ALEXANDER ACOSTA PROYECTISTA DEL G.A.D.M.L.	ING. CARLOS N. VÉLEZ B. COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN DEL G.A.D.M.L.	ING. CAROL CARRERA ANALISTA OO.PP DEL G.A.D.M.L.	ING. ANDRES CHIQUITO PROCURADOR COMUN CONSORCIO MURIALDO LOREBRAS

ACTA DE DESIGNACIÓN DE SECRETARIO/A

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA No. LICO-GADML-2026-03

Objeto: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS"

1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA

En la ciudad de Loreto, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veintiséis, en la oficina de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, ubicada en el primer piso alto del módulo dos del edificio institucional, situado entre la avenida Rafael Andrade y la avenida Gregorio Urapari, comparecen los miembros de la Comisión Técnica designada mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, integrada por:

- Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, con cédula de ciudadanía No. 1315120483, SP6 - Analista de Obras Públicas, Coordinación de Mantenimiento Vial, con evaluación aprobada en Fundamentos de Contratación Pública de fecha 18 de enero de 2025, código hJYH8NpRhf, quien actúa como Presidenta de la Comisión Técnica;
- Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, con cédula de ciudadanía No. 1314792076, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, con evaluación aprobada en Fundamentos de Contratación Pública de fecha 08 de noviembre de 2025, código l3D4H6HiaO, quien actúa como Delegada del Titular del Área Requirente;
- Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza, con cédula de ciudadanía No. 1309544805, Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes, con evaluación aprobada en Fundamentos de Contratación Pública de fecha 26 de julio de 2025, código 0474AgB4o8, quien actúa como Profesional afín al objeto de la contratación.

Se deja constancia de que, mediante la misma Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, fue designado como Alterno de la Presidenta de la Comisión Técnica el Ing. Juan Pedro Sanmartín Eras, con cédula de ciudadanía No. 1724960479, Coordinador de Mantenimiento Vial, certificación en Fundamentos de Contratación Pública de fecha 14 de junio de 2025, código 6E5y40o5AA, quien actuará exclusivamente cuando, por causas imprevistas o de fuerza mayor, la Presidenta titular no pueda integrar la Comisión Técnica, circunstancia que deberá constar motivadamente en el expediente del procedimiento. En la presente actuación no interviene el alterno por encontrarse presente la Presidenta titular.

2. BASE LEGAL

La presente actuación se sustenta en las siguientes disposiciones:

Artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece los principios de legalidad, igualdad, trato justo, concurrencia, transparencia, integridad, seguridad jurídica, sostenibilidad, mejor valor por dinero y demás principios que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública.

Artículo 88 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que dispone la conformación de la Comisión Técnica para los procedimientos cuyo presupuesto referencial sea igual o superior a USD 100.000,00; establece su integración; determina que el Presidente contará con un alterno; y dispone que la Comisión Técnica designará un Secretario o Secretaria de fuera de su seno, quien actuará con voz informativa y sin voto, sin responsabilidad respecto de las decisiones adoptadas por dicho órgano colegiado.

Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, mediante la cual la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03 y conformó la Comisión Técnica responsable de sustanciar las actuaciones de la fase precontractual.

3. DESIGNACIÓN DE SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Instalada la Comisión Técnica y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los miembros de la Comisión proceden a designar a la Secretaria que actuará durante la sustanciación de la fase precontractual del procedimiento.

Luego del análisis correspondiente y por decisión unánime de sus integrantes, la Comisión Técnica **RESUELVE**:

PRIMERO.- Designar como **SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA** del procedimiento de **Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03** a la **Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres**, con cédula de ciudadanía No. **1501125635**, **SP6 - Ingeniero Civil**, de la **Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento**, con certificación en **Fundamentos de Contratación Pública** de fecha **31 de agosto de 2024**, código **gDLB1JFVNu**, quien, encontrándose presente, acepta la designación efectuada por la Comisión Técnica.

SEGUNDO.- La Secretaria actuará **con voz informativa y sin voto**, siendo responsable de la elaboración, organización, custodia y certificación de las actas, informes, matrices, comunicaciones y demás documentos que se generen durante la fase precontractual del procedimiento, sin responsabilidad respecto de las decisiones adoptadas por la Comisión Técnica, conforme lo previsto en el artículo 88 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

TERCERO.- Disponer que la presente Acta forme parte integrante del expediente administrativo del procedimiento de contratación y sea incorporada al expediente electrónico correspondiente para los fines legales pertinentes.

4. CLAUSURA

No existiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta declara clausurada la presente sesión, disponiendo que la Secretaria designada continúe con las actuaciones administrativas necesarias para el desarrollo de la fase precontractual del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03.

Para constancia de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica y la Secretaria designada suscriben la presente Acta en la ciudad de Loreto, a los trece (13) días del mes de julio de dos mil veintiséis.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Públicas
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura
DELEGADA DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
RODRIGO JAVIER NOGUERA MENDOZA

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
DALIA SILVANA SANMARTIN TORRES

Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - Ingeniero Civil
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

En unidad construimos el Progreso
Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

ACTA DE VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD DE LA OFERTA Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS No. LICO-GADML-2026-03

Objeto: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS"

1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA

En la ciudad de Loreto, a los veintiún (21) días del mes de julio de dos mil veintiséis, en la oficina de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, ubicada en el primer piso alto del módulo dos del edificio institucional, situado entre la avenida Rafael Andrade y la avenida Gregorio Urapari, comparecen los integrantes de la Comisión Técnica designada mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, expedida por la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, para sustanciar la fase precontractual del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, integrada por:

- Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, SP6 - Analista de Obras Públicas, Presidenta de la Comisión Técnica;
- Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, Delegada del Titular del Área Requirente;
- Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza, Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes, Profesional afín al objeto de la contratación;
- Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres, SP6 - Ingeniera Civil de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento, Secretaria de la Comisión Técnica.

Instalada la Comisión Técnica, la Presidenta declara abierta la sesión para efectuar la verificación de integridad de la oferta presentada dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, así como para determinar la existencia o no de errores de forma susceptibles de convalidación, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y el cronograma establecido en el pliego.

2. BASE LEGAL

La Comisión Técnica sustenta la presente etapa de verificación de integridad de la oferta y convalidación de errores en las siguientes disposiciones:

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

El artículo 3 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que los procedimientos de contratación pública deberán desarrollarse con observancia de los principios de legalidad, trato justo, seguridad jurídica, concurrencia, igualdad, simplificación, transparencia, integridad, resultado y mejor valor por dinero, garantizando actuaciones objetivas, motivadas y sujetas a las reglas previamente determinadas.

El artículo 28 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone que los pliegos deberán incluir obligatoriamente un plazo para la convalidación de errores de forma de las ofertas, cuyo objetivo es salvaguardar los principios de concurrencia, buena fe e interdicción de la arbitrariedad.

El artículo 99 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que, luego de la apertura de las ofertas, la entidad contratante se encuentra obligada a verificar la integridad de los documentos solicitados, con la finalidad de identificar la existencia de errores susceptibles de convalidación.

El artículo 100 del referido Reglamento determina que las ofertas, una vez presentadas, no podrán ser modificadas; no obstante, los errores de forma podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos (2) y máximo de cinco (5) días, contados desde la fecha de notificación efectuada a través del Portal de Contratación Pública. La misma disposición identifica como errores convalidables, entre otros, los errores tipográficos, de foliado u organización; la certificación de documentos; la falta de documentación de soporte de información ya referenciada en la oferta; la ilegibilidad, falta de claridad o contradicciones internas; la falta o imposibilidad de validación de firmas electrónicas; y, en procedimientos de obras, los análisis de precios unitarios que contengan salarios inferiores a los determinados por la Contraloría General del Estado, siempre que no se modifique el monto ofertado. En caso de duda, la Comisión Técnica deberá solicitar la convalidación aplicando los principios de igualdad y racionalidad.

El artículo 101 del Reglamento General regula la corrección de errores aritméticos de la oferta económica y establece que, en los procedimientos para la ejecución de obras, prevalecerá el precio unitario constante en el Análisis de Precios Unitarios sobre el registrado en la tabla de cantidades y precios; asimismo, las diferencias en unidades de medida o cantidades deberán corregirse con sujeción a lo establecido en el pliego.

El artículo 102 del Reglamento General determina que no serán convalidables la falta de documentación o información que no tenga referencia dentro de la oferta y el incumplimiento de los requerimientos técnicos, constituyendo su existencia causal de rechazo.

El artículo 103 del mismo cuerpo reglamentario prohíbe solicitar durante la etapa de convalidación documentos o información que no se encuentren referenciados en la

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

oferta, condiciones no previstas en el pliego, así como formular nuevos requerimientos o modificar las capacidades técnicas, económicas o legales del oferente.

Finalmente, el artículo 104 del Reglamento General establece como causas de rechazo y descalificación la falta de convalidación en el tiempo y forma dispuestos, la existencia de errores no convalidables y el incumplimiento de requisitos mínimos evaluados bajo la metodología "Cumple/No Cumple"; disponiendo que la Comisión Técnica deberá dejar constancia de su análisis en el acta o informe correspondiente y aclarando que la oferta no podrá ser rechazada únicamente por falta de integridad, por tratarse de un requisito de naturaleza convalidable.

Con base en estas disposiciones, la Comisión Técnica procederá a verificar la presencia, correspondencia, legibilidad, consistencia y validez de la documentación presentada, identificando de manera motivada los errores de forma susceptibles de convalidación, los errores aritméticos que deban corregirse y, de ser el caso, los incumplimientos de naturaleza no convalidable, sin permitir que la convalidación modifique el contenido sustancial de la oferta, el precio ofertado o las capacidades y condiciones existentes a la fecha límite de presentación.

3. INFORMACIÓN DEL PROCESO

Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO
Código del procedimiento:	LICO-GADML-2026-03
Procedimiento:	Licitación de Obras
Objeto contractual:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS
CPC:	532900011 - OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
Presupuesto referencial:	121.455,88000 (Ciento Veintiún Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco dólares 88000/100000 centavos) dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir el IVA
Plazo de ejecución:	120 días contados a partir de A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE LA OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Forma de pago:	Anticipo: 35% Saldo: 65.00%

4. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, el señor Kleber Fabián Olalla Torres, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, resolvió aprobar los pliegos y el cronograma, autorizar el inicio del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03 para la

contratación de la obra denominada "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS", con un presupuesto referencial de USD 121.455,88, sin incluir IVA.

- Mediante el artículo 5 de la referida Resolución Administrativa, la máxima autoridad conformó la Comisión Técnica responsable de sustanciar la fase precontractual del procedimiento, integrada por la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, en calidad de Presidenta; la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, como Delegada del Titular del Área Requirente; y el Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza, como Profesional afín al objeto de la contratación. Asimismo, se designó como Secretaria de la Comisión Técnica a la Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres, mediante Acta de Designación de Secretaria de fecha 13 de julio de 2026.
- Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0548-M-GD, de fecha 13 de julio de 2026, el Coordinador de Compras Públicas notificó a la Comisión Técnica la publicación del procedimiento y las actuaciones correspondientes a la fase precontractual.
- Mediante Acta de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones de fecha 13 de julio de 2026, la Comisión Técnica conoció y resolvió la única consulta presentada dentro del término previsto en el Portal Oficial de Contratación Pública, disponiendo la publicación de la respuesta correspondiente conforme a la normativa vigente.
- Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0583-M-GD, de fecha 20 de julio de 2026, el Coordinador de Compras Públicas remitió a la Comisión Técnica la única oferta presentada a través del Portal Oficial de Contratación Pública, a fin de que se proceda con el acto de apertura de ofertas y las actuaciones previstas para la etapa de evaluación y calificación, conforme al cronograma del procedimiento.
- Mediante Acta No. 003 de Apertura de Ofertas, de fecha 20 de julio de 2026, la Comisión Técnica efectuó el acto público de apertura de las ofertas presentadas dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, dejando constancia de la recepción de una (01) oferta presentada a través del Portal Oficial de Contratación Pública, así como de la verificación de la habilitación del oferente y la inexistencia de vinculación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, disponiéndose la continuación de las actuaciones correspondientes a la etapa de verificación de integridad de la oferta y convalidación de errores.

5. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INTEGRIDAD Y REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OFERTA

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la

Comisión Técnica procedió a efectuar la verificación de la integridad de la oferta presentada, revisando la presencia de la documentación requerida en el pliego y determinando la existencia o inexistencia de errores de forma susceptibles de convalidación.

De manera simultánea, y conforme a la metodología establecida en el pliego, se verificó la presentación de la documentación correspondiente a los requisitos mínimos de la oferta, comprendiendo los parámetros de equipo mínimo, personal técnico mínimo, experiencia general mínima, experiencia específica mínima, experiencia mínima del personal técnico, porcentaje de participación ecuatoriana mínimo, metodología de ejecución de las obras, cronograma de ejecución de la obra y patrimonio para personas jurídicas.

La presente verificación tiene como único propósito constatar la integridad documental y la existencia de los elementos requeridos para cada parámetro de evaluación, sin que ello constituya la evaluación o calificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, la cual será realizada en la etapa de evaluación y calificación de ofertas, de conformidad con la normativa vigente y el pliego del procedimiento. En consecuencia, la Comisión Técnica procederá a identificar, de ser el caso, los errores de forma susceptibles de convalidación, dejando constancia de las observaciones correspondientes en las matrices que forman parte integrante de la presente acta.

PARÁMETRO	**OFERENTE 1: CONSORCIO REPOELC RUC 2290351068001 Procurador común: Cedeño Mora Jerson Javier**		
	PRESENTA	**NO PRESENTA**	**OBSERVACIONES**
Integridad de la oferta	X		Presenta el Formulario Único de la Oferta, formularios, anexos, declaraciones y demás documentación requerida en los pliegos, sin evidenciarse errores de forma susceptibles de convalidación.
Equipo mínimo	X		Presenta el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme a lo establecido en los pliegos para este parámetro.
Personal técnico mínimo	X		Presenta el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme a lo establecido en

			los pliegos para este parámetro.
Experiencia general mínima	X		Presenta experiencia general y la documentación de respaldo requerida para su evaluación.
Experiencia específica mínima	X		Presenta experiencia específica y la documentación de respaldo requerida para su evaluación.
Experiencia mínima personal técnico	X		Presenta el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme a lo establecido en los pliegos para este parámetro.
Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo (Desagregación Tecnológica)	X		Presenta el Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo (Desagregación Tecnológica) y la documentación correspondiente para su evaluación.
Metodología de ejecución de la obra	X		Presenta el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme a lo establecido en los pliegos para este parámetro.
Cronograma de ejecución de la obra	X		Presenta el cronograma de ejecución de la obra conforme a lo requerido en los pliegos.
Patrimonio (Personas Jurídicas)	X		Presenta índices financieros y la documentación financiera requerida para su evaluación.

6. CONVALIDACIÓN DE ERRORES

6.1. DETERMINACIÓN DE ERRORES SUSCEPTIBLES DE CONVALIDACIÓN

Como resultado de la verificación de integridad de la oferta presentada y de la revisión de la documentación consignada por el oferente, efectuada conforme a lo establecido en los artículos 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como a los requisitos previstos en el

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

pliego del procedimiento, la Comisión Técnica procedió a identificar la existencia o inexistencia de errores de forma susceptibles de convalidación, conforme se detalla a continuación:

No.	OFERENTE	RUC	CONVALIDA	NO CONVALIDA
1	CONSORCIO REPOELC	2290351068001		X

De la revisión efectuada, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada no contiene errores de forma susceptibles de convalidación, por lo que no corresponde solicitar aclaraciones o documentación adicional al oferente, continuándose con la etapa de evaluación y calificación de la oferta, conforme al cronograma del procedimiento.

7. CLAUSURA

Siendo el jueves veintitrés (23) de julio de 2026, se da por concluido el acto de Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, habiéndose efectuado la revisión de la integridad de la oferta presentada, así como la verificación de la documentación correspondiente a los requisitos mínimos establecidos en el pliego, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y los documentos precontractuales del procedimiento. Como resultado de la revisión realizada, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada no contiene errores de forma susceptibles de convalidación, por lo que no corresponde efectuar requerimiento alguno al oferente, disponiéndose la continuación del procedimiento con la etapa de evaluación y calificación de la oferta. En consecuencia, se suscribe la presente acta para los fines legales correspondientes y se dispone su inmediata publicación en el Portal Oficial de Contratación Pública.

Para constancia y fe de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica y la Secretaria suscriben la presente acta.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Públicas
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura
DELEGADA DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
RODRIGO JAVIER NOGUERA MENDOZA

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
DALIA SILVANA SANMARTIN TORRES

Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - Ingeniero Civil
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN POR PUNTAJE

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRAS No. LICO-GADML-2026-03

Objeto: "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS"

1. COMPARECIENTES

En la ciudad de Loreto, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veintiséis, en la oficina de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, ubicada en el primer piso alto del módulo dos del edificio institucional, situado entre la avenida Rafael Andrade y la avenida Gregorio Urapari, comparecen los integrantes de la Comisión Técnica designada mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, expedida por la máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, para sustanciar la fase precontractual del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, integrada por:

- Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, SP6 – Analista de Obras Públicas, Presidenta de la Comisión Técnica;
- Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, Delegada del Titular del Área Requirente;
- Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza, Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes, Profesional afín al objeto de la contratación.

Actúa como Secretaria de la Comisión Técnica, en funciones de apoyo administrativo, elaboración de las actas y certificación de las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento, sin voz ni voto, la:

- Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres, SP6 – Ingeniera Civil de la Dirección de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento.

Instalada la Comisión Técnica, la Presidenta declara abierta la sesión para efectuar la evaluación y calificación de la oferta presentada dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, aplicando la metodología de evaluación prevista en los pliegos del procedimiento, con la finalidad de determinar el puntaje obtenido por el oferente habilitado y establecer la oferta que represente el mejor cumplimiento de los parámetros técnicos y económicos establecidos por la entidad contratante.

2. BASE LEGAL

La presente actuación se fundamenta en los artículos 226, 227 y 288 de la Constitución de la República del Ecuador, que disponen que las instituciones del Estado ejercerán únicamente las competencias y facultades que les sean atribuidas por la Constitución y la ley; que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; y que las compras públicas deberán cumplir con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social, priorizando la producción nacional.

Asimismo, la presente actuación se sustenta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, especialmente en sus artículos 3, relativo a los principios que rigen el Sistema Nacional de Contratación Pública; 8, referente a los objetivos prioritarios de la contratación pública; y 48, que regula el procedimiento de Licitación para la contratación de obras, bienes y servicios cuando corresponda su aplicación, así como en las demás disposiciones pertinentes de la citada Ley.

De igual manera, se observan las disposiciones del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, particularmente el artículo 2, que establece el principio de juridicidad como rector de toda actuación dentro de los procedimientos de contratación pública, disponiendo que su tramitación deberá sujetarse a la Constitución, la ley, los principios, la jurisprudencia aplicable y el propio Reglamento; así como las disposiciones que regulan la fase precontractual, la evaluación y calificación de ofertas, la emisión del informe de recomendación y la publicación de la información relevante en el Portal Oficial de Contratación Pública.

Constituyen además fundamento de la presente actuación el Código Orgánico Administrativo, en lo relacionado con el deber de motivación, el debido procedimiento y la validez de los actos administrativos; las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado; la Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, mediante la cual se aprobaron los pliegos y se designó la Comisión Técnica; los pliegos del procedimiento LICO-GADML-2026-03; el cronograma publicado en el Portal Oficial de Contratación Pública; y los demás documentos que integran el expediente administrativo.

En cumplimiento de la normativa antes citada y de los pliegos del procedimiento, corresponde a la Comisión Técnica efectuar la evaluación y calificación de la oferta que superó la etapa de verificación de integridad, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos y aplicando los parámetros de evaluación previstos en los documentos precontractuales, con base en la documentación presentada por el oferente y en la información generada por el Portal Oficial de Contratación Pública para aquellos parámetros cuya calificación sea automática, a fin de emitir una recomendación debidamente motivada a la máxima autoridad de la entidad contratante.

3. INFORMACIÓN DEL PROCESO

Entidad contratante:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO
Código del procedimiento:	LICO-GADML-2026-03
Procedimiento:	Licitación de Obras
Objeto contractual:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS, INCLUYE ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS
CPC:	532900011
Presupuesto referencial:	USD 121.455,88 (CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), sin incluir IVA.
Plazo de ejecución:	120 días, contado a partir a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato
Forma de pago:	Anticipo: 35% Saldo: 65.00%

4. ANTECEDENTES

- Mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, el señor Kleber Fabián Olalla Torres, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, resolvió aprobar los pliegos y el cronograma, autorizar el inicio del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03 para la contratación de la obra denominada "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS INCLUYE, ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS", con un presupuesto referencial de USD 121.455,88, sin incluir IVA.
- Mediante el artículo 5 de la referida Resolución Administrativa, la máxima autoridad conformó la Comisión Técnica responsable de sustanciar la fase precontractual del procedimiento, integrada por la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, en calidad de Presidenta; la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, como Delegada del Titular del Área Requirente; y el Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza, como Profesional afín al objeto de la contratación. Asimismo, mediante Acta de Designación de Secretaria de fecha 13 de julio de 2026, se designó a la Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres como Secretaria de la Comisión Técnica.
- Mediante Acta No. 002 de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, de fecha 13 de julio de 2026, la Comisión Técnica conoció y resolvió las actuaciones correspondientes a dicha etapa del procedimiento, conforme al cronograma y a la normativa aplicable.
- Mediante Acta No. 003 – Apertura de Ofertas, de fecha 20 de julio de 2026, la Comisión Técnica efectuó la apertura de la única oferta presentada dentro del plazo previsto en el cronograma del procedimiento, verificando además la habilitación del oferente en el Registro Único de Proveedores, la inexistencia de vinculación de la oferta y la validación de las firmas electrónicas de la documentación presentada.

- Mediante Acta No. 004 - Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, de fecha 21 de julio de 2026, la Comisión Técnica verificó la integridad de la oferta presentada y determinó que no existían errores de forma susceptibles de convalidación, disponiendo la continuación del procedimiento hacia la etapa de evaluación y calificación de la oferta.
- Mediante Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0829-M-GD, de 28 de julio de 2026, la Presidenta de la Comisión Técnica remitió a la Máxima Autoridad las Actas Nos. 003 y 004 y solicitó disponer a la Coordinación de Compras Públicas la remisión de los puntajes generados por el Portal Oficial de Contratación Pública correspondientes a los parámetros Valor Agregado Ecuatoriano (VAE) y Subcontratación, necesarios para completar la evaluación por puntaje prevista en los pliegos.
- En atención a dicha solicitud, mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0624-M-GD, de 29 de julio de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió a la Comisión Técnica el reporte obtenido del módulo "Calificación Ofertas - Licitación" del Portal Oficial de Contratación Pública, indicando expresamente que su actuación se limitó a obtener y remitir la información generada por el sistema, correspondiendo exclusivamente a la Comisión Técnica la evaluación y consolidación de los puntajes de la oferta.

Con los antecedentes expuestos y una vez incorporada al expediente la información remitida por la Coordinación de Compras Públicas, corresponde a la Comisión Técnica efectuar la evaluación de cumplimiento de requisitos mínimos (Cumple/No Cumple) y, de superarse dicha etapa, proceder con la evaluación y calificación por puntaje de conformidad con los parámetros establecidos en los pliegos del procedimiento.

5. DESARROLLO DEL PROCESO

En cumplimiento de las atribuciones conferidas mediante la Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, la Comisión Técnica procedió a efectuar la evaluación de la oferta presentada dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, observando la metodología prevista en la Sección IV – Verificación y Evaluación de las Ofertas de los pliegos del procedimiento.

La evaluación se desarrolló una vez concluida la etapa de verificación de integridad de la oferta y al no haberse identificado errores de forma susceptibles de convalidación, conforme consta en el Acta No. 004, procediendo la Comisión Técnica a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos y, de corresponder, a efectuar la evaluación por puntaje de los parámetros cuantificables establecidos para el presente procedimiento.

Para el efecto, la Comisión Técnica realizó el análisis integral de la documentación presentada por el oferente CONSORCIO REPOELC, verificando la información contenida en el Formulario Único de la Oferta y en los documentos de respaldo que forman parte de la propuesta técnica y económica, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de los parámetros de evaluación previstos en los pliegos.

La evaluación se efectuó bajo los principios de legalidad, igualdad, transparencia, objetividad y motivación, sustentándose exclusivamente en la documentación presentada por el oferente, en los documentos que integran el expediente administrativo y en la información generada por el Portal Oficial de Contratación Pública para los parámetros cuya calificación corresponde al sistema.

5.1. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS Y CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Con fecha 21 de julio de 2026, mediante Acta No. 004 – Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, la Comisión Técnica verificó la integridad de la única oferta presentada dentro del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, determinando que la documentación cumplía con los requisitos de integridad establecidos en los pliegos y que no existían errores de forma susceptibles de convalidación; en consecuencia, se dispuso la continuación del procedimiento hacia la etapa de evaluación de cumplimiento de requisitos mínimos y calificación por puntaje.

5.1.1. VERIFICACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE LAS OFERTAS

En uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a lo establecido en la Sección IV VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, numeral 4.1. Verificación de la oferta, 4.1.1. Integridad de las ofertas, se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego de acuerdo con el siguiente detalle:

I Formulario Único de la Oferta

1.1 Presentación y compromiso.

1.2 Datos generales del oferente.

1.3 Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de beneficiario final.

1.4 Situación financiera.

1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios.

1.6 Análisis de precios unitarios.

1.7 Metodología de construcción

1.8 Cronograma valorado de trabajos.

1.9 Experiencia del oferente.

1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto.

1.11 Equipo asignado al proyecto.

1.12 Participación ecuatoriana para el proyecto, propuesta por el oferente.

II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual

2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; y, metodología.

III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)

IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)

A continuación, se detalla el Cuadro de Verificación del cumplimiento de la Integridad de la única (01) oferta presentada en el Portal de Compras Públicas:

PARÁMETRO DE INTEGRIDAD	OFERENTE 1: CONSORCIO REPOELC RUC 2290351068001 Procurador común: Cedeño Mora Jerson Javier		
	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
I Formulario Único de la Oferta	X		Ninguna
1.1 Presentación y compromiso	X		Ninguna
1.2 Datos generales del oferente	X		Ninguna
1.3 Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de beneficiario final	X		Ninguna
1.4 Situación financiera	X		Ninguna
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	X		Ninguna
1.6 Análisis de precios unitarios	X		Ninguna
1.7 Metodología de construcción	X		Ninguna
1.8 Cronograma valorado de trabajos	X		Ninguna
1.9 Experiencia del oferente	X		Ninguna
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto	X		Ninguna
1.11 Equipo asignado al proyecto	X		Ninguna
1.12 Participación ecuatoriana para el proyecto, propuesta por el oferente	X		Ninguna
II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	X		Ninguna
2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; y, metodología	X		Ninguna
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)	X		Ninguna
IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)	X		Ninguna

CONCLUSIÓN:

La oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con RUC No. 2290351068001, **CUMPLE** con los requisitos de integridad establecidos en los pliegos del procedimiento. Conforme consta en el Acta No. 004 - Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, la Comisión Técnica determinó que la oferta no presentó errores de forma susceptibles de convalidación; en consecuencia, no fue necesario conceder el término para convalidación, disponiéndose la continuación del procedimiento hacia la etapa de evaluación de los requisitos mínimos y calificación por puntaje.

5.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN POR PUNTAJE

De conformidad con los resultados obtenidos en la etapa de verificación de integridad de la oferta y del cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos del procedimiento, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con RUC No. 2290351068001, cumple con las condiciones de habilitación previstas en la normativa vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública para continuar con la etapa de evaluación y calificación por puntaje.

Asimismo, conforme consta en el Acta No. 004 - Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, la Comisión Técnica determinó que la oferta no presentó errores de forma susceptibles de convalidación, por lo que no fue necesario otorgar el término previsto para la convalidación de errores, continuando directamente con la evaluación de los parámetros de calificación establecidos en los pliegos del procedimiento.

PARÁMETRO DE INTEGRIDAD	**OFERENTE 1: CONSORCIO REPOELC RUC 2290351068001 Procurador común: Cedeño Mora Jerson Javier**		
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIÓN**
I Formulario Único de la Oferta	X		Presenta el Formulario Único de la Oferta debidamente suscrito y elaborado conforme al modelo obligatorio establecido en los pliegos del procedimiento.
1.1 Presentación y compromiso	X		Presenta el formulario de presentación y compromiso debidamente suscrito por el Procurador Común del CONSORCIO REPOELC.
1.2 Datos generales del oferente	X		Contiene la información general del oferente conforme a lo requerido en el formulario oficial.

1.3 Nómina de accionistas, partícipes o socios mayoritarios de personas jurídicas y declaración de beneficiario final	X		Presenta las declaraciones de beneficiario final y la nómina de accionistas de los integrantes del consorcio a quienes les resulta aplicable, conforme al formulario establecido en el pliego.
1.4 Situación financiera	X		Presenta la información financiera requerida, incluyendo declaraciones del Impuesto a la Renta e índices financieros de los integrantes del consorcio, conforme a los pliegos.
1.5 Tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios	X		Presenta el presupuesto ofertado conforme al formato establecido en los pliegos.
1.6 Análisis de precios unitarios	X		Presenta el análisis de precios unitarios correspondiente a la totalidad de los rubros ofertados.
1.7 Metodología de construcción	X		Se considera cumplido con la presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme al artículo 108 del RGLOSNCP y al numeral 4.1.9 del pliego.

1.8 Cronograma valorado de trabajos	X		Presenta el cronograma valorado de ejecución conforme al plazo establecido en los pliegos.
1.9 Experiencia del oferente	X		Presenta contratos, actas de recepción, certificados y demás documentos de respaldo para acreditar la experiencia del oferente, los cuales serán objeto de evaluación técnica y calificación conforme a los pliegos.
1.10 Personal técnico propuesto para el proyecto	X		Se considera cumplido con la presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme al artículo 108 del RGLOSNCP y al numeral 4.1.9 del pliego.
1.11 Equipo asignado al proyecto	X		Se considera cumplido con la presentación del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, conforme al artículo 108 del RGLOSNCP y al numeral 4.1.9 del pliego.
1.12 Participación ecuatoriana para el proyecto, propuesta por el oferente	X		Presenta el formulario PPEM conforme al pliego.

II Formulario de compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual	X		Presenta el formulario debidamente suscrito.
2.1 Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual: equipo mínimo requerido; personal técnico mínimo requerido y experiencia mínima del personal técnico; y, metodología	X		El oferente suscribe el compromiso respecto del equipo mínimo, personal técnico mínimo, experiencia mínima del personal técnico y metodología de ejecución, conforme al modelo obligatorio del pliego.
III Formulario de compromiso de asociación o consorcio (de ser procedente)	X		Presenta el compromiso de asociación o consorcio debidamente suscrito, designando Procurador Común y estableciendo la participación de sus integrantes.
IV Formulario de compromiso de subcontratación (de ser procedente)	X		Presenta el formulario de compromiso de subcontratación debidamente suscrito, conforme a las condiciones previstas en los pliegos.

5.2. ANALISIS DE EXPERIENCIAS

De conformidad con los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, la Comisión Técnica procedió a verificar y analizar la documentación presentada por el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con el objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia general y experiencia específica del oferente.

Para el efecto, se revisó la documentación de respaldo presentada, incluyendo contratos, actas de entrega recepción, planillas, subcontratos, facturas, certificados y demás medios de verificación incorporados en la oferta, con el propósito de establecer la experiencia efectivamente acreditada y el monto susceptible de ser considerado para la presente evaluación, observando los criterios

previstos en los pliegos del procedimiento, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y los principios de legalidad, objetividad, igualdad y motivación que rigen la contratación pública.

A continuación, la Comisión Técnica expone el análisis individual de cada experiencia presentada y la determinación de los valores que serán considerados para la calificación del presente procedimiento.

5.2.1. EXPERIENCIA GENERAL

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.4 "Experiencia general y específica mínima" de los pliegos del procedimiento de Licitación de Obras No. LICO-GADML-2026-03, la Comisión Técnica procedió a verificar y analizar la experiencia general acreditada por el oferente CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con el objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la presente contratación pública.

Para el efecto, la Comisión Técnica realizó una revisión integral de la documentación presentada dentro de la oferta, verificando que cada experiencia se encuentre respaldada mediante los documentos exigidos en los pliegos, tales como contratos, actas de entrega recepción definitiva, certificados, escrituras de constitución de consorcios, facturas por prestación de servicios profesionales y demás medios de verificación incorporados al expediente administrativo, con el propósito de establecer la experiencia efectivamente acreditada y el monto susceptible de ser considerado para la presente evaluación.

Del análisis efectuado se verificó que el numeral 4.1.4 de los pliegos establece que la experiencia general deberá corresponder al Código Central de Productos (CPC) a nivel 4 y su descripción, relacionado con el objeto contractual, y acreditarse mediante los documentos de respaldo previstos por la Entidad Contratante. En este sentido, la Comisión Técnica constató que el procedimiento LICO-GADML-2026-03 se encuentra publicado bajo el Código Central de Productos (CPC) 532900011 – OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, procediendo a verificar que las experiencias generales presentadas por el oferente correspondan al mismo código y descripción exigidos en los pliegos. Como resultado de dicha revisión se determinó que las dos experiencias invocadas corresponden igualmente al CPC 532900011 – OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, cumpliéndose este requisito de conformidad con el numeral 4.1.4 de los documentos precontractuales.

De igual manera, la Comisión Técnica verificó la modalidad mediante la cual fue adquirida cada experiencia, diferenciando aquella obtenida como integrante de un consorcio de la adquirida bajo relación de dependencia, observando para cada caso las disposiciones previstas en los pliegos del procedimiento y en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto de la acreditación y valoración de la experiencia del oferente.

Asimismo, en observancia de los principios de legalidad, igualdad, transparencia, objetividad y seguridad jurídica previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como del deber de motivación establecido en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, la Comisión Técnica fundamenta su decisión exclusivamente sobre los hechos plenamente acreditados mediante la documentación constante en la oferta, absteniéndose de efectuar presunciones respecto de períodos de participación, montos ejecutados o cualquier otra circunstancia que no se encuentre demostrada documentalmente dentro del expediente administrativo.

- **CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERESAS Y FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.**

La primera experiencia presentada corresponde al contrato denominado "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERESAS Y FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA", cuya ejecución fue realizada por el CONSORCIO MG CONSTRUCCIONES, conforme se acredita mediante el contrato, la escritura pública de constitución del consorcio y el Acta de Entrega Recepción Definitiva presentada por el oferente.

De la revisión efectuada por la Comisión Técnica se verificó que la compañía VITORZU S.A., integrante del CONSORCIO REPOELC, formó parte del CONSORCIO MG CONSTRUCCIONES, circunstancia que se encuentra debidamente acreditada mediante la escritura pública de constitución del referido consorcio, documento en el cual consta su calidad de integrante y su participación dentro de la ejecución contractual.

Asimismo, se verificó que el contrato corresponde al Código Central de Productos (CPC) 532900011 – OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, coincidente con el CPC requerido en el numeral 4.1.4 de los pliegos del presente procedimiento, satisfaciendo de esta manera el requisito relativo a la naturaleza de la experiencia exigida por la Entidad Contratante.

De igual forma, la Comisión Técnica constató que la ejecución del contrato se encuentra respaldada mediante el Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrita por las partes intervinientes, documento del cual se desprende la recepción definitiva de la obra y la correcta ejecución del objeto contractual.

En consecuencia, al encontrarse plenamente acreditada la participación de la compañía VITORZU S.A. como integrante del contratista que ejecutó la obra, verificándose además la correspondencia del Código Central de Productos (CPC), el objeto contractual y los documentos habilitantes exigidos en el numeral 4.1.4 de los pliegos, la Comisión Técnica determina que esta experiencia cumple con los requisitos establecidos para su valoración dentro del presente procedimiento. Para la determinación del monto de la experiencia, esta Comisión efectuó la verificación de la liquidación económica constante en el Acta de Entrega Recepción Definitiva, constatando que la obra registra un monto ejecutado de USD 318.768,56, correspondiente a las planillas de avance de obra Nos. 1, 2, 3 y 4, así como un monto de USD 15.919,34 correspondiente a la planilla por incremento de cantidades de obra. En consecuencia, el monto total efectivamente ejecutado y recibido asciende a **USD 334.687,90**, valor que se encuentra debidamente respaldado en la liquidación económica del contrato y que constituye el monto que la Comisión Técnica reconoce como experiencia general acreditada para efectos de la presente evaluación.

- **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO GADPO CUBIERTA METALICA, GRADERÍOS Y ESCENARIOS, SECTOR BELLAVISTA BARRIO NUEVO COCA, PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA**

La segunda experiencia presentada corresponde al contrato denominado "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO GADPO CUBIERTA METÁLICA, GRADERÍOS Y ESCENARIOS, SECTOR BELLAVISTA BARRIO NUEVO COCA, PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA", ejecutado por la compañía SERVIKARCONSTRUCTORA S.A., cuyo objeto también corresponde al Código Central de Productos (CPC) 532900011 – OTRAS OBRAS DE

INGENIERÍA CIVIL, cumpliendo igualmente el requisito previsto en el numeral 4.1.4 de los pliegos.

La Comisión Técnica verificó que el consorciado JOSÉ PABLO SANTANA ZAMBRANO acreditó haber participado en la ejecución de dicha obra como profesional bajo relación de dependencia del contratista, como RESIDENTE DE OBRA, presentando como medios de verificación el Acta de Entrega Recepción Definitiva del contrato y las facturas por prestación de servicios profesionales correspondientes a los períodos comprendidos entre el 06 al 31 de mayo de 2019, 01 al 30 de junio de 2019, 29 de octubre al 30 de noviembre de 2019 y 01 al 26 de diciembre de 2019.

No obstante, durante la revisión integral del expediente administrativo la Comisión Técnica constató que el oferente no presentó documentación que permita acreditar su participación durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2019, correspondiente a la Planilla N.° 3 de Avance de Obra, cuyo valor ejecutado asciende a USD 68.436,26. En consecuencia, y en aplicación del deber de motivación previsto en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, así como de los principios de objetividad, legalidad y estricta sujeción a la prueba documental, esta Comisión únicamente puede reconocer como experiencia aquella que se encuentra plenamente demostrada mediante los documentos incorporados a la oferta, sin que resulte jurídicamente procedente presumir la participación del profesional durante un período respecto del cual no existe respaldo documental.

Por tal razón, únicamente se considera acreditada la participación del profesional respecto de las planillas correspondientes a los meses de mayo, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2019, cuyo monto total asciende a USD 105.170,14, conforme se desprende del Acta de Entrega Recepción Definitiva y de las facturas presentadas como medios de verificación. Al tratarse de experiencia adquirida bajo relación de dependencia, en la que el señor José Pablo Santana Zambrano desempeñó las funciones de Residente de Obra, corresponde aplicar el criterio de valoración previsto en el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en el numeral 4.1.4 de los pliegos, conforme al cual únicamente es reconocible el cuarenta por ciento (40 %) del monto de la experiencia debidamente acreditada. En tal virtud, la Comisión Técnica reconoce para efectos de la presente evaluación un valor de **USD 42.068,06**, monto que será considerado dentro de la experiencia general acreditada por el oferente.

En virtud del análisis precedente, la Comisión Técnica determina que el CONSORCIO REPOELC acredita una experiencia general total de USD 376.755,96, valor obtenido de la sumatoria de la experiencia acreditada por el consorciado VITORZU S.A., por USD 334.687,90, y la experiencia reconocida al consorciado José Pablo Santana Zambrano por USD 42.068,06, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ambas experiencias cumplen con los requisitos previstos en el numeral 4.1.4 de los pliegos y con la normativa que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública, por lo que dicho monto será considerado para la evaluación y calificación del presente procedimiento.

5.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA

En cumplimiento de lo establecido en el numeral 4.1.4 "Experiencia general y específica mínima" de los pliegos del procedimiento de Licitación de Obras No. LICO-GADML-2026-03, la Comisión Técnica procedió a verificar y analizar la experiencia específica acreditada por el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con el objeto de determinar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el presente procedimiento de contratación pública.

Para el efecto, la Comisión Técnica realizó una revisión integral de la documentación presentada dentro de la oferta, verificando el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos respecto de la experiencia específica, esto es: la correspondencia del objeto contractual con el objeto de contratación, la documentación habilitante para acreditar la experiencia y el monto efectivamente ejecutado susceptible de ser reconocido para efectos de la presente evaluación, observando en todo momento los principios de legalidad, igualdad, objetividad, transparencia y motivación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo.

De la revisión efectuada se verificó que el consorciado RENÁN JAVIER TOALA SÁNCHEZ acreditó su participación en la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA "CEGAP" EN EL BARRIO UNIÓN IMBABUREÑA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA", mediante el Subcontrato No. 004-RG-2021, suscrito con el CONSORCIO RG, cuyo objeto consiste en la "Ejecución de obras eléctricas para sistemas de generación de energía, incluyendo instalación de grupos electrógenos, tableros ATS, redes eléctricas soterradas en bajo y medio voltaje y obras complementarias", por un monto contractual de USD 228.163,90, sin incluir IVA. El referido subcontrato se deriva del contrato principal suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana para la construcción del Centro para Grupos de Atención Prioritaria "CEGAP", circunstancia que se encuentra plenamente acreditada mediante la documentación incorporada en la oferta.

La Comisión Técnica verificó que el objeto del subcontrato corresponde a la ejecución de obras especializadas en infraestructura eléctrica para sistemas de generación de energía, comprendiendo la instalación de grupos electrógenos, tableros ATS, redes eléctricas soterradas en bajo y medio voltaje y obras complementarias. En consecuencia, se determinó que dicha experiencia guarda relación directa con el objeto del presente procedimiento, el cual comprende el fortalecimiento de la infraestructura energética del Centro de Abastos y Municipio del cantón Loreto mediante el suministro de dos grupos electrógenos, incluyendo la adecuación y ejecución de obras civiles y eléctricas. Por tanto, la Comisión Técnica concluye que la experiencia presentada cumple con la condición de similitud prevista en el numeral 4.1.4 de los pliegos, al tratarse de trabajos ejecutados dentro de la misma especialidad técnica requerida por la Entidad Contratante.

Una vez verificado el cumplimiento del requisito de similitud exigido en los pliegos, la Comisión Técnica procedió a determinar el monto efectivamente acreditado como experiencia específica. Para ello, revisó la documentación de respaldo presentada por el oferente, constatando que el ingeniero RENÁN JAVIER TOALA SÁNCHEZ aportó como medios de verificación el Subcontrato No. 004-RG-2021, el Acta de Recepción Definitiva del contrato principal y seis (6) facturas emitidas al CONSORCIO RG, documentos que evidencian la ejecución parcial de las actividades objeto del subcontrato.

Del análisis de las facturas incorporadas al expediente administrativo, la Comisión Técnica verificó que se justifican USD 124.029,09. En consecuencia, si bien el Subcontrato No. 004-RG-2021 establece un monto contractual de USD 228.163,90, la Comisión Técnica determina que únicamente puede reconocer como experiencia específica el valor de USD 124.029,09, correspondiente al monto efectivamente respaldado mediante la documentación presentada por el oferente.

En virtud del análisis precedente, **la Comisión Técnica determina que el CONSORCIO REPOELC acredita una experiencia específica de USD 124.029,09, monto que cumple y supera el requisito mínimo establecido en el numeral 4.1.4 de los pliegos del procedimiento**,

razón por la cual dicho valor será considerado para la evaluación y asignación del puntaje correspondiente dentro del presente procedimiento de contratación pública.

Del análisis precedente se evidencia la correspondencia entre la documentación presentada por el oferente, el cargo efectivamente desempeñado, el período de participación acreditado, el valor de la experiencia documentada y el porcentaje de reconocimiento previsto en el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, determinándose que la experiencia reconocida corresponde únicamente a aquella que pudo ser objetivamente acreditada mediante los documentos constantes en el expediente administrativo. En consecuencia, la valoración efectuada se fundamenta en hechos plenamente demostrados, observando los principios de legalidad, objetividad, seguridad jurídica y motivación previstos en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo.

RESUMEN DE EXPERIENCIAS				
TIPO DE EXPERIENCIA	**DETALLE DEL OBJETO DEL CONTRATO**	**MONTO EJECUTADO**	**ACTUÓ EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA**	**OBSERVACIONES**
EXPERIENCIA GENERAL	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERESAS Y FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.	$334,687.90	NO	La Comisión Técnica verificó que la experiencia presentada fue ejecutada por el Consorcio MG Construcciones, del cual formó parte la compañía VITORZU S.A., integrante del CONSORCIO REPOELC. Considerando que la experiencia se acredita mediante el contrato y el Acta de Entrega Recepción Definitiva suscrita por el contratista, y de conformidad con lo previsto en los pliegos respecto de la acreditación de la experiencia de los integrantes de asociaciones o consorcios, la Comisión Técnica determina que dicha experiencia es válida para el presente procedimiento, reconociéndose el cien por ciento (100 %) de la experiencia general acreditada por el contratista que ejecutó la obra.
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO GADPO CUBIERTA METALICA, GRADERÍOS Y ESCENARIOS, SECTOR BELLAVISTA BARRIO NUEVO COCA, PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA	$42,068.06	SI	La Comisión Técnica verificó que el consorciado SANTANA ZAMBRANO JOSÉ PABLO acreditó su participación en la ejecución del proyecto presentado, desempeñándose como Residente de Obra bajo relación de dependencia del contratista COMPAÑÍA SERVIKARCONSTRUCTORA S.A. Para justificar dicha participación presentó las facturas por prestación de servicios profesionales correspondientes a los períodos efectivamente acreditados, las cuales, en conjunto con el Acta de Entrega Recepción Definitiva, permiten establecer una experiencia demostrada por un monto de USD 105.170,14. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del numeral

				4.1.4 de los pliegos, al tratarse de experiencia adquirida bajo relación de dependencia, la Comisión Técnica reconoce para efectos de la presente evaluación el cuarenta por ciento (40 %) del monto debidamente acreditado, equivalente a USD 42.068,06, valor que será considerado en la calificación del parámetro de experiencia general.
	TOTAL	**$376,755.96**		
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	EJECUCIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA, INCLUYENDO INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, TABLEROS ATS, REDES ELÉCTRICAS SOTERRADOS EN BAJO Y MEDIO VOLTAJE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	$124,029.09	NO	La Comisión Técnica verificó que el consorciado RENAN JAVIER TOALA SÁNCHEZ participó en la ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA “CEGAP” EN EL BARRIO UNIÓN IMBABUREÑA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA", en calidad de subcontratista del CONSORCIO RG, conforme consta en el Subcontrato No. 004-RG-2021, por un monto contractual de USD 228.163,90. No obstante, de la revisión de la documentación presentada se constató que el oferente acredita la ejecución de trabajos por un valor total de USD 124.029,09.
	TOTAL	**$124,029.09**		

TIPO DE EXPERIENCIA	EXPERIENCIA MINIMA	EXPERIENCIA ACREDITADA PARA PUNTUACION	EXPERIENCIA MAXIMA PUNTUACION	PUNTAJE PROPORCIONAL
EXPERIENCIA GENERAL	$12,145.59	$364,610.37	$151,819.85000	**10.00**
EXPERIENCIA ESPECÍFICA	$6,072.80	$117,956.29	$151,819.85000	**19.42**

CPC DE LA ENTIDAD



CPC EXPERIENCIA GENERAL OFERTADA (CUMPLE)

1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA DE LIDERESAS Y FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, BARRIO 20 DE MAYO, PARROQUIA EL COCA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA.


Descripción | Fechas | Resumen de Invitaciones | Productos | Parámetros de Calificación | Archivos

Detalle: Bienes / Obras /Servicios — COTO-GADPO-OP-07-20

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1	Unidad	USD 334,229.15	USD 334,229.15
TOTAL					USD 334,229.15

2. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TIPO GADPO CUBIERTA METALICA, GRADERÍOS Y ESCENARIOS, SECTOR BELLAVISTA BARRIO NUEVO COCA, PARROQUIA PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA


Descripción | Fechas | Productos | Parámetros de Calificación | Respuesta de Aceptación | Archivos

Detalle: Bienes / Obras /Servicios — MCO-GADPO-108-COP-20

Categoría	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1	Unidad	USD 176,444.50	USD 176,444.50
TOTAL					USD 176,444.50

PARÁMETRO	VALORACIÓN	OBSERVACIÓN
Experiencia general	10.00/10.00	Ver cuadro "RESUMEN EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS"
Experiencia especifica	19.42/25.00	
Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad	00.00/00.00	NO APLICA, de conformidad con los parámetros de evaluación establecidos en el pliego del procedimiento.
Oferta económica	50.00/50.00	La Comisión Técnica verificó que el oferente presentó una oferta económica por el valor de **USD 117.431,29730**, sin IVA, la cual fue evaluada conforme a la metodología de calificación económica establecida en el pliego del procedimiento, obteniendo la puntuación máxima de 50,00/50,00 puntos.
SUBTOTAL	**79.42/85.00**	
Subcontratación	5.00/5.00	Presentó compromiso de subcontratación con el proveedor **VEGA GUANOCHANGA WASHINGTON STALIN, domiciliado en el cantón Loreto, provincia de Orellana (localidad cantonal)**, por un porcentaje total de subcontratación del **29,67 %** del valor de la oferta, conforme al Formulario de Compromiso para Subcontratación. Se asigna la calificación de **5,00/5,00 puntos** conforme al resultado oficial emitido por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Participación ecuatoriana	10.00/10.00	Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0624-M-GD, la Coordinación de Compras Públicas remitió a esta Comisión Técnica el resultado oficial generado por el módulo de calificación del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública para el parámetro Participación Ecuatoriana. De la revisión de "Participación Ecuatoriana para el Proyecto, Propuesta por el Oferente", constante en la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, se verificó que el oferente ofertó un Porcentaje de Participación Ecuatoriana (PPE) de **66,00413 %**, porcentaje que supera el PPE mínimo de **65,67 %** establecido por la Entidad Contratante en los pliegos del procedimiento. En virtud de dicha verificación y del resultado oficial emitido por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual asigna al oferente la puntuación de **10,00/10,00 puntos**, la Comisión Técnica incorpora íntegramente dicha calificación en la presente evaluación, por corresponder al cálculo automático efectuado por la herramienta informática administrada por el SERCOP, sin efectuar modificación alguna.
TOTAL	**94.42/100.00**	

6. ANÁLISIS DEL MEJOR VALOR POR DINERO

En observancia de lo dispuesto en los artículos 1, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establecen como finalidad de la contratación pública la satisfacción de las necesidades institucionales procurando la mejor relación entre calidad y precio, así como la aplicación del principio de mejor valor por dinero, y de conformidad con los artículos 74 y 112 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la Comisión Técnica procedió a verificar si la oferta presentada representa las mejores condiciones para el Estado, considerando integralmente los parámetros técnicos, económicos y legales previstos en los pliegos del procedimiento.

Del análisis efectuado se verificó que el CONSORCIO REPOELC cumplió la totalidad de los requisitos habilitantes establecidos en los documentos precontractuales; acreditó la experiencia general y la experiencia específica requerida mediante documentación suficiente, pertinente y verificable; presentó debidamente suscrito el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, mediante el cual se compromete a disponer del personal técnico mínimo, del equipo mínimo requerido y de la metodología de construcción conforme a los pliegos, cuya verificación corresponde al Administrador del Contrato y al Fiscalizador al inicio de la ejecución contractual; y obtuvo la puntuación correspondiente en los parámetros de experiencia, oferta económica, participación ecuatoriana y subcontratación, conforme a la metodología de evaluación prevista en el numeral 4.1 de los pliegos y a los resultados oficiales generados por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En cuanto al componente económico, la Comisión Técnica verificó que el oferente presentó una oferta por el valor de USD 117.431,29730, sin incluir IVA, la cual fue evaluada conforme a la metodología establecida en los pliegos, obteniendo la puntuación máxima de 50,00 puntos. Sin

embargo, de conformidad con el artículo 112 del Reglamento General a la LOSNCP, la Comisión Técnica deja expresa constancia de que dicha valoración económica no constituye por sí sola el fundamento para determinar el mejor valor por dinero, por cuanto en los procedimientos de régimen común el precio más bajo no representa el único parámetro de selección, debiendo analizarse conjuntamente la calidad, capacidad técnica, experiencia, condiciones legales y demás factores previstos en los documentos precontractuales.

Asimismo, se verificó que el oferente obtuvo una calificación de 10,00/10,00 puntos en Participación Ecuatoriana, al haber ofertado un porcentaje de 66,00413 %, superior al porcentaje mínimo determinado por la entidad contratante (65,67 %), conforme al resultado oficial generado por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública; y alcanzó la puntuación máxima de 5,00/5,00 puntos en el parámetro de Subcontratación, al comprometer la subcontratación preferente conforme a las condiciones establecidas en los pliegos del procedimiento.

Como resultado de la evaluación integral, el CONSORCIO REPOELC obtuvo una calificación total de 94,42 puntos sobre 100, evidenciándose que su propuesta reúne las mejores condiciones técnicas, económicas y legales para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual y satisfacer la necesidad institucional que motivó el presente procedimiento de contratación.

En consecuencia, la Comisión Técnica concluye que la oferta presentada por el **CONSORCIO REPOELC** constituye la oferta que representa el **MEJOR VALOR POR DINERO** para la entidad contratante, al cumplir integralmente las condiciones previstas en los pliegos y alcanzar la mayor valoración conforme a la metodología de evaluación establecida, garantizando una adecuada relación entre calidad, capacidad técnica, desempeño esperado y costo para el Estado, en estricto cumplimiento de los artículos 1, 3 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los artículos 74 y 112 de su Reglamento General, y el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo respecto de la debida motivación del acto administrativo.

7. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Una vez concluida la verificación del cumplimiento de integridad de la oferta, de los requisitos mínimos y la evaluación y calificación conforme a los parámetros establecidos en los pliegos del procedimiento de Licitación de Obras No. **LICO-GADML-2026-03**, cuyo objeto es el **"FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS, INCLUYE ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS"**, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada por el **CONSORCIO REPOELC**, con **RUC No. 2290351068001**, representado por su **Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier**, cumple con los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, obteniendo una calificación total de **94,42 puntos sobre 100**.

Del análisis efectuado por la Comisión Técnica se verificó que el oferente acreditó el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en los documentos precontractuales; que la experiencia general y la experiencia específica fueron justificadas mediante documentación suficiente, pertinente y verificable, conforme a las condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos y la normativa aplicable; y que la oferta económica, así como los parámetros correspondientes a Subcontratación y Participación Ecuatoriana, fueron calificados de conformidad con la metodología prevista en los pliegos y los resultados oficiales emitidos por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En consecuencia, al constituir la única oferta presentada y habilitada dentro del presente procedimiento y haber superado satisfactoriamente la etapa de verificación de integridad, el cumplimiento de los requisitos mínimos y la evaluación por puntaje, obteniendo una calificación de **94,42 puntos sobre 100**, la Comisión Técnica, en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026 y con base en el análisis técnico y jurídico contenido en la presente Acta de Evaluación y Calificación, **recomienda a la Máxima Autoridad adjudicar el procedimiento de Licitación de Obras No. LICO-GADML-2026-03 al CONSORCIO REPOELC, con RUC No. 2290351068001, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, por el valor ofertado de USD 117.431,29730, sin incluir IVA, y por el plazo de ejecución de ciento veinte (120) días, contado a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato**, por haber demostrado el cumplimiento de las condiciones técnicas, legales, económicas y demás requisitos exigidos por la Entidad Contratante.

No existiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, dejando constancia de las actuaciones realizadas por la Comisión Técnica dentro de la fase precontractual para los fines legales correspondientes.

Nota: Se deja constancia de que la presente Acta corresponde exclusivamente a la etapa de evaluación y calificación de ofertas del procedimiento, habiéndose verificado la concordancia entre la información constante en el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, los documentos que integran el expediente administrativo, la metodología de evaluación prevista en los pliegos y la normativa aplicable. La presente actuación administrativa se encuentra debidamente motivada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo, al identificar la normativa jurídica aplicable, establecer los hechos relevantes acreditados mediante la documentación constante en el expediente administrativo y exponer la relación lógica entre dichos hechos y la decisión adoptada, observando además los principios de legalidad, transparencia, igualdad, objetividad, seguridad jurídica, debido procedimiento y motivación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás normativa aplicable.

Para constancia y fe de lo actuado, los miembros de la Comisión Técnica suscriben la presente Acta en señal de aprobación de su contenido. La Secretaria de la Comisión Técnica la suscribe en ejercicio de las funciones de apoyo administrativo y de fe de las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento, sin voz ni voto en las decisiones adoptadas por la Comisión.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Públicas
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura
DELEGADA DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
RODRIGO JAVIER NOGUERA MENDOZA

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
DALIA SILVANA SANMARTIN TORRES

Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - Ingeniero Civil
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO:	LICO-GADML-2026-03
OBJETO:	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS, INCLUYE ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	USD 121.455,88, sin incluir IVA
PLAZO:	120 días, contado a partir a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato
MIEMBROS DE LA COMISIÓN TÉCNICA:	Ing. Carol Valeria Carrera Vélez SP6 - Analista de Obras Públicas PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura DELEGADA DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN Sin voz ni voto: Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres SP6 - Ingeniero Civil SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA
NÚMERO DE OFERTAS RECIBIDAS:	Una (01) oferta presentada a través del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública.

2. ANTECEDENTES

Mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, el señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto aprobó los pliegos, el cronograma y autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL

SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS, INCLUYE ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS", conformando además la Comisión Técnica responsable de sustanciar la fase precontractual del procedimiento.

En cumplimiento de la referida Resolución Administrativa, mediante Acta de Designación de Secretaria de fecha 13 de julio de 2026, la Comisión Técnica designó a la Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres como Secretaria de la Comisión Técnica, para actuar dentro del presente procedimiento precontractual.

Con fecha 13 de julio de 2026, la Comisión Técnica suscribió el Acta No. 002 de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones, mediante la cual atendió las consultas formuladas por los interesados dentro del procedimiento, incorporándose las respuestas y aclaraciones como parte integrante de los pliegos.

Posteriormente, mediante Acta No. 003 - Apertura de Ofertas, de fecha 20 de julio de 2026, la Comisión Técnica efectuó la apertura de la única oferta presentada dentro del plazo establecido en el cronograma del procedimiento, verificando la habilitación del oferente en el Registro Único de Proveedores, la inexistencia de vinculación de la oferta y la validez de las firmas electrónicas de la documentación presentada.

No.	OFERENTE	RUC	PLAZO	OFERTA ECONÓMICA	ARCHIVO MFC-USHAY
01	CONSORCIO REPOELC	2290351068001	120 días	$ 117.431,29730	3 archivos formato EXCEL, 76 archivos PDF, con 475 hojas Peso total: 39.8 MB

Mediante Acta No. 004 - Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores, de fecha 21 de julio de 2026, la Comisión Técnica verificó el cumplimiento de los requisitos de integridad previstos en los pliegos del procedimiento, determinando que la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, cumplía con los requisitos de integridad establecidos y que no presentaba errores de forma susceptibles de convalidación, razón por la cual se dispuso la continuación del procedimiento hacia la etapa de evaluación y calificación de la oferta.

Posteriormente, mediante Memorando Nro. GADMCL-CMV-2026-0829-M-GD, de fecha 28 de julio de 2026, la Presidenta de la Comisión Técnica remitió a la Máxima Autoridad las Actas Nos. 003 y 004, solicitando disponer a la Coordinación de Compras Públicas la remisión de los puntajes oficiales generados por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública para los parámetros Participación Ecuatoriana y Subcontratación, indispensables para concluir la evaluación prevista en los pliegos.

En atención a dicho requerimiento, mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0624-M-GD, de fecha 29 de julio de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió a la Comisión

Técnica el reporte oficial emitido por el módulo "Calificación Ofertas - Licitación" del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, indicando que su actuación se limitó a la obtención y remisión de la información generada automáticamente por el sistema, correspondiendo exclusivamente a la Comisión Técnica la consolidación y valoración de los resultados obtenidos dentro de la evaluación.

Finalmente, mediante Acta No. 005 de Evaluación y Calificación por Puntaje, de fecha 04 de agosto de 2026, la Comisión Técnica efectuó el análisis integral de la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos, analizando la experiencia general y específica acreditada, revisando los parámetros técnicos y económicos previstos en los pliegos e incorporando los resultados oficiales emitidos por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública para los parámetros de evaluación automática, obteniendo el oferente una calificación total de 94,42 puntos sobre 100, conforme a la metodología de evaluación establecida en los pliegos del procedimiento.

3. ANÁLISIS

En cumplimiento de las atribuciones conferidas mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, la Comisión Técnica sustanció la fase precontractual del procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, observando las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, el Código Orgánico Administrativo y los pliegos que rigen el presente procedimiento.

Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso se recibió una (01) oferta, correspondiente al CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con RUC No. 2290351068001. La oferta fue objeto de apertura y verificación de integridad, determinándose mediante Acta No. 004 de Verificación de Integridad de la Oferta y Convalidación de Errores que cumplía con los requisitos de integridad establecidos en los pliegos del procedimiento y que no presentaba errores de forma susceptibles de convalidación, por lo que correspondió continuar con la etapa de evaluación y calificación.

Posteriormente, la Comisión Técnica efectuó el análisis integral de la oferta presentada, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en los pliegos, la documentación habilitante y los parámetros de evaluación previstos para el procedimiento. Para el efecto, se realizó la revisión y valoración de la experiencia general y específica del oferente, así como del Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual, mediante el cual el oferente se comprometió a disponer del personal técnico mínimo, del equipo mínimo requerido y de la metodología de ejecución conforme a los pliegos del procedimiento, cuya verificación corresponderá al Administrador del Contrato y al Fiscalizador durante la etapa de ejecución contractual, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Respecto de la experiencia general, la Comisión Técnica verificó el cumplimiento de las condiciones establecidas en el numeral 4.1.4 de los pliegos, revisando el objeto contractual de las

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

experiencias presentadas, la correspondencia del Código Central de Productos (CPC) cuando resultó aplicable, la modalidad de participación de los integrantes del consorcio, la documentación habilitante aportada para acreditar la ejecución de las obras y la aplicación de las reglas de valoración para la experiencia adquirida bajo relación de dependencia, conforme al artículo 106 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Como resultado del análisis efectuado se determinó una experiencia general acreditada de USD 376.755,96, obteniendo el oferente la calificación máxima de 10,00/10,00 puntos.

En cuanto a la experiencia específica, la Comisión Técnica verificó el cumplimiento de las condiciones previstas en el numeral 4.1.4 de los pliegos, constatando que la experiencia presentada guarda relación con el objeto de contratación y que la documentación incorporada al expediente administrativo permitió verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su acreditación. En aplicación de los principios de legalidad, objetividad, motivación y estricta sujeción a la prueba documental, únicamente se reconoció el monto efectivamente respaldado mediante la documentación presentada por el oferente, correspondiente a USD 124.029,09, obteniendo una calificación de 19,42/25,00 puntos.

Respecto de la oferta económica, la Comisión Técnica verificó que el oferente presentó una propuesta por el valor de USD 117.431,29730, sin incluir IVA, la cual fue evaluada conforme a la metodología prevista en los pliegos del procedimiento, obteniendo la puntuación máxima de 50,00/50,00 puntos.

En relación con el parámetro de Subcontratación Preferente, la Comisión Técnica verificó que el oferente presentó el respectivo Formulario de Compromiso de Subcontratación, comprometiéndose a subcontratar un 1,00 % del valor de la oferta con el proveedor VEGA GUANOCHANGA WASHINGTON STALIN, domiciliado en el cantón Loreto, provincia de Orellana (localidad cantonal). En virtud del resultado oficial emitido por el módulo de calificación del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, se asignó la puntuación de 5,00/5,00 puntos para este parámetro.

Respecto del parámetro de Participación Ecuatoriana, la Comisión Técnica verificó que el oferente presentó el porcentaje “Participación Ecuatoriana para el Proyecto, Propuesta por el Oferente", en el cual ofertó un Porcentaje de Participación Ecuatoriana (PPE) de 66,00413 %, porcentaje superior al PPE mínimo de 65,67 % establecido por la Entidad Contratante en los pliegos del procedimiento. Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0624-M-GD, la Coordinación de Compras Públicas remitió el resultado oficial emitido por el módulo de calificación del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual asignó al oferente la puntuación de 10,00/10,00 puntos, calificación que fue incorporada íntegramente por la Comisión Técnica al corresponder al cálculo automático efectuado por la herramienta informática administrada por el SERCOP.

ANÁLISIS DEL MEJOR VALOR POR DINERO

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

Con base en la evaluación integral efectuada, la Comisión Técnica procedió a determinar si la oferta presentada representaba el mejor valor por dinero para la Entidad Contratante, considerando de manera conjunta los aspectos técnicos, económicos y legales previstos en los pliegos del procedimiento. Del análisis realizado se verificó que el CONSORCIO REPOELC acreditó el cumplimiento de los requisitos de integridad, los requisitos mínimos habilitantes y los parámetros de evaluación establecidos por la Entidad Contratante; justificó documentalmente la experiencia general y específica requerida; presentó el Formulario de Compromiso de Cumplimiento de Parámetros en Etapa Contractual; ofertó un Porcentaje de Participación Ecuatoriana superior al mínimo exigido por la Entidad Contratante; presentó un compromiso de subcontratación con un proveedor domiciliado en la localidad cantonal; y formuló una oferta económica inferior al presupuesto referencial, manteniendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones previstas en los pliegos.

Como resultado de la evaluación integral, el CONSORCIO REPOELC obtuvo una calificación total de 94,42 puntos sobre 100, reflejando un adecuado equilibrio entre la capacidad técnica acreditada, la experiencia demostrada, la oferta económica presentada y los parámetros de política pública incorporados en el procedimiento.

En consecuencia, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC constituye la propuesta que representa el mejor valor por dinero para la Entidad Contratante, por cuanto satisface integralmente los requisitos técnicos, económicos y legales establecidos en los pliegos del procedimiento, garantizando la adecuada ejecución del objeto contractual bajo criterios de eficiencia, eficacia, calidad, economía y uso responsable de los recursos públicos. Como resultado de la evaluación integral efectuada por la Comisión Técnica, el CONSORCIO REPOELC, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con RUC No. 2290351068001, obtuvo una calificación total de 94,42 puntos sobre 100, conforme consta en el Acta No. 005 de Evaluación y Calificación por Puntaje, documento que forma parte integrante del expediente administrativo y contiene la motivación técnica y jurídica de la evaluación realizada.

En virtud de lo expuesto, la Comisión Técnica determina que la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC cumple con los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, encontrándose habilitada para continuar con la etapa de adjudicación.

Aplicados los parámetros de evaluación previstos en los pliegos del procedimiento, se obtuvo el siguiente resultado:

PARÁMETRO	VALORACIÓN	OBSERVACIÓN
Experiencia general	10.00/10.00	Ver cuadro “RESUMEN EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS”
Experiencia especifica	19.42/25.00	

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

Otro(s) parámetro(s) resuelto(s) por la entidad	00.00/00.00	NO APLICA, de conformidad con los parámetros de evaluación establecidos en el pliego del procedimiento.
Oferta económica	50.00/50.00	La Comisión Técnica verificó que el oferente presentó una oferta económica por el valor de **USD 117.431,29730**, sin IVA, la cual fue evaluada conforme a la metodología de calificación económica establecida en el pliego del procedimiento, obteniendo la puntuación máxima de 50,00/50,00 puntos.
SUBTOTAL	**79.42/85.00**	
Subcontratación	5.00/5.00	Presentó compromiso de subcontratación con el proveedor **VEGA GUANOCHANGA WASHINGTON STALIN, domiciliado en el cantón Loreto, provincia de Orellana (localidad cantonal)**, por un porcentaje total de subcontratación del **29,67 %** del valor de la oferta, conforme al Formulario de Compromiso para Subcontratación. Se asigna la calificación de **5,00/5,00 puntos** conforme al resultado oficial emitido por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Participación ecuatoriana	10.00/10.00	Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0624-M-GD, la Coordinación de Compras Públicas remitió a esta Comisión Técnica el resultado oficial generado por el módulo de calificación del Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública para el parámetro Participación Ecuatoriana. De la revisión de "Participación Ecuatoriana para el Proyecto, Propuesta por el Oferente", constante en la oferta presentada por el CONSORCIO REPOELC, se verificó que el oferente ofertó un Porcentaje de Participación Ecuatoriana (PPE) de **66,00413 %**, porcentaje que supera el PPE mínimo de **65,67 %** establecido por la Entidad Contratante en los pliegos del procedimiento. En virtud de dicha verificación y del resultado oficial emitido por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual asigna al oferente la puntuación de **10,00/10,00 puntos**, la Comisión Técnica incorpora íntegramente dicha calificación en la presente evaluación, por corresponder al cálculo automático efectuado por la herramienta informática administrada por el SERCOP, sin efectuar modificación alguna.
TOTAL	**94.42/100.00**	

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

Como resultado de la evaluación integral efectuada por la Comisión Técnica, el **CONSORCIO REPOELC**, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, con RUC No. 2290351068001, obtuvo una calificación total de **94,42 puntos sobre 100**, constituyéndose en la única oferta presentada y habilitada dentro del procedimiento, al haber acreditado el cumplimiento de los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación previstos en los pliegos, conforme consta en el Acta No. 005 de Evaluación y Calificación por Puntaje. En consecuencia, la oferta satisface las condiciones técnicas, económicas y legales exigidas por la Entidad Contratante para la adjudicación del procedimiento.

4. RECOMENDACIÓN

Con fundamento en el análisis técnico y jurídico efectuado por la Comisión Técnica dentro de la fase precontractual del procedimiento de Licitación de Obra No. **LICO-GADML-2026-03**, y conforme a las conclusiones constantes en el Acta No. 005 de Evaluación y Calificación por Puntaje, se determina que la oferta presentada por el **CONSORCIO REPOELC**, representado por su **Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier**, con **RUC No. 2290351068001**, cumple con los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, obteniendo una calificación total de **94,42 puntos sobre 100**.

Del análisis integral efectuado por la Comisión Técnica se concluye que la propuesta presentada por el CONSORCIO REPOELC constituye la oferta que representa el mejor valor por dinero para la Entidad Contratante, por cuanto acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y económicos exigidos en los pliegos; justificó documentalmente la experiencia general y específica requerida; presentó el compromiso de cumplimiento de los parámetros de ejecución contractual; obtuvo la máxima calificación en los parámetros de oferta económica, participación ecuatoriana y subcontratación conforme a los resultados oficiales emitidos por el Portal Oficial del Sistema Nacional de Contratación Pública; y alcanzó la mayor valoración conforme a la metodología de evaluación prevista para el presente procedimiento.

En virtud de lo expuesto, y considerando que el **CONSORCIO REPOELC** constituye la única oferta presentada y habilitada dentro del procedimiento, la Comisión Técnica, en ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución Administrativa No. 110-GADML-2026, **recomienda a la Máxima Autoridad adjudicar el procedimiento de Licitación de Obra No. LICO-GADML-2026-03, cuyo objeto es el "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL CENTRO DE ABASTOS Y MUNICIPIO DEL CANTÓN LORETO, MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DOS (2) GRUPOS ELECTRÓGENOS, INCLUYE ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS", al CONSORCIO REPOELC, con RUC No. 2290351068001, representado por su Procurador Común, señor Cedeño Mora Jerson Javier, por el valor ofertado de USD 117.431,29730 (CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 29730/100000), sin incluir IVA, y por el plazo de ejecución de ciento veinte (120) días, contado a partir del día siguiente**

de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del Administrador del Contrato, de conformidad con las condiciones previstas en los pliegos del procedimiento.

La presente recomendación se emite con base en la evaluación integral efectuada por la Comisión Técnica, observando las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, el Código Orgánico Administrativo y los pliegos del procedimiento, dejando constancia de que la decisión recomendada se encuentra debidamente motivada y sustentada en la documentación que integra el expediente administrativo, particularmente en el Acta No. 005 de Evaluación y Calificación por Puntaje, documento que contiene el análisis técnico y jurídico de la evaluación realizada y que forma parte integrante del presente informe.

Para constancia de lo actuado y de la recomendación emitida dentro del presente procedimiento precontractual, los miembros de la Comisión Técnica suscriben el presente Informe de Recomendación para Adjudicación. La Secretaria de la Comisión Técnica lo suscribe en ejercicio de sus funciones de apoyo administrativo y de certificación de las actuaciones desarrolladas durante el procedimiento, sin voz ni voto, para los fines legales correspondientes.

Loreto, 04 de agosto de 2026

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Públicas
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura
DELEGADA DEL TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
RODRIGO JAVIER NOGUERA MENDOZA

Mgs. Rodrigo Javier Noguera Mendoza
Coordinador de Mantenimiento de Infraestructura y Redes
PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
DALIA SILVANA SANMARTIN TORRES

Mgs. Dalia Silvana Sanmartín Torres
SP6 - Ingeniero Civil
SECRETARIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	**PLANILLA N°#01 (AVANCE DE OBRA)**				
CONTRATO N :	**COTO-GADML-2025-01**		**PLANILLA N°**	**#01 (AVANCE DE OBRA)**	
OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO''.**		**PERIODO**	**DESDE**	7-may-2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIVERSJAZ			**HASTA**	31-may-2026
FISCALIZADOR:	ING. CAROL CARRERA VÉLEZ				
ADMINISTRADOR:	ING. DALIA SANMARTIN TORRES		**PLAZO EJECUTADO**		25 dias
UBICACIÓN	PARROQUIA PUERTO MURIALDO		**FECHA DE CONTRATO**		09-jul-25
MONTO CONTRATO USD.	**$ 290,455.81**		**FECHA INICIO OBRA**		07-may-26
INVERSION ACUMULADA PROGRAMADA	$ 290,455.81		**PLAZO**		90 dias
% ANTICIPO DOLARES	50%		**AMPLIACION**		
	$ 145,227.91		**FECHA FINAL DE CONTRATO**		04-ago-26
			FECHA PRESENTACIÓN DE PLANILLA		05-jun-26

ITEM	RUBROS	UND	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDADES/VOLUMEN				INVERSION		
						TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA											
	PRELIMINARES											
1	Replanteo y nivelacion	m2	1200.00	0.72	864.00000		1,200.00	1,200.00	100.00%		$ 864.00	$ 864.00
2	Excavacion para cimientos a máquinas	m3	142.56	10.48	1494.02880		74.59	74.59	52.32%		$ 781.70	$ 781.70
	CIMENTACIÓN											
3	Relleno piedra bola (manual)	m3	16.12	16.73	269.68760		16.13	16.13	100.06%		$ 269.85	$ 269.85
4	Replantillo de h.simple	m3	4.03	133.76	539.05280		4.03	4.03	100.00%		$ 539.05	$ 539.05
5	Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	14.11	203.13	2866.16430		14.11	14.11	100.00%		$ 2,866.16	$ 2,866.16
6	Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)	m3	30.11	138.06	4156.98660		19.43	19.43	64.53%		$ 2,682.51	$ 2,682.51
7	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	20.07	212.11	4257.04770		19.97	19.97	99.50%		$ 4,235.84	$ 4,235.84
8	H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	9.28	214.62	1991.67360		9.29	9.29	100.11%		$ 1,993.82	$ 1,993.82
	ACERO DE REFUERZO											
9	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	4300.2	2.11	9073.42200		4,530.79	4,530.79	105.36%		$ 9,559.97	$ 9,559.97
	ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS											
10	Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil	kg	35443.63	4.02	142483.39260		16,259.05	16,259.05	45.87%		$ 65,361.38	$ 65,361.38
11	Cubierta de galvalumen prepintado e= 0.40 mm, incluye cumbrero	m2	1342.00	22.68	30436.56000							
12	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32)	m	80.60	12.63	1017.97800							
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
13	Acometida principal cable electrico 3x4	m	30.00	5.4	162.00000							
14	Tablero de control de 8 puntos (incluye breakers)	u	1.00	126.77	126.77000							
15	Suministro e instalación de iliminarias tipo UFO 200 W	PTO	8.00	289.36	2314.88000							
16	Suministro e instalación de tomacorrientes	PTO	3.00	39.12	117.36000							
	INSTALACIONES SANITARIAS											
17	Bajantes de agua lluvia (pvc 4")	ml	60.00	7.44	446.40000							
18	Cajas de revision (60x60 cm) con tapa de h.a.	u	13.00	65.27	848.51000							
19	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	80.00	5.01	400.80000							
	PISOS											
20	Relleno con matrial petreo (compactado)	m3	162.00	30.42	4928.04000							
21	Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada	m2	1200.00	19.97	23964.00000							
22	Masillado y alisado impermeable (inc. aditivo) e=2cm con helicoptero	m2	1200.00	5.36	6432.00000							
23	Pintura Artistica en piso 6x3 m	u	1.00	220.64	220.64000							
24	Aceras de h.s. f'c=180kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	144.00	17.88	2574.72000							
25	Bordillo de h.simple f'c=180kg/cm2 (0.30x 0.10cm) inc. encofrado	m	288.00	18.31	5273.28000							
	ESCENARIO											
26	Excavación manual para muro ciclopeo	m3	2.70	9.63	26.00100		4.20	4.20	155.56%		$ 40.45	$ 40.45
27	Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)	m3	8.16	138.06	1126.56960							
28	Relleno con matrial petreo (compactado)	m3	60.00	30.42	1825.20000							
29	Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada	m2	120.00	19.97	2396.40000							

30	Masillado y alisado impermeable (inc. aditivo) e=2cm con helicoptero	m2	120.00	5.36	643.20000							
31	Mamposteria bloque liviano e=10 cm	m2	40.00	14.39	575.60000							
32	Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3	m2	116.62	7.81	910.80220							
33	Pasteado de paredes	m2	116.62	4.53	528.28860							
34	Pintura de caucho interior/exterior	m2	116.62	4.3	501.46600							
	ACABADOS											
35	Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3 (columnas)	m2	36.00	7.81	281.16000							
36	Pasteado de paredes	m2	36.00	4.53	163.08000							
37	Pintura de caucho interior/exterior	m2	36.00	4.3	154.80000							
38	Asta de bandera con tubo de acero inoxidable 3" L=4m	u	3.00	50.67	152.01000							
	MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE											
39	Reparación de bases de columna de cancha cubierta	U	6.00	76.67	460.02000							
40	Pintura anticorrosiva en perfileria metálica	m2	216.00	6.19	1337.04000							
41	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32) (cubierta de cancha)	m	60.60	12.63	765.37800							
42	Bajantes de agua lluvia (pvc 4") (cubierta de cancha)	m	12.00	7.44	89.28000							
43	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32) (en cubierta de aula)	m	26.00	12.63	328.38000							
44	Bajantes de agua lluvia (pvc 4") (cubierta de aula)	ml	36.00	7.44	267.84000							
45	Picado de acera existente	m2	0.54	5.86	3.16440							
46	Cajas de revision (60x60 cm)	u	6.00	65.27	391.62000							
47	Retiro de tuberia y escombros	m	26.00	1.07	27.82000							
48	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	36.00	5.01	180.36000							
49	Aceras de h.s. f'c=180kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	40.90	17.88	731.29200							
50	Picado de piso de cancha	m2	660.00	4.78	3154.80000							
51	Masillado fino impermeable (inc. aditivo) e=2 cm	m2	660.00	5.36	3537.60000							
52	señalización en piso de cancha a=6cm (pintura de alto trafico)	m	290.00	3.29	954.10000							
53	Pintura de alto tráfico	m2	660.00	5.08	3352.80000							
	CANALIZACION DE AA LL (ENTRADA A LA IE)											
54	Picado de acera existente incluye desalojo	m2	3.16	5.86	18.51760							
55	Canal de hormigón simple y rejilla de hierro	m	7.90	65.3	515.87000							
56	Cajas de revision (60x60 cm)	u	2.00	65.27	130.54000							
57	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	13.00	5.01	65.13000							
	CANALIZACIÓN DE AASS DE BAR ESCOLAR											
58	Cajas de revision (60x60 cm)	u	13.00	65.27	848.51000							
59	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	90.00	5.01	450.90000							
	RECUBRIMIENTO TOTAL DE LA IE											
60	Pintura látex vinil acrílica interior/exterior	m2	3439.00	4.53	15578.67000							
	ELEMENTO INFORMATIVO											
61	Pancarta informativa	u	2.00	220.32	440.64000							
	CONTROL AMBIENTAL											
62	Delimitación de la obra	m	160.00	0.59	94.40000		70.00	70.00	43.75%		$ 41.30	$ 41.30
63	Señalización informativa, de obligacion y prohibición	u	3.00	62.39	187.17000		1.00	1.00	33.33%		$ 62.39	$ 62.39
					290,455.8134				TOTAL PLANILLADO ==> $		**$ 89,298.42**	**$ 89,298.42**

% AVANCE OBRA PARCIAL **30.74%**

% AVANCE OBRA ACUMULADO **30.74%**

CONTROL DEL ANTICIPO	
MONTO RECIBIDO (SPI)	$ 145,227.91
MONTO DEVENGADO EN ESTA PLANLLA	$ 44,649.21
MONTO POR DEVENGAR	$ 100,578.70

DESCUENTOS		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 44,649.21	
DESCUENTOS POR LEY		
LIQUIDO A RECIBIR (SIN IVA)	**$ 44,649.21**	

Son: Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 21/100 (Sin IVA)

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

CONSORCIO RIVERSJAZ	ING. CAROL CARRERA VÉLEZ	ING. DALIA SANMARTIN TORRES
CONTRATISTA	**FISCALIZADORA DE OBRA**	**ADMINISTRADORA DE CONTRATO**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	**PLANILLA N°#02 (AVANCE DE OBRA)**			
CONTRATO N :	**COTO-GADML-2025-01**	**PLANILLA N°**		**#02 (AVANCE DE OBRA)**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO''.**	**PERIODO**	**DESDE**	1-jun-2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO RIVERSJAZ		**HASTA**	30-jun-2026
FISCALIZADOR:	ING. CAROL CARRERA VÉLEZ			
ADMINISTRADOR:	ING. DALIA SANMARTIN TORRES	**PLAZO EJECUTADO**		55 dias
UBICACIÓN	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE CONTRATO**		09-jul-25
MONTO CONTRATO USD.	**$ 290,455.81**	**FECHA INICIO OBRA**		07-may-26
INVERSION ACUMULADA PROGRAMADA	$ 290,455.81	**PLAZO**		90 dias
% ANTICIPO DOLARES	50%	**AMPLIACION**		
	$ 145,227.91	**FECHA FINAL DE CONTRATO**		04-ago-26
		FECHA PRESENTACIÓN DE PLANILLA		05-jul-26
		FECHA DEVOL PLANILLA		13-jul-26
		FECHA DE REINGRESO DE PLANILLA		23-jul-26

ITEM	RUBROS	UND	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDADES/VOLUMEN				INVERSION		
						TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA											
	PRELIMINARES											
1	Replanteo y nivelacion	m2	1200.00	0.72	864.00000	1,200.00		1,200.00	100.00%	864.00		$ 864.00
2	Excavacion para cimientos a máquinas	m3	142.56	10.48	1494.02880	74.59		74.59	52.32%	781.70		$ 781.70
	CIMENTACIÓN							-				
3	Relleno piedra bola (manual)	m3	16.12	16.73	269.68760	16.13		16.13	100.06%	269.85		$ 269.85
4	Replantillo de h.simple	m3	4.03	133.76	539.05280	4.03		4.03	100.00%	539.05		$ 539.05
5	Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	14.11	203.13	2866.16430	14.11		14.11	100.00%	2,866.16		$ 2,866.16
6	Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)	m3	30.11	138.06	4156.98660	19.43		19.43	64.53%	2,682.51		$ 2,682.51
7	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	20.07	212.11	4257.04770	19.97		19.97	99.50%	4,235.84		$ 4,235.84
8	H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	9.28	214.62	1991.67360	9.29		9.29	100.11%	1,993.82		$ 1,993.82
	ACERO DE REFUERZO							-				
9	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	4300.2	2.11	9073.42200	4,530.79		4,530.79	105.36%	9,559.97		$ 9,559.97
	ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS							-				
10	Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil	kg	35443.63	4.02	142483.39260	16,259.05	19,184.59	35,443.64	100.00%	65,361.38	$ 77,122.05	$ 142,483.43
11	Cubierta de galvalumen prepintado e= 0.40 mm, incluye cumbrero	m2	1342.00	22.68	30436.56000		1,398.60	1,398.60	104.22%		$ 31,720.25	$ 31,720.25
12	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32)	m	80.60	12.63	1017.97800			-				
	INSTALACIONES ELECTRICAS							-				
13	Acometida principal cable electrico 3x4	m	30.00	5.4	162.00000			-				
14	Tablero de control de 8 puntos (incluye breakers)	u	1.00	126.77	126.77000			-				
15	Suministro e instalación de iliminarias tipo UFO 200 W	PTO	8.00	289.36	2314.88000			-				
16	Suministro e instalación de tomacorrientes	PTO	3.00	39.12	117.36000			-				
	INSTALACIONES SANITARIAS							-				
17	Bajantes de agua lluvia (pvc 4")	ml	60.00	7.44	446.40000			-				
18	Cajas de revision (60x60 cm) con tapa de h.a.	u	13.00	65.27	848.51000		10.00	10.00	76.92%		$ 652.70	$ 652.70
19	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	80.00	5.01	400.80000		124.00	124.00	155.00%		$ 621.24	$ 621.24
	PISOS							-				
20	Relleno con matrial petreo (compactado)	m3	162.00	30.42	4928.04000		235.87	235.87	145.60%		$ 7,175.17	$ 7,175.17
21	Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada	m2	1200.00	19.97	23964.00000			-				
22	Masillado y alisado impermeable (inc. aditivo) e=2cm con helicoptero	m2	1200.00	5.36	6432.00000			-				
23	Pintura Artistica en piso 6x3 m	u	1.00	220.64	220.64000			-				
24	Aceras de h.s. f'c=180kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	144.00	17.88	2574.72000							
25	Bordillo de h.simple f'c=180kg/cm2 (0.30x 0.10cm) inc. encofrado	m	288.00	18.31	5273.28000		72.80	72.80	25.28%		$ 1,332.97	$ 1,332.97
	ESCENARIO							-				

26	Excavación manual para muro ciclopeo	m3	2.70	9.63	26.00100	4.20		4.20	155.56%	40.45		$ 40.45
27	Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)	m3	8.16	138.06	1126.56960			-				
28	Relleno con matrial petreo (compactado)	m3	60.00	30.42	1825.20000		55.24	55.24	92.07%		$ 1,680.40	$ 1,680.40
29	Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada	m2	120.00	19.97	2396.40000		168.10	168.10	140.08%		$ 3,356.96	$ 3,356.96
30	Masillado y alisado impermeable (inc. aditivo) e=2cm con helicoptero	m2	120.00	5.36	643.20000			-				
31	Mamposteria bloque liviano e=10 cm	m2	40.00	14.39	575.60000		39.52	39.52	98.80%		$ 568.69	$ 568.69
32	Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3	m2	116.62	7.81	910.80220		119.42	119.42	102.40%		$ 932.67	$ 932.67
33	Pasteado de paredes	m2	116.62	4.53	528.28860			-				
34	Pintura de caucho interior/exterior	m2	116.62	4.3	501.46600			-				
	ACABADOS							-				
35	Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3 (columnas)	m2	36.00	7.81	281.16000			-				
36	Pasteado de paredes	m2	36.00	4.53	163.08000			-				
37	Pintura de caucho interior/exterior	m2	36.00	4.3	154.80000			-				
38	Asta de bandera con tubo de acero inoxidable 3" L=4m	u	3.00	50.67	152.01000			-				
	MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE							-				
39	Reparación de bases de columna de cancha cubierta	U	6.00	76.67	460.02000			-				
40	Pintura anticorrosiva en perfileria metálica	m2	216.00	6.19	1337.04000			-				
41	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32) (cubierta de cancha)	m	60.60	12.63	765.37800			-				
42	Bajantes de agua lluvia (pvc 4") (cubierta de cancha)	m	12.00	7.44	89.28000			-				
43	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32) (en cubierta de aula)	m	26.00	12.63	328.38000			-				
44	Bajantes de agua lluvia (pvc 4") (cubierta de aula)	ml	36.00	7.44	267.84000			-				
45	Picado de acera existente	m2	0.54	5.86	3.16440			-				
46	Cajas de revision (60x60 cm)	u	6.00	65.27	391.62000			-				
47	Retiro de tuberia y escombros	m	26.00	1.07	27.82000			-				
48	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	36.00	5.01	180.36000			-				
49	Aceras de h.s. f'c=180kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	40.90	17.88	731.29200			-				
50	Picado de piso de cancha	m2	660.00	4.78	3154.80000			-				
51	Masillado fino impermeable (inc. aditivo) e=2 cm	m2	660.00	5.36	3537.60000			-				
52	señalización en piso de cancha a=6cm (pintura de alto trafico)	m	290.00	3.29	954.10000			-				
53	Pintura de alto tráfico	m2	660.00	5.08	3352.80000			-				
	CANALIZACION DE AA LL (ENTRADA A LA IE)							-				
54	Picado de acera existente incluye desalojo	m2	3.16	5.86	18.51760			-				
55	Canal de hormigón simple y rejilla de hierro	m	7.90	65.3	515.87000			-				
56	Cajas de revision (60x60 cm)	u	2.00	65.27	130.54000			-				
57	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	13.00	5.01	65.13000			-				
	CANALIZACIÓN DE AASS DE BAR ESCOLAR							-				
58	Cajas de revision (60x60 cm)	u	13.00	65.27	848.51000			-				
59	Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	m	90.00	5.01	450.90000			-				
	RECUBRIMIENTO TOTAL DE LA IE							-				
60	Pintura látex vinil acrílica interior/exterior	m2	3439.00	4.53	15578.67000			-				
	ELEMENTO INFORMATIVO							-				
61	Pancarta informativa	u	2.00	220.32	440.64000			-				
	CONTROL AMBIENTAL							-				
62	Delimitación de la obra	m	160.00	0.59	94.40000	70.00	50.00	120.00	75.00%	41.30	$ 29.50	$ 70.80
63	Señalización informativa, de obligacion y prohibición	u	3.00	62.39	187.17000	1.00	1.00	2.00	66.67%	62.39	$ 62.39	$ 124.78
					290,455.8134			TOTAL PLANILLADO ==> $		**$ 89,298.42**	**$ 125,254.99**	**$ 214,553.41**

% AVANCE OBRA PARCIAL **43.12%**
% AVANCE OBRA ACUMULADO **73.86%**

CONTROL DEL ANTICIPO	
MONTO RECIBIDO (SPI)	$ 145,227.91
MONTO DEVENGADO EN ESTA PLANLLA	$ 107,276.71
MONTO POR DEVENGAR	$ 37,951.20

DESCUENTOS			
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	44,649.21	$ 62,627.50	$ 107,276.71
DESCUENTOS POR LEY			
LIQUIDO A RECIBIR (SIN IVA)		**$ 62,627.49**	

Son: Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintisiete con 49/100 (Sin IVA)

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA DE OBRA

PLANILLA NO1 (AVANCE DE OBRA)

“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO TIEMPO”.

***.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:**	**ING. DALIA SANMARTIN TORRES**
***.- FISCALIZADOR DE CONTRATO:**	**ING. CAROL CARRERA VÉLEZ**
***.- CONTRATISTA:**	**CONSORCIO RIVERSJAZ**
***.- MONTO DE CONTRATO:**	**$ 290,455.810**
***.-PLAZO CONTRATO PRINCIPAL:**	**90 DIAS CALENDARIO**
***.-FECHA DE INICIO CONTRATO**	**07/05/2026**
***.-FECHA DE VENCIMIENTO CONTRATO**	**04/08/2026**
***.-PERIODO:**	**DEL (07/05/2026 al 31/05/2026)**

*ANEXO DE CANTIDADES

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA DE CONTRATO


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 1 Replanteo y nivelacion
UNIDAD : m2
PRECIO UNITARIO: USD$ 0.72

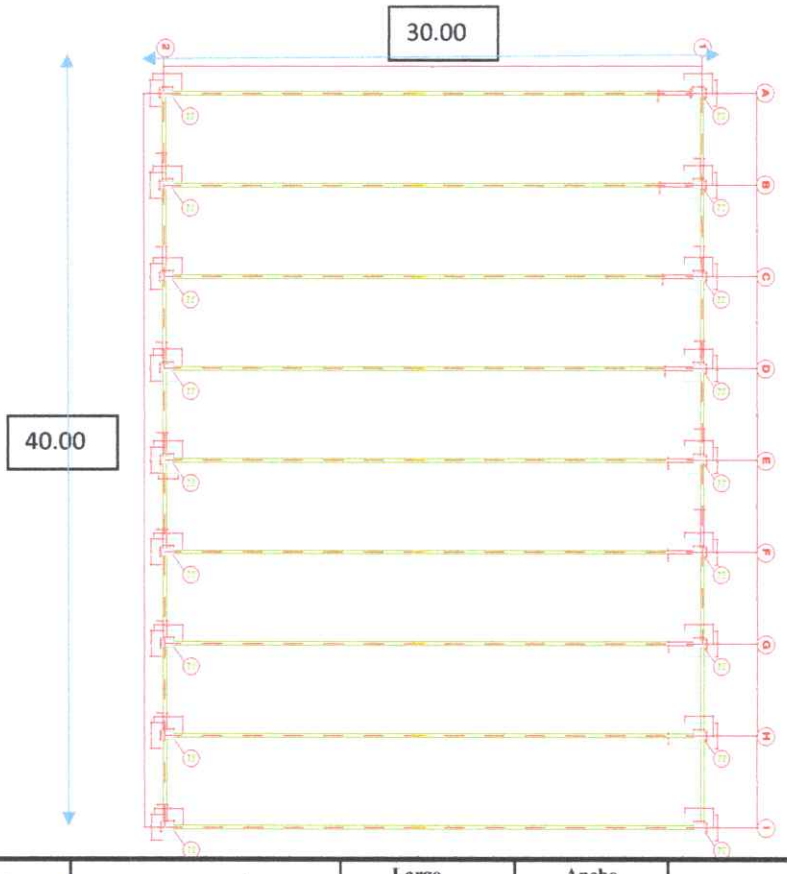

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Replanteo y nivelacion	CANCHA	40.00	30.00		1	1200.00	1,200.00
TOTAL =							**1,200.00**

CANTIDAD CONTRACTUAL	1200.00	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	1,200.00	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	1200.00	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	1200.00	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 864.00**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

FECHA DE PRESENTACION : 05-jun-26

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 07-may-26 31-may-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 28-jul-25

RUBRO: 2 Excavacion para cimientos a máquinas

UNIDAD : m

PRECIO UNITARIO: USD$ 10.48

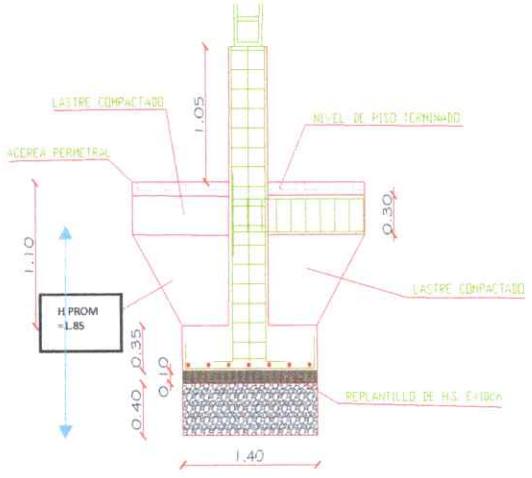

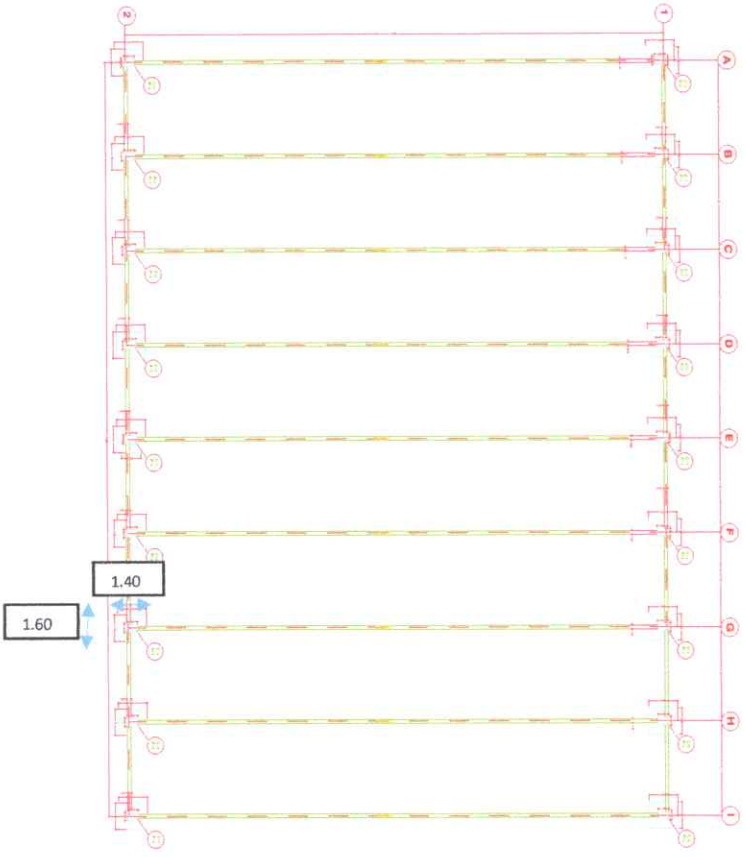

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Excavacion para cimientos a máquinas	CANCHA	1.40	1.60	1.85	18	74.59	74.59
TOTAL =							74.59

CANTIDAD CONTRACTUAL	142.56	m
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m
EJECUTADO ESTE PERÍODO	74.59	m
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	74.59	m
A COBRAR ESTE PERIODO	74.59	m

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **781.70**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

FECHA DE PRESENTACION : 05-jun-26

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 07-may-26 31-may-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 28-jul-25

RUBRO: 3 Relleno piedra bola (manual)

UNIDAD : m3

PRECIO UNITARIO: USD$ 16.73

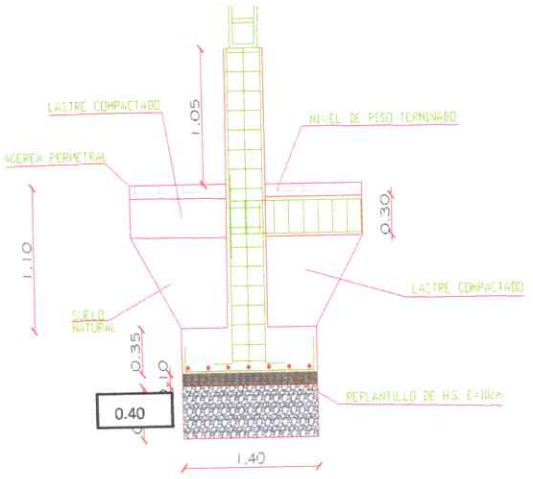



ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Relleno piedra bola (manual)	CANCHA	1.40	1.60	0.40	18	16.13	16.13
TOTAL =							16.13

CANTIDAD CONTRACTUAL	16.12	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	16.13	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	16.13	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	16.13	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **269.85**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

FECHA DE PRESENTACION : 05-jun-26

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 07-may-26 31-may-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 28-jul-25

RUBRO: 4 Replantillo de h.simple

UNIDAD : m3

PRECIO UNITARIO: USD$ 133.76

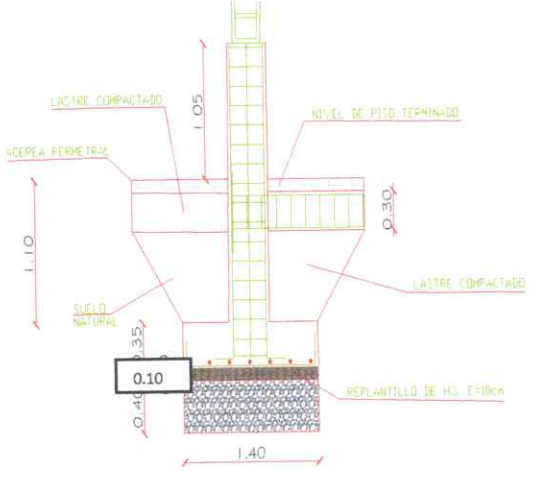

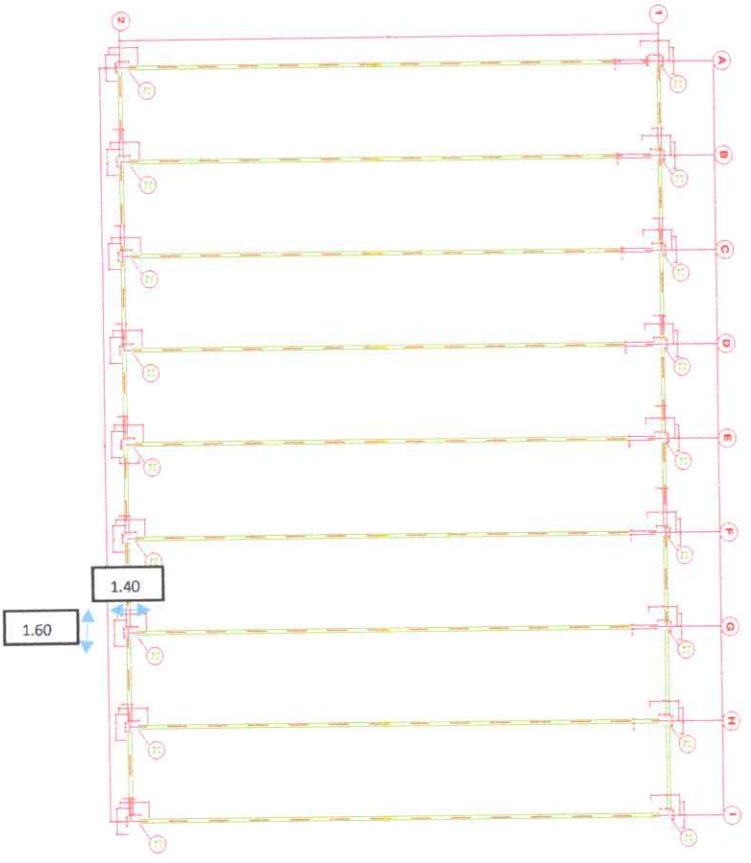

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Replantillo de h.simple	CANCHA	1.40	1.60	0.10	18	4.03	4.03
TOTAL =							4.03

CANTIDAD CONTRACTUAL	4.03	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	4.03	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	4.03	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	4.03	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ $ **539.05**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO


PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 5 Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2
UNIDAD : m3
PRECIO UNITARIO: USD$ 203.13

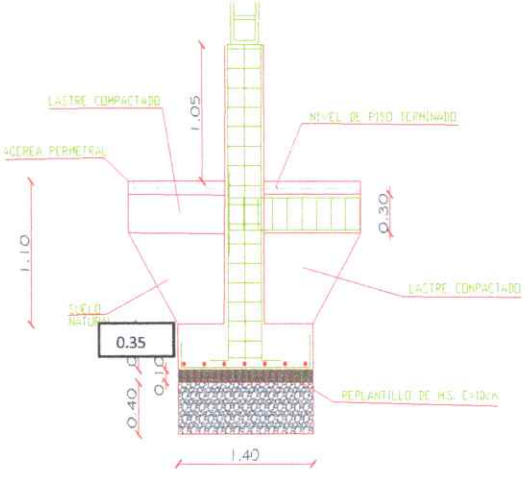

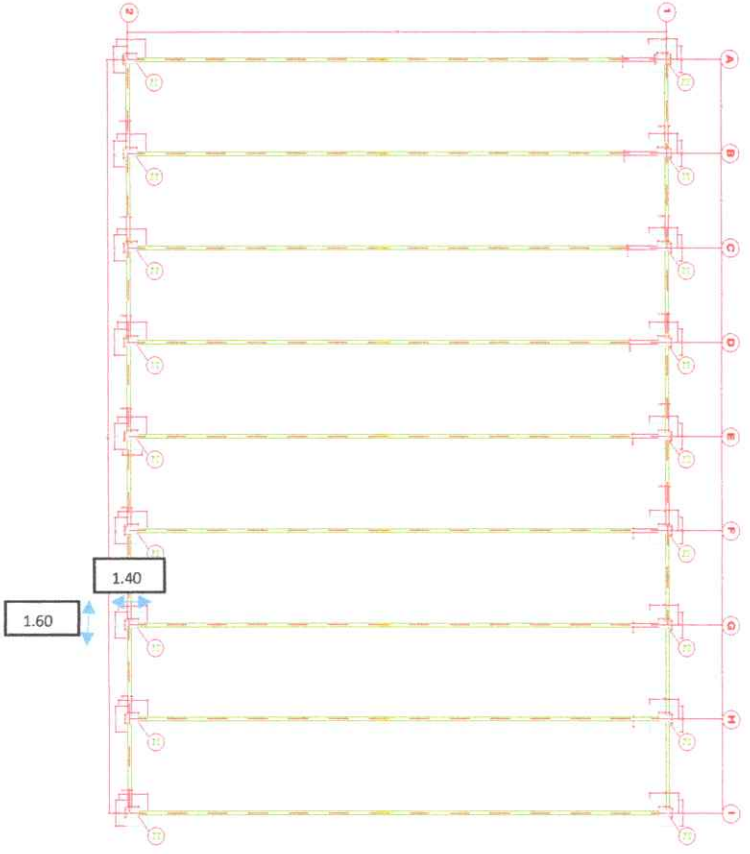

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2	CANCHA	1.40	1.60	0.35	18	14.11	14.11
TOTAL =							14.11

CANTIDAD CONTRACTUAL	14.11	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	14.11	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	14.11	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	14.11	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 2,866.16**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

FECHA DE PRESENTACION : 05-jun-26

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 07-may-26 31-may-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 28-jul-25

RUBRO: 6 Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)

UNIDAD : m3

PRECIO UNITARIO: USD$ 138.06

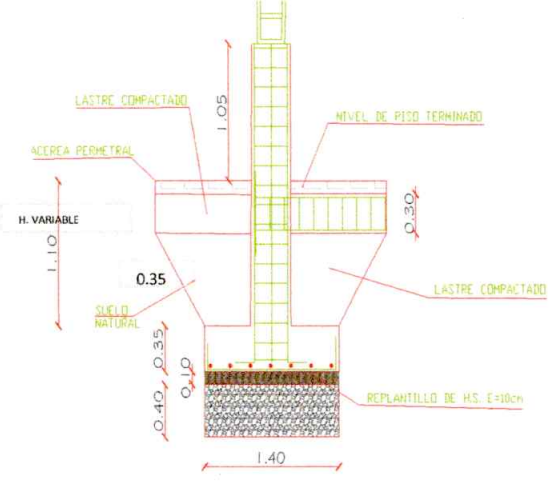

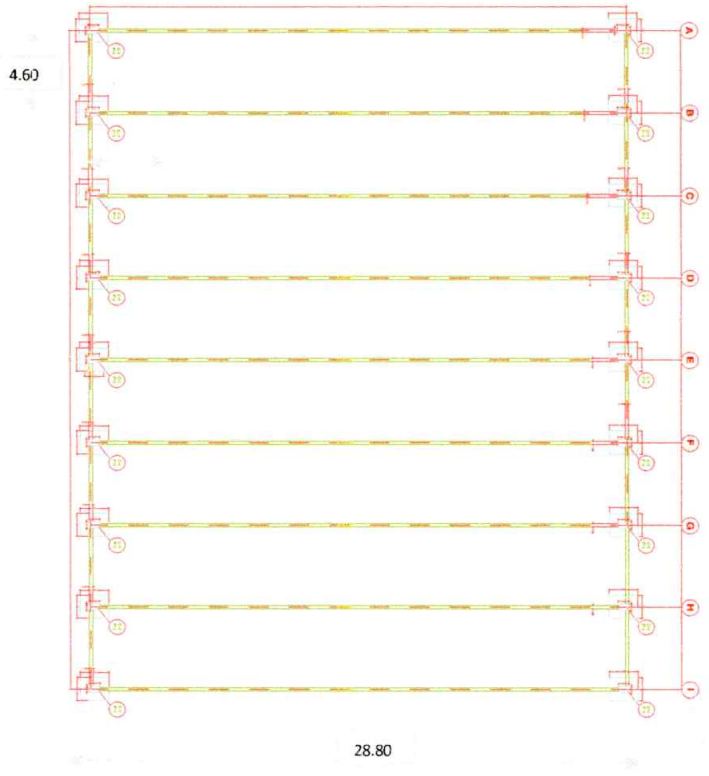

ANEXO	UBICACIÓN	Largo	Ancho	Altura Prom	N°	Total	
		m	m	m		PARCIAL	ACUMULADO
Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p)	CANCHA ALTAR PATRIO	28.80	0.20	0.45	3	7.78	7.78
		4.60	0.20	0.40	16	5.89	13.67
		28.80	0.20	1.00	1	5.76	19.43
TOTAL =							19.43

CANTIDAD CONTRACTUAL	30.11	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	19.43	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	19.43	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	19.43	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **2,682.51**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO


PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 7 H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2
UNIDAD : m3
PRECIO UNITARIO: USD$ 212.11

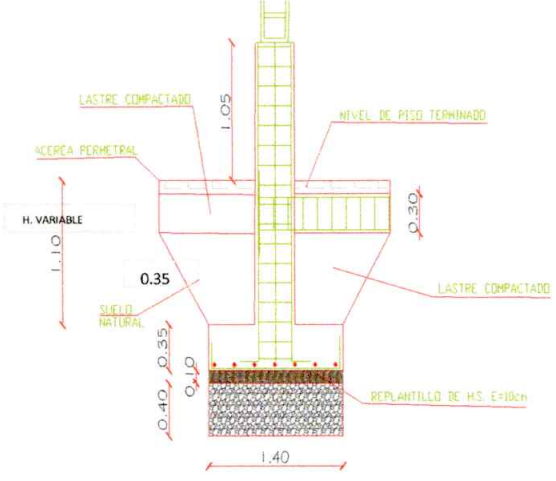

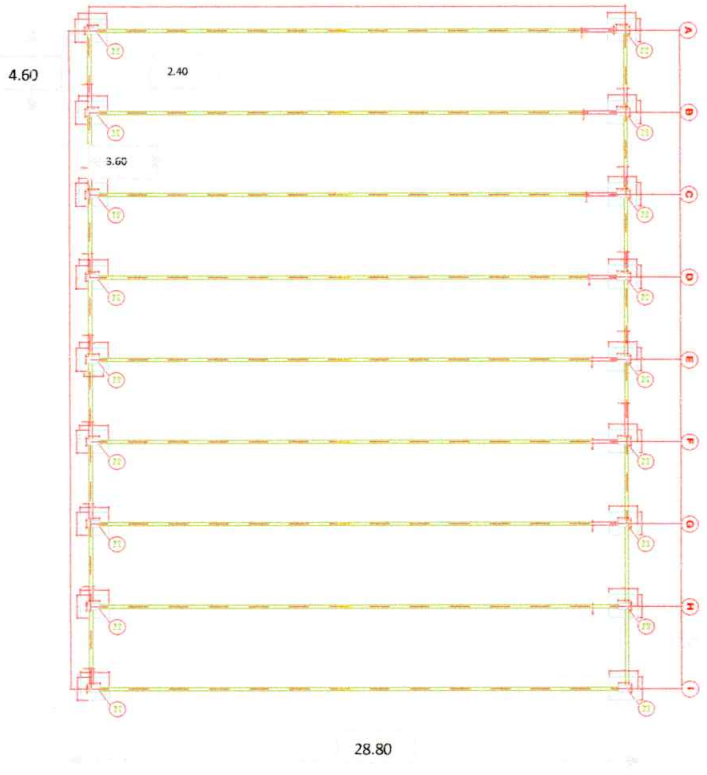

ANEXO	UBICACIÓN	Largo	Ancho	Altura Prom	N°	Total	
		m	m	m		PARCIAL	ACUMULADO
H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	CANCHA ALTAR PATRIO	28.80	0.20	0.30	9	15.55	15.55
		4.60	0.20	0.30	16	4.42	19.97
TOTAL =							19.97

CANTIDAD CONTRACTUAL	20.07	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	19.97	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	19.97	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	19.97	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **4,235.84**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO


PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 8 H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2
UNIDAD : m3
PRECIO UNITARIO: USD$ 214.62

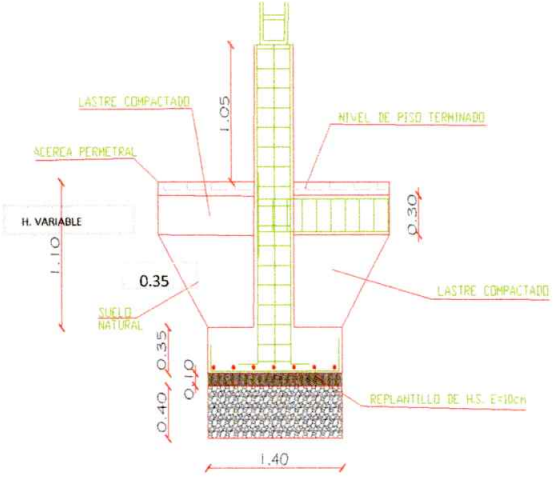

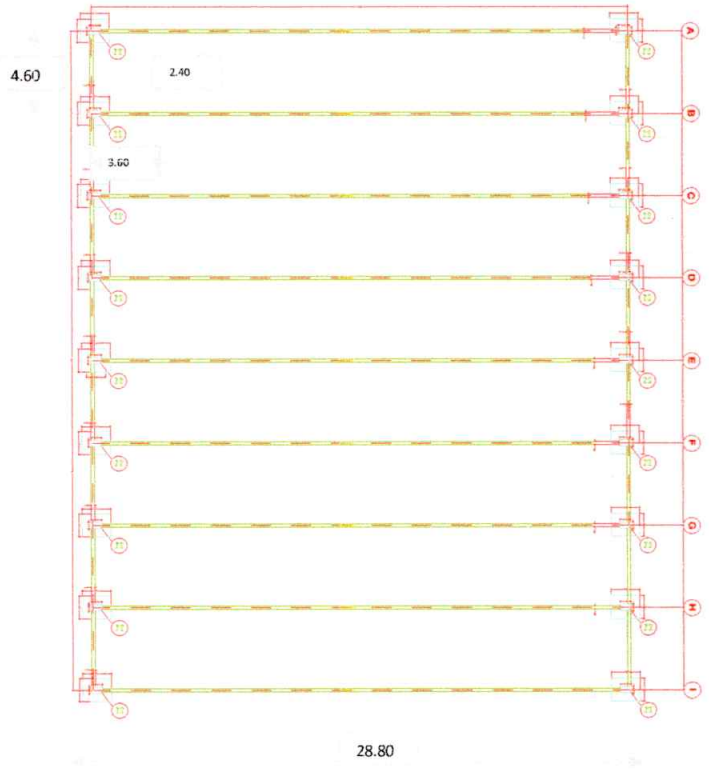

ANEXO	UBICACIÓN	Largo	Ancho	Altura Prom	N°	Total	
		m	m	m		PARCIAL	ACUMULADO
H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2	CANCHA ALTAR PATRIO	0.60	0.40	2.15	18	9.29	9.29
TOTAL =							9.29

CANTIDAD CONTRACTUAL	9.28	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	9.29	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.29	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	9.29	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **S** **1,993.82**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

RUBRO: 9 Hierro estructural fy=4200 kg/cm2
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USD$ 2.11

ANEXO	ELEMENTO	Ø	TIPO	CANT	DIMENSIONES					LONG. PARCIAL	LONG. TOTAL
		mm	m	m	a	b	c	d	g		
Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	PLINTO	14	C	126	1.40	2*.25				1.90	**239.40**
		14	C	144	1.20	2*.25				1.70	**244.80**
	CADENAS	12	I	36	12.0					12.00	**432.00**
		12	I	36	11.5	0.50				12.00	**432.00**
		12	I	36	6.50	0.50				7.00	**252.00**
		12	I	8	12.00					12.00	**96.00**
		12	I	16	11.5	0.50				12.00	**192.00**
		12	I	8	5	0.50				5.50	**44.00**
		8	O	1737	0.15	0.20	0.15	0.20	0.10	0.80	**1389.60**
		8	O	496	0.15	0.20	0.15	0.20	0.10	0.80	**396.80**
	COLUMNAS	14	L	180	2.60	0.35	0.20			3.15	**567.00**
		10	O	252	0.55	0.35	0.55	0.55	0.20	2.20	**554.40**
		10	O	252	0.35	0.35	0.35	0.35	0.20	1.60	**403.20**
	VINCHA MURO ALTAR	12	L	38.00	1.00	0.20				1.20	**45.60**
	PLACAS	18	L	108	0.60					0.60	**64.80**
		18	60*40*15mm								**18.00**

ELEMENTO	Ø	LONG. TOTAL	PESO	PESO
	(mm)	(m)	kg/m	kg
Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	18	64.80	1.998	129.47
	14	1051.20	1.208	1269.85
	12	1493.60	0.888	1326.32
	10	957.60	0.617	590.84
	8	1786.40	0.395	705.63
	PLACA	18.00	28.26	508.68
				4530.79

CANTIDAD CONTRACTUAL	4300.20	kg
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	kg
EJECUTADO ESTE PERÍODO	4,530.79	kg
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	4530.79	kg
A COBRAR ESTE PERIODO	4530.79	kg

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **9,559.97**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".


PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 9 Hierro estructural fy=4200 kg/cm2
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USD$ 2.11

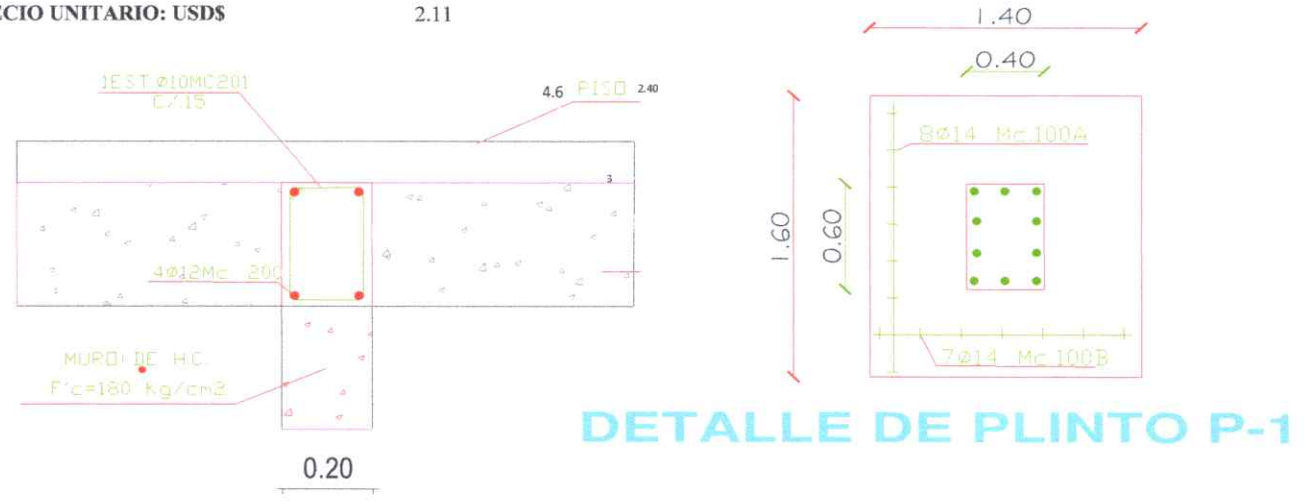

DETALLE DE PLINTO P-1

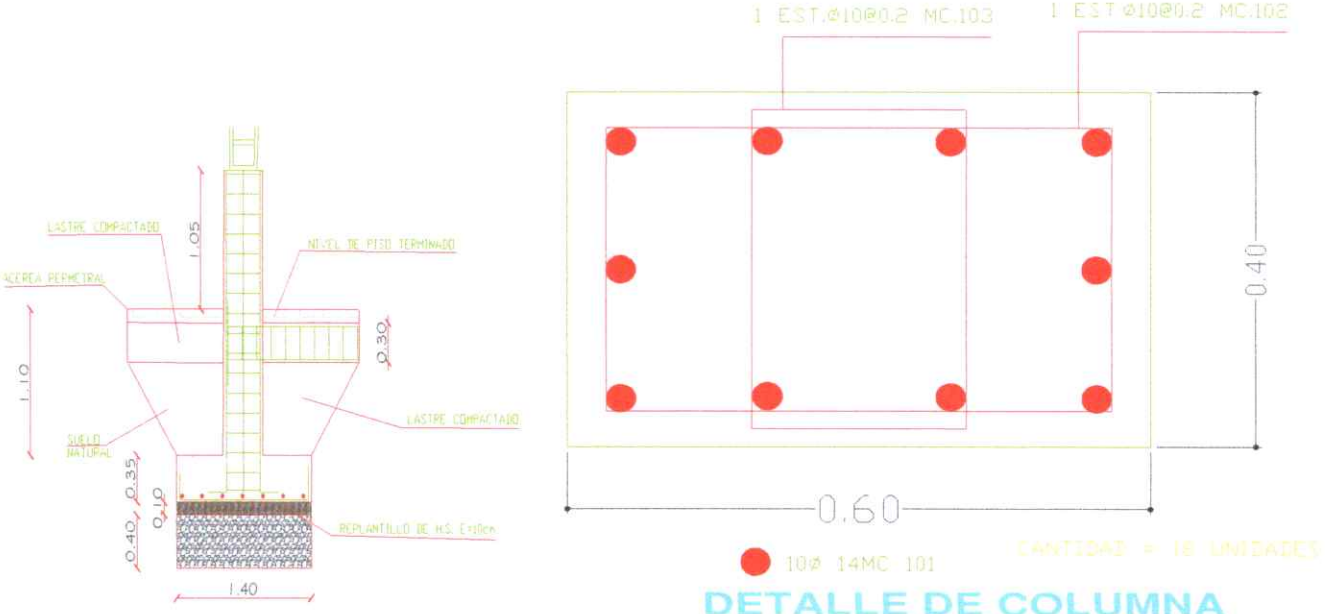

DETALLE DE COLUMNA

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO
FECHA DE PRESENTACION : 05-jun-26

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ
PERIODO DE EJECUCION : 07-may-26 31-may-26

MONTO $ 290,455.8100
PLAZO : 62 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 28-jul-25

RUBRO: 10 Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil C, y angulos
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USD$ 4.02

ELEMENTO	N°	a	b	C	Longitud Parcial	Longitud Total	Peso kg/m.	Peso Total kg.
CERCHAS COLUMNAS VERTICALES (2x9u.=18U.)								
"C" - VERTICALES EXTERIORES 200x100x10 mm.	18	3.42			3.42	61.56	29.360	1807.40
"C" - VERTICALES INTERIORES 200x100x10 mm.	18	3.44			3.44	61.92	29.360	1817.97
"C" - BASE UNION PLACA 200x100x10 mm.	18	0.45			0.45	8.10	29.360	237.82
"C" - BASE UNION VIGA 200x100x10 mm.	18	0.84			0.84	15.12	29.360	443.92
"L" - ANGULO HRIZONTAL 40x40x4 mm.	36	4.05			4.05	145.80	2.390	348.46
"L" - ANGULO DIAGONAL 40x40x4 mm.	36	5.55			5.55	199.80	2.390	477.52
							Suman Kg.	**5,133.09**
CERCHAS VIGAS HORIZONTALES .= 18U.								
"C" - SUPERIOR 200x80x6 mm.	9	33.30			33.30	299.70	16.340	4897.10
"C" - INFERIOR 200x80x6 mm.	9	34.10			34.10	306.90	16.340	5014.75
"L" - ANGULO VERTICAL 40x40x3 mm.	9	15.40	15.40		30.80	277.20	1.810	501.73
"L" - ANGULO DIAGONAL 40x40x3 mm.	9	21.45	21.45		42.90	386.10	1.810	698.84
"L" - ANGULO RIGIDIZADOR 40x40x3 mm.	44	0.17			0.17	7.48	1.810	13.54
							Suman Kg.	**11,125.96**
								16,259.05

CANTIDAD CONTRACTUAL	35443.63	kg
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	kg
EJECUTADO ESTE PERÍODO	#######	kg
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	16259.05	kg
A COBRAR ESTE PERIODO	16259.05	kg

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **65,361.38**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 — 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 10 — Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil C, y angulos
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USD$ 4.02

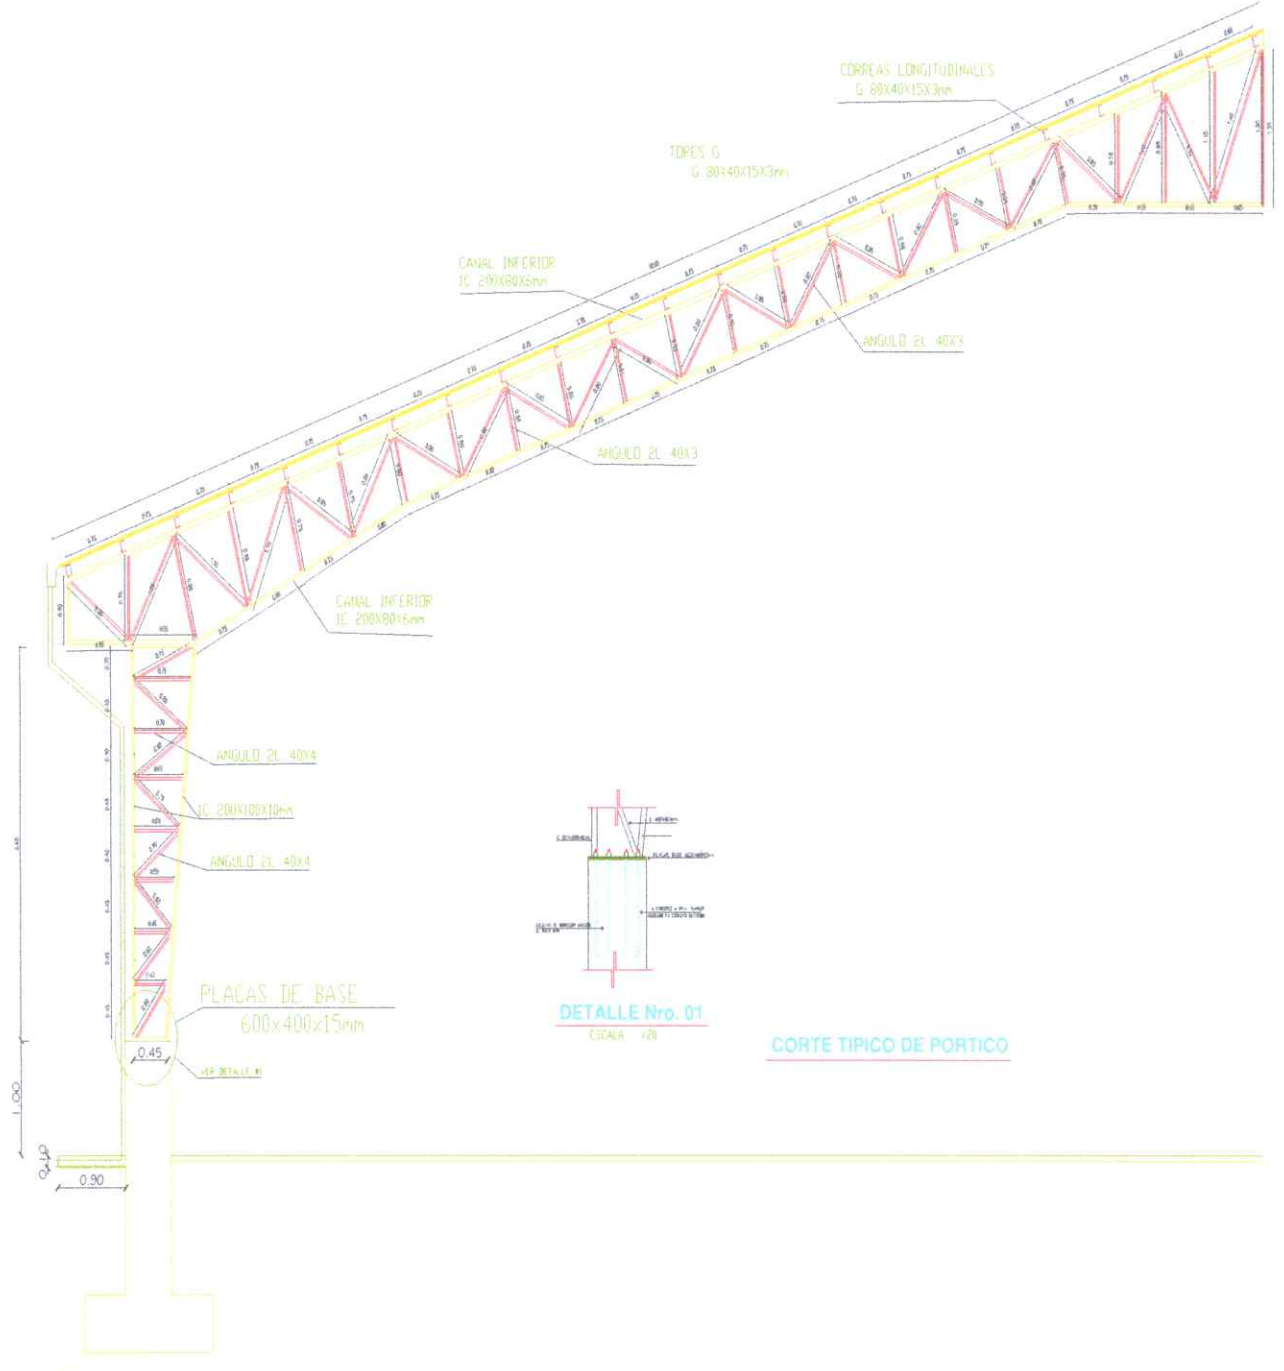

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VELEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO


PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 26 Excavación manual para muro ciclopeo
UNIDAD : m3
PRECIO UNITARIO: USD$ 9.63

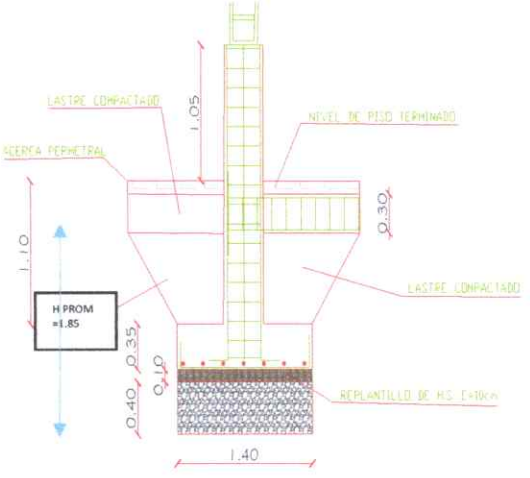

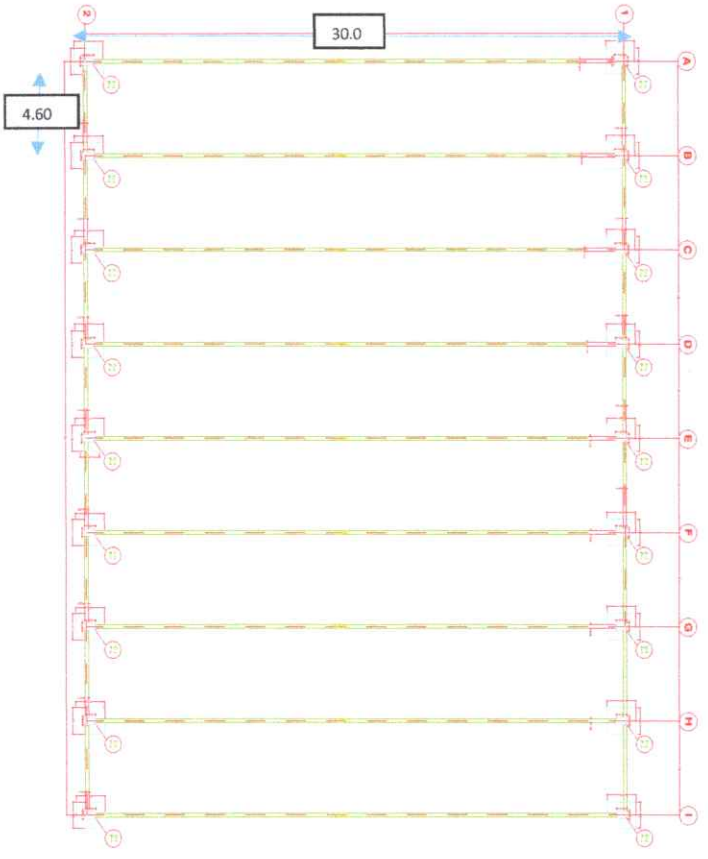

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Excavación manual para muro ciclopeo	ESCENARIO-ALTAR PATRIO	30.00	0.20	0.35	1	2.10	2.10
		4.60	0.20	0.40	2	0.74	2.84
		3.60	0.20	0.20	1	0.14	2.98
		2.40	0.20	0.20	1	0.10	3.08
		1.20	0.20	0.20	1	0.05	3.13
		2.80	0.20	0.20	1	0.11	3.24
		12.00	0.20	0.20	1	0.48	3.72
		1.20	0.20	0.20	1	0.05	3.77
		6.20	0.20	0.20	1	0.25	4.02
		4.60	0.20	0.20	1	0.18	4.20
TOTAL =							4.20

CANTIDAD CONTRACTUAL	2.70	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	4.20	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	4.20	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	4.20	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 40.45**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 62 Delimitación de la obra
UNIDAD : m
PRECIO UNITARIO: USD$ 0.59

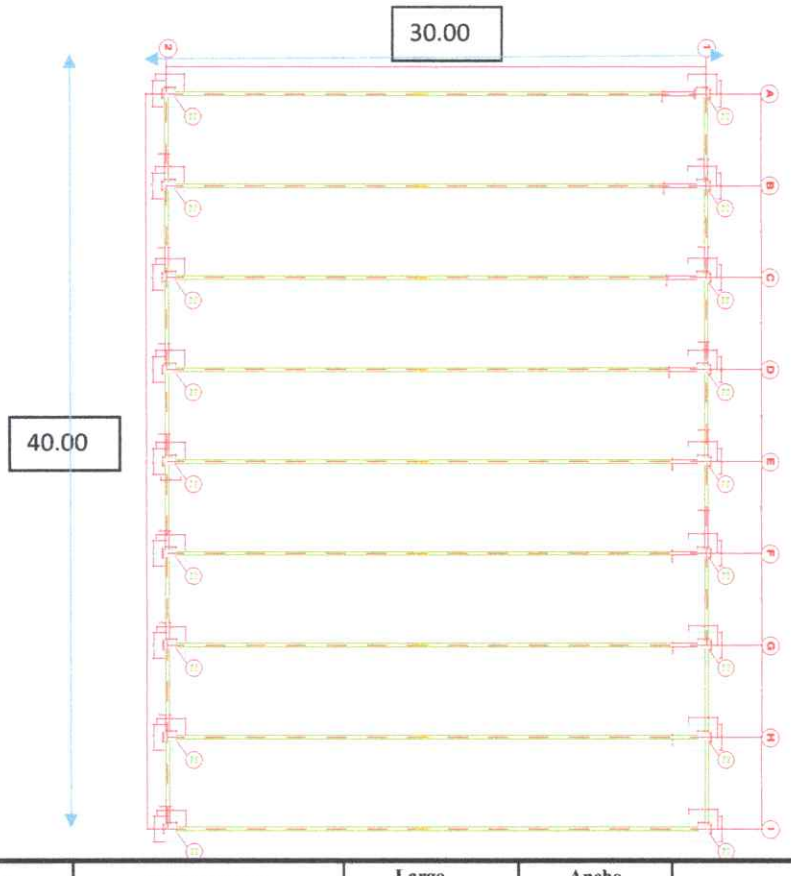

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Delimitación de la obra	CANCHA	30.00			1	30.00	30.00
		40.00			1	40.00	70.00
TOTAL =							70.00

CANTIDAD CONTRACTUAL	160.00	m
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m
EJECUTADO ESTE PERÍODO	70.00	m
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	70.00	m
A COBRAR ESTE PERIODO	70.00	m

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **41.30**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #01 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN :	PARROQUIA PUERTO MURIALDO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-jun-26
CONTRATISTA :	CONSORCIO RIVERSJAZ	**PERIODO DE EJECUCION :**	07-may-26 31-may-26
MONTO	$ 290,455.8100	**PLAZO :**	90 días
FECHA DE SUSCRIPCION :	28-jul-25		

RUBRO: 63 Señalización informativa, de obligacion y prohibición
UNIDAD : u
PRECIO UNITARIO: USD$ 62.39

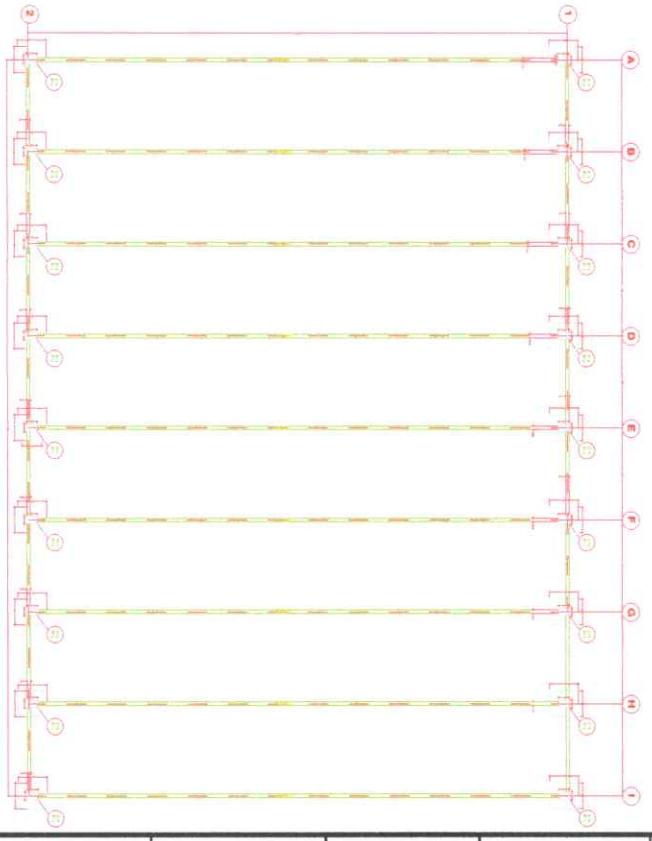

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Señalización informativa, de obligacion y prohibición	**CANCHA**				1	1.00	1.00
TOTAL =							**1.00**

CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00	u
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	u
EJECUTADO ESTE PERÍODO	1.00	u
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	1.00	u
A COBRAR ESTE PERIODO	1.00	u

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 62.39**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

PLANILLA NO2 (AVANCE DE OBRA)

“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO TIEMPO”.

***.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:**	**ING. DALIA SANMARTIN TORRES**
***.- FISCALIZADOR DE CONTRATO:**	**ING. CAROL CARRERA VÉLEZ**
***.- CONTRATISTA:**	**CONSORCIO RIVERSJAZ**
***.- MONTO DE CONTRATO:**	**$ 290,455.810**
***.-PLAZO CONTRATO PRINCIPAL:**	**90 DIAS CALENDARIO**
***.-FECHA DE INICIO CONTRATO**	**07/05/2026**
***.-FECHA DE VENCIMIENTO CONTRATO**	**04/08/2026**
***.-PERIODO:**	**DEL (01/06/2026 al 30/06/2026)**

***ANEXO DE CANTIDADES**

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA DE CONTRATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : **"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".**

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)


UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 10 Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil C, y angulos
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USDS 4.02

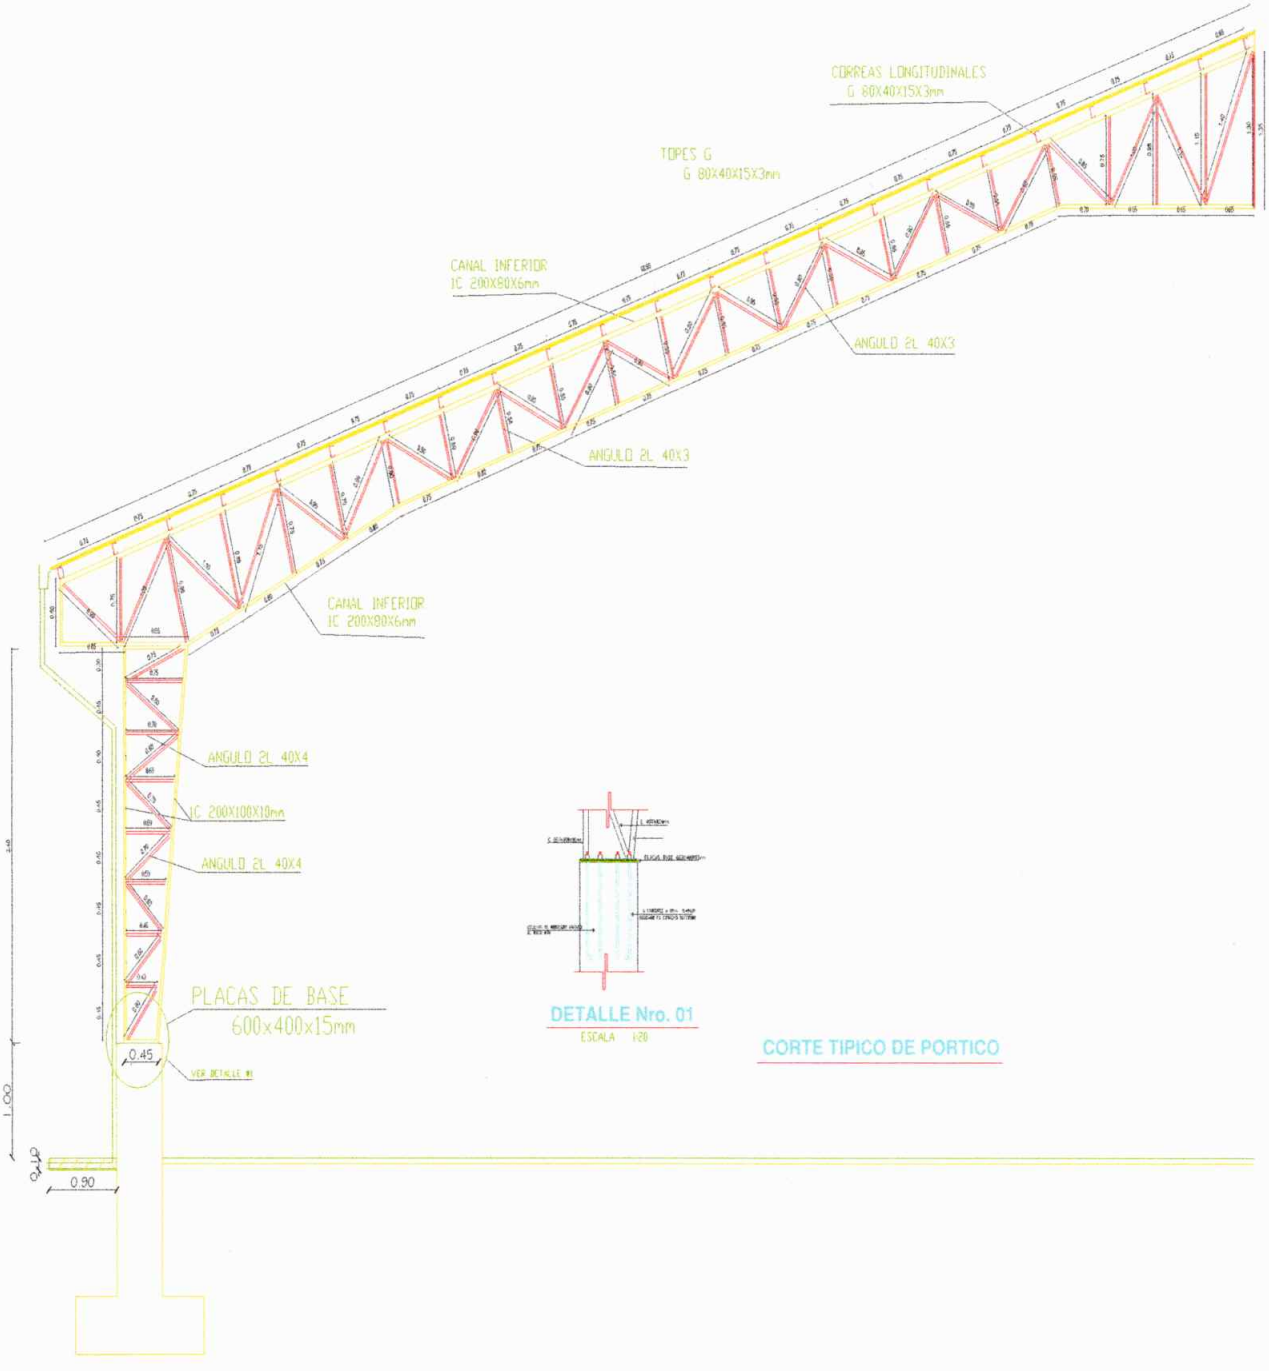

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VELEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 10 Construccion y montaje de super estructura metálica para espacios cubiertos perfil G, perfil C, y angulos
UNIDAD : kg
PRECIO UNITARIO: USD$ 4.02

ELEMENTO	N°	a	b	C	Longitud Parcial	Longitud Total	Peso kg/m.	Peso Total kg.
CERCHAS VIGAS HORIZONTALES .= 18U.								
"C" - SUPERIOR 200x80x6 mm.	9	33.30			33.30	299.70	16.340	4897.10
"C" - INFERIOR 200x80x6 mm.	9	34.10			34.10	306.90	16.340	5014.75
"L" - ANGULO VERTICAL 40x40x3 mm.	9	15.40	15.40		30.80	277.20	1.810	501.73
"L" - ANGULO DIAGONAL 40x40x3 mm.	9	21.45	21.45		42.90	386.10	1.810	698.84
"L" - ANGULO RIGIDIZADOR 40x40x3 mm.	44	0.17			0.17	7.48	1.810	13.54
							Suman Kg.	**11,125.96**
CORREAS LONGITUDINALES.								
"G" - SUPERIOR 80x40x15x3 mm.	46	40.3			40.30	1853.80	4.010	7433.74
"G" - TOPES 80x40x15x3 mm.	414	0.07			0.07	28.98	4.010	116.21
							Suman Kg.	**7,549.95**
PLACAS BASE								
PLACAS BASE 60x40x15mm.	18					18	28.260	508.68
							Suman Kg.	**508.68**
								19,184.59

CANTIDAD CONTRACTUAL	35443.63	kg
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	16259.05	kg
EJECUTADO ESTE PERÍODO	19184.59	kg
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	35443.64	kg
A COBRAR ESTE PERIODO	19184.59	kg

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **77,122.05**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 11 Cubierta de galvalumen prepintado e= 0.40 mm, incluye cumbrero

UNIDAD : m2

PRECIO UNITARIO: USD$ 22.68

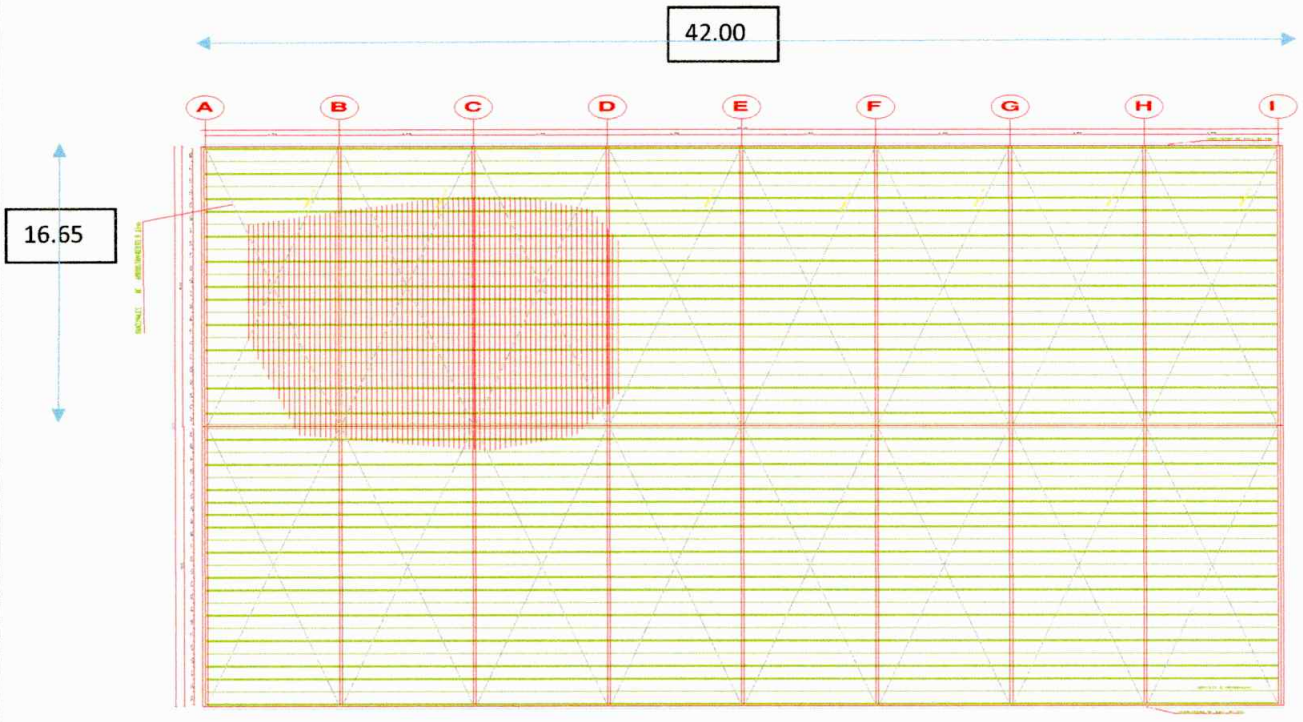

PLANTA DE CUBIERTA

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Cubierta de galvalumen prepintado e= 0.40 mm, incluye	CANCHA	42.00	16.65		2	1398.60	1,398.60
TOTAL =							1,398.60

CANTIDAD CONTRACTUAL	1342.00	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	1,398.60	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	1398.60	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	1398.60	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 31,720.25**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26


MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 18 Cajas de revision (60x60 cm) con tapa de h.a.

UNIDAD : u

PRECIO UNITARIO: USD$ 65.27

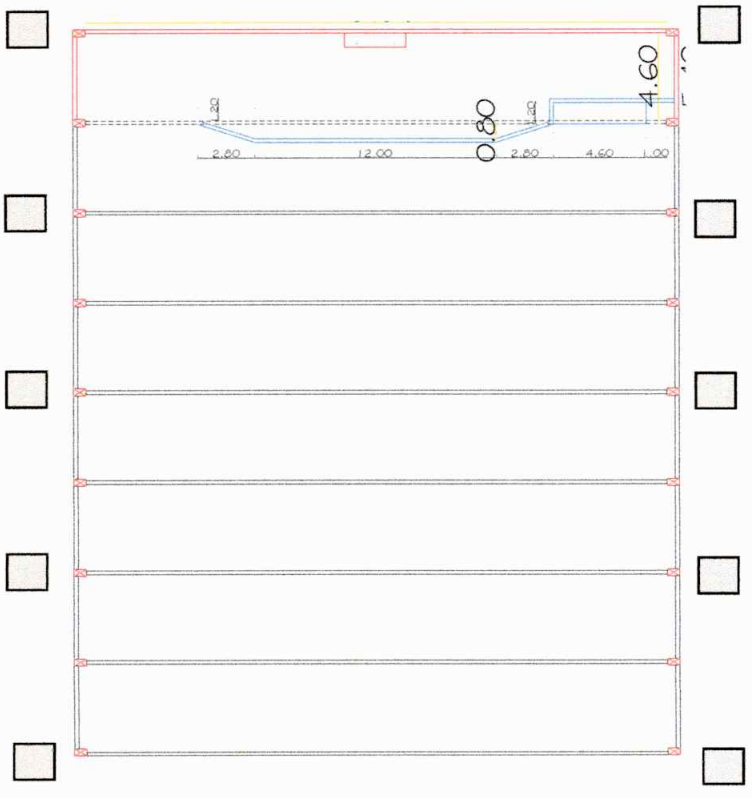

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Cajas de revision (60x60 cm) con tapa de h.a.	CANCHA				10	10.00	10.00
TOTAL =							10.00

CANTIDAD CONTRACTUAL	13.00	u
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	u
EJECUTADO ESTE PERÍODO	10.00	u
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	10.00	u
A COBRAR ESTE PERIODO	10.00	u

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **652.70**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)


UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 19 Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague
UNIDAD : m
PRECIO UNITARIO: USD$ 5.01

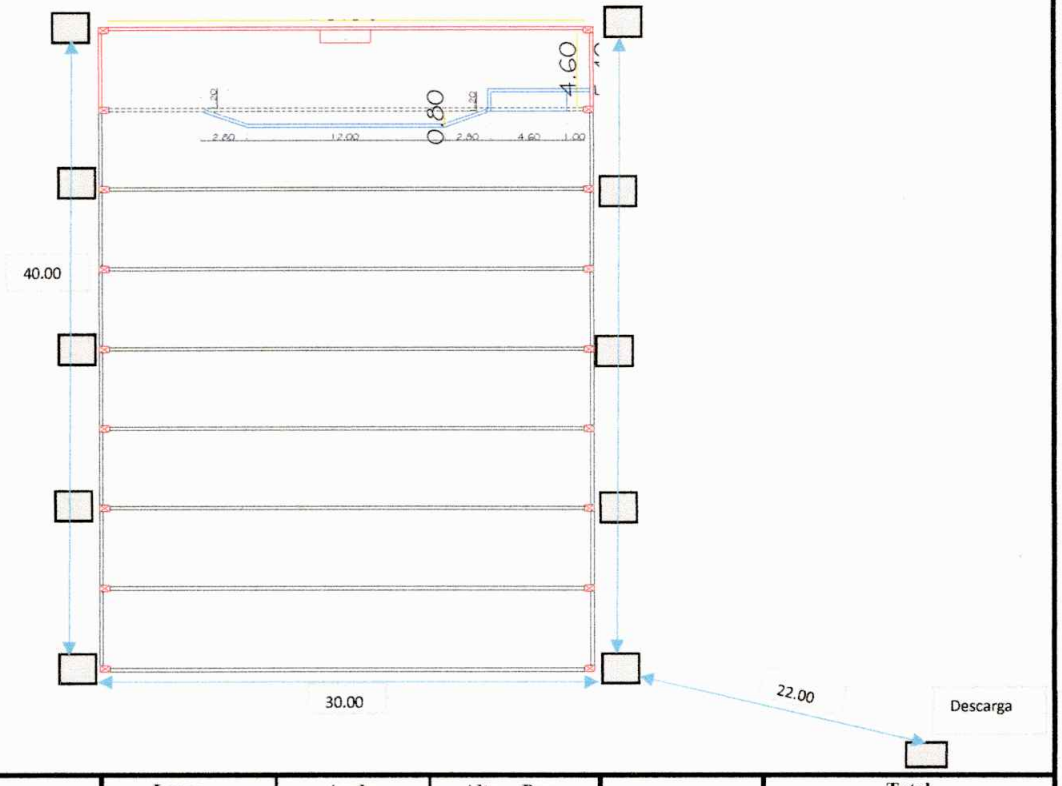

ANEXO	UBICACIÓN	Largo	Ancho	Altura Prom	N°	Total	
		m	m	m		PARCIAL	ACUMULADO
Canalizacion de Tuberia pvc de 110 mm desague	CANCHA ALTAR PATRIO	30.00			1	30.00	30.00
		40.00			2	80.00	110.00
		0.80			-10	-8.00	102.00
		22.00			1	22.00	124.00
TOTAL =							**124.00**

CANTIDAD CONTRACTUAL	80.00	m
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m
EJECUTADO ESTE PERÍODO	124.00	m
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	124.00	m
A COBRAR ESTE PERIODO	124.00	m

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **S** **621.24**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 20 Relleno piedra bola (manual)

UNIDAD : m3

PRECIO UNITARIO: USD$ 30.42

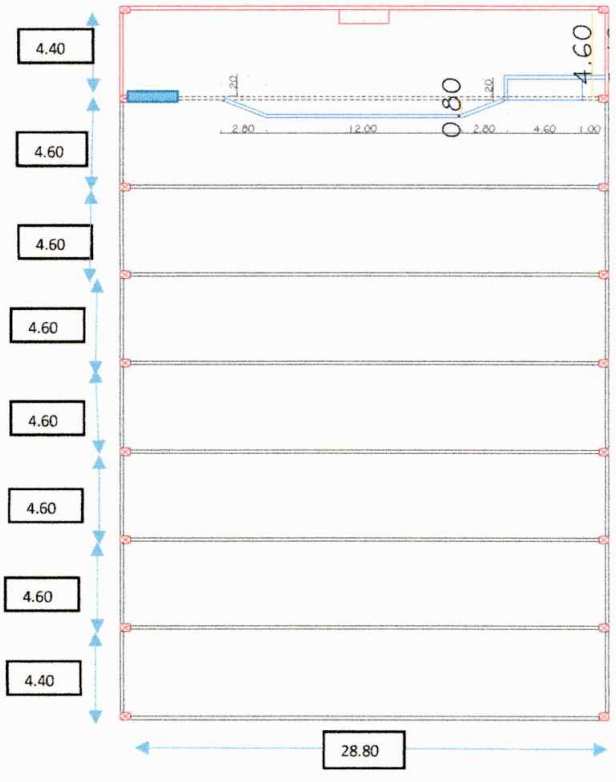



ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Relleno piedra bola (manual)	CANCHA	4.40	28.80	0.20	1	25.344	25.34
		4.40	28.80	0.25	1	31.68	57.02
		4.60	28.80	0.20	3	79.488	136.51
		4.60	28.80	0.25	3	99.36	235.87
TOTAL =							235.87

CANTIDAD CONTRACTUAL	162.00	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	235.87	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	235.87	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	235.87	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 7,175.17**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 25 Bordillo de h.simple f'c=180kg/cm2 (0.30x 0.10cm) inc. encofrado

UNIDAD : m

PRECIO UNITARIO: USD$ 18.31

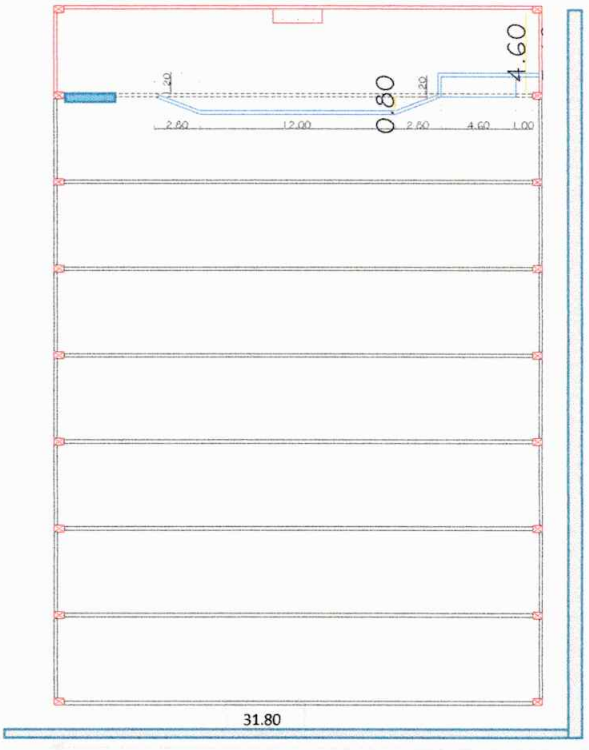

ANEXO	UBICACIÓN	Largo	Ancho	Altura Prom	N°	Total	
		m	m	m		PARCIAL	ACUMULADO
Bordillo de h.simple f'c=180kg/cm2 (0.30x 0.10cm) inc. encofrado	CANCHA	31.80			1	31.80	31.80
		41.00			1	41.00	72.80
TOTAL =							72.80

CANTIDAD CONTRACTUAL	288.00	m
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m
EJECUTADO ESTE PERÍODO	72.80	m
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	72.80	m
A COBRAR ESTE PERIODO	72.80	m

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **1,332.97**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 28 Relleno piedra bola (manual)

UNIDAD : m3

PRECIO UNITARIO: USD$ 30.42

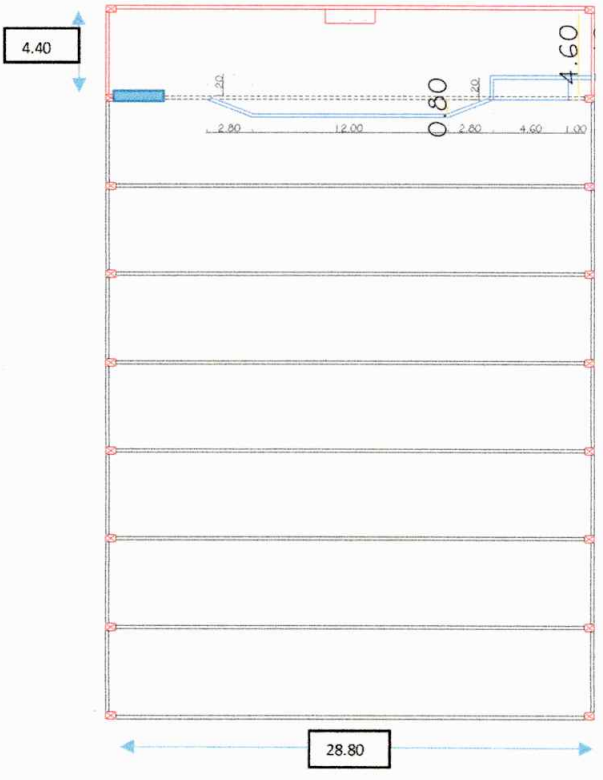



ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Relleno piedra bola (manual)	ALTAR PATRIO	4.40	28.80	0.39	1	49.4208	**49.42**
		12.00	0.80	0.39	1	3.744	53.16
		2.60	0.80	0.39	2	2.08	55.24
TOTAL =							55.24

CANTIDAD CONTRACTUAL	60.00	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	55.24	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	55.24	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	55.24	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **S** **1,680.40**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días


FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 29 Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada

UNIDAD : m2

PRECIO UNITARIO: USD$ 19.97

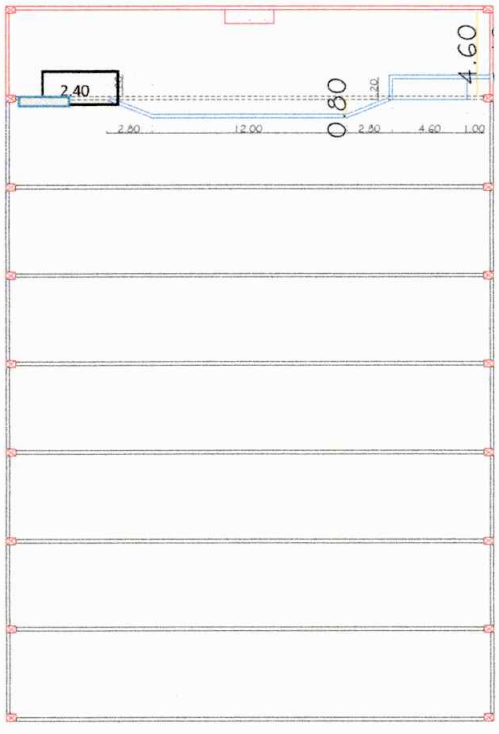

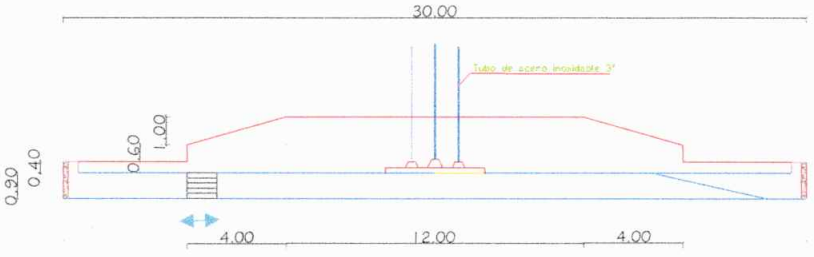

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2 incluye malla electrosoldada	ALTAR PATRIO	30.00	5.00		1	150.00	150.00
		0.60	0.60		-3	-1.08	148.92
		6.30	1.00		-1	-6.30	142.62
		2.40	1.55		-1	-3.72	138.90
		17.20	12.00	1.00	1	29.20	168.10
TOTAL =							**168.10**

CANTIDAD CONTRACTUAL	120.00	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	168.10	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	168.10	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	168.10	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **3,356.96**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 31 Mamposteria bloque liviano e=10 cm

UNIDAD : m2

PRECIO UNITARIO: USD$ 14.39

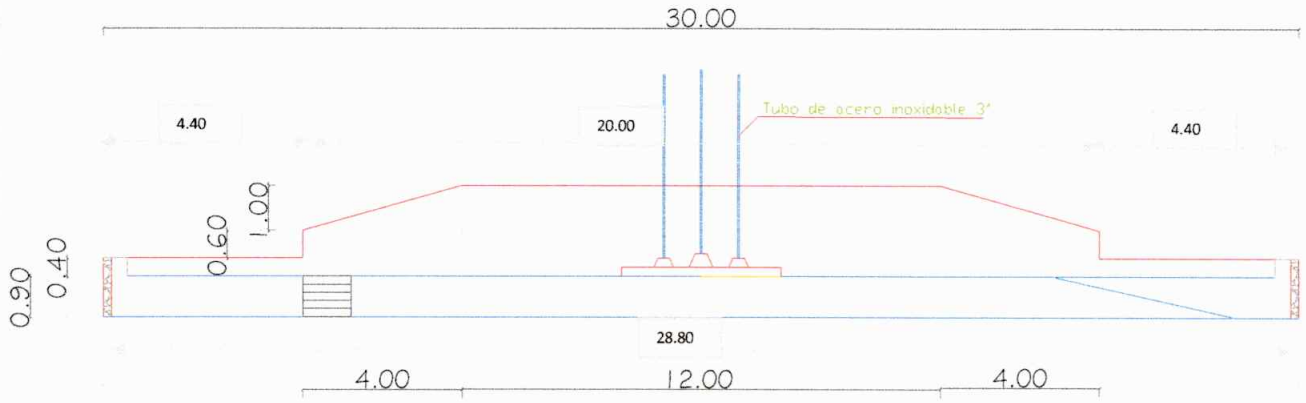

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Mamposteria bloque liviano e=10 cm	ESCENARIO-ALTAR PATRIO	28.80	0.40		1	11.52	11.52
		20.00	0.60		1	12.00	23.52
		4.00		1.00	2	4.00	27.52
		12.00	1.00		1	12.00	39.52
TOTAL =							39.52

CANTIDAD CONTRACTUAL	40.00	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	39.52	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	39.52	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	39.52	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **568.69**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ

PERIODO DE EJECUCION : 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100


PLAZO : 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 32 Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3

UNIDAD : m2

PRECIO UNITARIO: USD$ 7.81

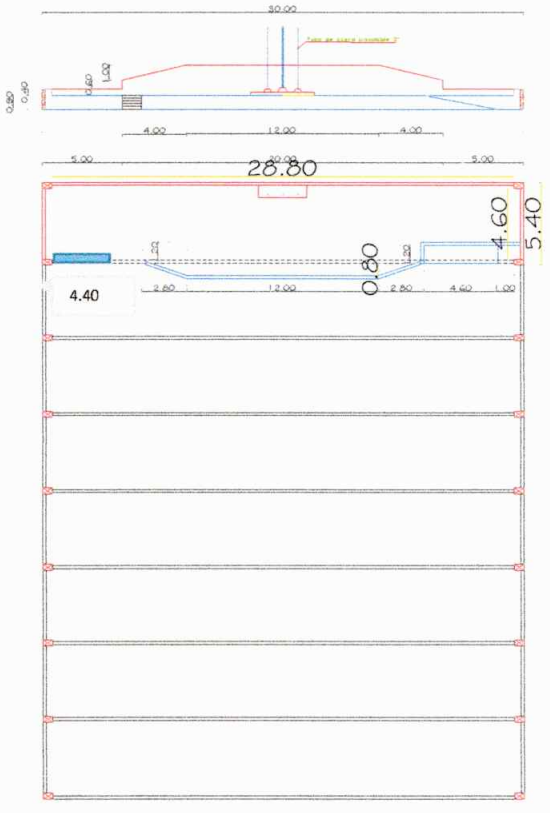

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m	Altura Prom m	N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3	ESCENARIO-ALTAR PATRIO	28.80	0.40		2	23.04	23.04
		20.00	0.60		2	24.00	47.04
		4.00		1.00	4	8.00	55.04
		12.00	1.00		2	24.00	79.04
		30.00	0.80		1	24.00	103.04
		3.20	0.70		1	2.24	105.28
		2.90	0.70		2	4.06	109.34
		12.00	0.70		1	8.40	117.74
		5.60	0.30		1	1.68	119.42
TOTAL =							119.42

CANTIDAD CONTRACTUAL	116.62	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	119.42	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	119.42	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	119.42	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **932.67**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)


UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26

MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 62 Delimitación de la obra
UNIDAD : m
PRECIO UNITARIO: USD$ 0.59

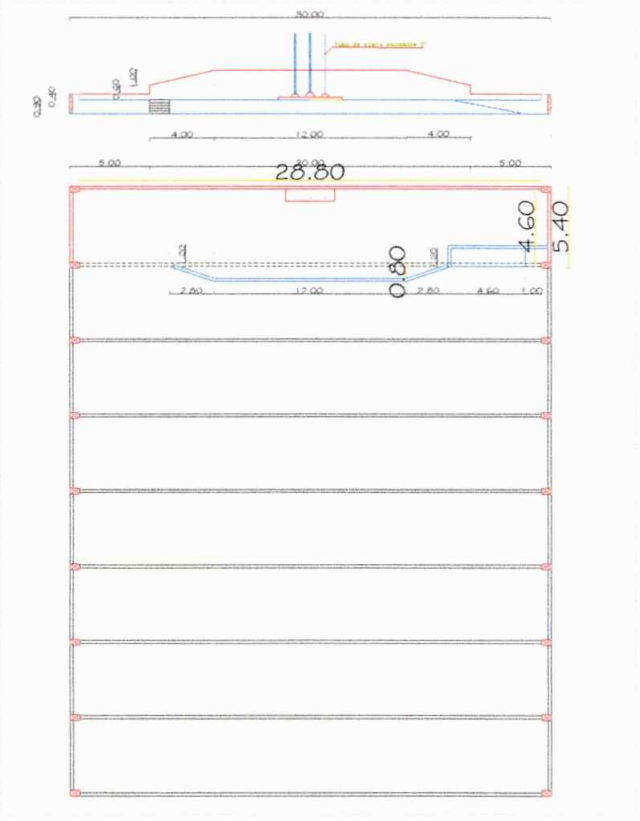

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Delimitación de la obra	CANCHA	20.00			1	20.00	20.00
		30.00			1	30.00	50.00
TOTAL =							50.00

CANTIDAD CONTRACTUAL	160.00	m
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	70.00	m
EJECUTADO ESTE PERÍODO	50.00	m
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	120.00	m
A COBRAR ESTE PERIODO	50.00	m

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **29.50**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

PLANILLA No. #02 (AVANCE DE OBRA)

UBICACIÓN : PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATISTA : CONSORCIO RIVERSJAZ **PERIODO DE EJECUCION :** 01-jun-26 30-jun-26


MONTO $ 290,455.8100 **PLAZO :** 90 días

FECHA DE SUSCRIPCION : 09-jul-25

RUBRO: 63 Señalización informativa, de obligacion y prohibición

UNIDAD : u

PRECIO UNITARIO: USD$ 62.39

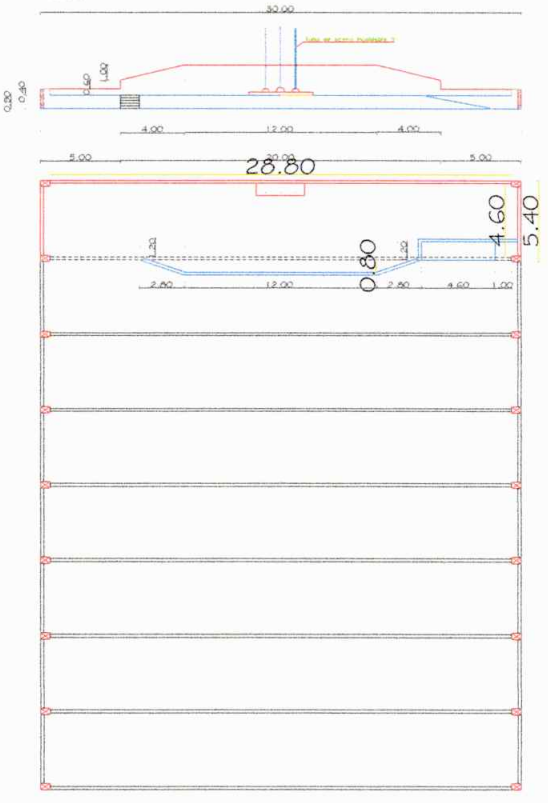

ANEXO	UBICACIÓN	Largo m	Ancho m		N°	Total PARCIAL	Total ACUMULADO
Señalización informativa, de obligacion y prohibición	**CANCHA**				1	1.00	1.00
TOTAL =							**1.00**

CANTIDAD CONTRACTUAL	3.00	u
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	1.00	u
EJECUTADO ESTE PERÍODO	1.00	u
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	2.00	u
A COBRAR ESTE PERIODO	1.00	u

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$** **62.39**

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

ING. JESSICA MOREIRA SORNOZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA

Oficio No. 014-GADML-DOPM-CVCV-2026

Loreto, 20 de abril de 2026

SR. SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL COMPAÑÍA SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CÍA. LTDA.
CONTRATISTA

Ref: NOTIFICACIÓN DE INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS – PROCESO MCO-GADML-2025-04

De mi consideración:

En mi calidad de Administradora del Contrato del proceso de Menor Cuantía de Obras signado con código **MCO-GADML-2025-04**, cuyo objeto es la ejecución de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO"**, me permito comunicar a usted lo siguiente:

Mediante Oficio No. 005-GADML-DOPM-CVCV-2026, de fecha 11 de febrero de 2026, esta Administración de Contrato notificó a su representada que, con fecha 10 de febrero de 2026, se efectuó la acreditación del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, conforme a la información remitida por la Coordinación de Tesorería.

En dicho oficio también se comunicó que no era procedente autorizar el inicio del plazo contractual, debido a que se encontraba en trámite la renovación del Convenio de Cooperación Interinstitucional, instrumento habilitante para la intervención municipal en la institución educativa. En consecuencia, se dispuso que el plazo contractual no se contabilizaría hasta que dicho convenio se encontrara vigente y se emitiera la autorización correspondiente.

Una vez verificada la **vigencia del Convenio de Cooperación Interinstitucional** y conforme a lo establecido en la **Cláusula Séptima – Plazo Contractual** del contrato suscrito, se **autoriza el inicio del plazo de ejecución de la obra a partir del día 21 de abril de 2026**, fecha que constituye el día 1 del plazo contractual.

En consecuencia, el plazo de **60 días calendario** se contará desde la fecha indicada, por lo que **la fecha de finalización de la obra corresponde al 19 de junio de 2026**, debiendo su representada ejecutar las actividades conforme a los planos, especificaciones técnicas, cronograma y demás documentos contractuales.

De igual manera, se reitera lo dispuesto en la **Cláusula Décima Segunda, numeral 12.1**, respecto a la obligación del contratista de cumplir con las disposiciones emitidas por la **Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)**. En tal sentido, deberá remitirse el **Certificado de Cumplimiento UAFE**, requisito indispensable para la continuidad de los trámites administrativos y de ejecución contractual.

Adicionalmente, se solicita a su representada remitir, a la brevedad posible, la siguiente documentación:

- **Formulario 2.1 – Compromiso de cumplimiento de parámetros en etapa contractual**, correspondiente a: equipo mínimo requerido, personal técnico mínimo requerido, experiencia del personal técnico, metodología de ejecución; información necesaria para su revisión y aprobación.
- **Cronograma de trabajos reprogramado**, considerando como fecha de inicio el 21 de abril de 2026, para su respectiva revisión y aprobación.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Carol Valeria Carrera Vélez
SP6 - Analista de Obras Publicas
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

Recibido:

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Segundo Vicente Feijoo Maldonado
Representante legal Compañía Sumaco Construcciones & Servicios SUMACONSTRUCSERV Cía. Ltda.
Contratista

Copia:
Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos
Coordinador de Fiscalización
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO

CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO"

Comparecen a la celebración del presente contrato, por una parte, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, debidamente representado por el señor Kleber Fabián Olalla Torres, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, quien en lo posterior se le denominará "EL CONTRATANTE"; y, por otra parte, la compañía **SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA**, con RUC N° 2293534996001 representado legalmente por el señor Segundo Vicente Feijoo Maldonado, a quien más adelante, para efectos de este contrato se le denominará "EL CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente contrato.

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1.- Con fecha 11 de diciembre del 2024 se suscribe el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO Y EL VICARIATO DE LA PROVINCIA DE NAPO, a fin de intervenir en la ejecución de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".**

1.2.- Se cuenta con el proyecto, Informe de necesidad, planos, especificaciones técnicas, presupuesto referencial y demás información necesaria para la contratación, debidamente aprobados por los funcionarios de las áreas requirentes, para el proyecto de la "**CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO**".

1.3.- Se cuenta con el Compromiso Presupuestario No. 469 de fecha 18 de febrero de 2025 relacionado con la partida presupuestaria Nro. 750107, denominada "**CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO**".

PARTIDAS PRESUPUESTARIA

Dirección	Partida	Nombre	Proyecto	Objeto	Valor
411 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	750107	Construcciones y Edificaciones	Producto : 41175018 - CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO		57.291,68
				Valor	57.291,68

1.4. Mediante Certificación POA Nro. 010-2025, de fecha 18 de febrero de 2025, el Arq. Washington Jaramillo – Director de Planificación, certifica que la obra "**CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA**

ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO", se encuentra planificada y con los recursos disponibles en la Planificación Operativa Anual (POA) 2025.

1.5.- El Licenciado Jaime René Jiménez, Coordinador de Compras Públicas, con fecha 25 de febrero de 2025, mediante certificación PAC 010-2025, **CERTIFICA** que el objeto de contratación denominado: **"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO"**, **SI** consta en el Plan Anual de Constataciones PAC-2025.

1.6.- La máxima Autoridad en base a los Informes emitidos por los profesionales de la Institución Municipal, emite la Resolución Administrativa No. 091-GADML-2025 de fecha 27 de mayo de 2025, resuelve: **(…) Artículo 1.-** *"Autorizar el inicio del procedimiento de Menor Cuantía de Obras* ***MCO-GADML-2025-04****, cuyo objeto de contratación es la* ***CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO,*** *con un presupuesto referencial de* ***USD 57.291,67740 (Cincuenta y Siete Mil Doscientos Noventa y Un dólares con 67740/100000 centavos) de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA****, con un plazo de ejecución de 60 días, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, previamente notificada la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista.* ***Artículo 2.-*** *Aprobar el pliego, cronograma, especificaciones técnicas, presupuesto referencial, forma de pago, plazo de ejecución, informe de necesidad de contratación y todos los documentos de la fase preparatoria del procedimiento de Menor Cuantía de Obras MCO-GADML-2025-04.* ***Artículo 3.-*** *Designar conforme lo dispuesto en el artículo 58 del RGLOSNCP, al Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, con cedula Nro. 1311012338 - Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, y con la Certificación como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública Nro. AHQSuyxfkK de fecha 24 de junio de 2023, para que lleve a cabo las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de oferta, convalidación de errores, calificación de ofertas, recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto y las demás previstas en la LOSNCP y su Reglamento General de aplicación.* ***Artículo 4.-*** *Disponer a la Coordinación de Compras Públicas la publicación de la Resolución de Aprobación de pliegos y toda la documentación relevante del proceso, a través del portal de compras públicas.* ***Artículo 5.-*** *Vigencia. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal institucional del SERCOP".*

1.7.- Se realizó la respectiva convocatoria el 27 de mayo de 2025, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

1.8.- Mediante memorando Nro. GADMCL-CCP-2025-0468-M-GD de fecha 09 de junio de 2025, el Licenciado Jaime René Jiménez Rimacuna - Coordinador de Compras Públicas, remite al Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, técnica responsable de llevar a cabo la fase precontractual, en el cual remite **CINCO OFERTAS TECNICAS** en formato MFC-USHAY presentadas a través del portal de compras públicas.

Nro.	Oferente	Contenido de la oferta
1	GALLARDO ORELLANA ALEXANDER PATRICIO	4 archivos formato USHAY tamaño: 19,7 MB (20.690.363 bytes)
2	CHAVEZ CAMACHO ALONSO	3 archivos formato USHAY tamaño: 16,2 MB (17.001.279 bytes)
3	HEREDIA GRESELI HENRY SOCRATES	3 archivos formato USHAY tamaño: 16,1 MB (16.901.201 bytes)
4	NOVOA BENAVIDES JORGE SERGIO ARMANDO	1 archivo formato USHAY tamaño: 7,17 MB (7.529.161 bytes)
5	SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.	3 archivos formato USHAY tamaño: 14,6 MB (15.407.495 bytes)

1.9.- Mediante ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS, de fecha 09 de junio de 2025, el Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, técnica responsable de llevar a cabo la fase precontractual, signado con código MCO-GADML-2025-04, en el numeral 6. **CONCLUSIÓN,** hace constar lo siguiente: *"Una vez que se ha revisado, analizado y calificado la documentación de las ofertas presentadas durante el proceso de evaluación y calificación, se pone a consideración de la Máxima Autoridad el Acta de Evaluación y Calificación del proceso de* ***MENOR CUANTÍA DE OBRAS*** *signado con el código No.* ***MCO-GADML-2025-04****, cuyo objeto de contratación es la "****CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO****"; concluyendo que los oferentes:* ***JORGE SERGIO ARMANDO NOVOA BENAVIDES****; CED:* ***0400577466001*** *y* ***SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.****; RUC:* ***2293534996001****, cuyo* ***REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO****, con CEDULA:* ***0701988412****, CUMPLEN con todos los requerimientos establecidos en el pliego publicado en el procedimiento signado con el código* ***MCO-GADML-2025-04…".***

1.10.- Mediante memorando Nro. GADMCL-CCP-2025-509-M-GD de fecha 19 de junio de 2025, el Lcdo. Jaime René Jiménez Rimacuna, Coordinador de Compras Públicas, informó al responsable de la etapa precontractual del procedimiento de contratación, el resultado del sorteo y en su parte pertinente señaló lo siguiente: *"Para efecto de lo señalado y en cumplimiento con lo establecido en el artículo y numeral 14 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con lo establecido en el artículo 6 numeral 1.3 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública -SNCP; es necesario que presenten a la máxima autoridad el "Informe de evaluación de las ofertas en el que se recomiende a la máxima autoridad la adjudicación o la declaratoria de desierto, según corresponda…".*

Oferente ganador del sorteo:

Proveedor	Cantidad Adjudicada	Precio Unitario	Subtotal	Tiempo de Entrega	Razón Adjudicación	Estado
SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA. 2293534996001	1	USD 57,291.68	USD 57,291.68	60	Proveedor ganador en el Sorteo MC-Obras con estos productos	Seleccionado para adjudicar

1.11.- Mediante INFORME DE RESULTADOS, EVALUACION Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN de fecha 19 de junio de 2025, el Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, técnica responsable de llevar a cabo la fase precontractual, en lo pertinente recomendó "…*En calidad de DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL nombrado por la Máxima Autoridad; RECOMIENDA adjudicar a* ***SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.;*** *RUC:* ***2293534996001,*** *cuyo REPRESENTANTE LEGAL:* ***SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO****, con CEDULA:* ***0701988412****, el contrato del proceso de Menor Cuantía de Obra No.* ***MCO-GADML-2025-04****, para la obra "****CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO****" por un monto de USD $* ***57.291,677*** *dólares de Estados Unidos de América (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO, CON 67740/100000 CENTAVOS), sin incluir el IVA, con un plazo de 60 (SESENTA DÍAS CALENDARIO), contados a partir de la entrega del Anticipo, por haber cumplido con los requisitos generales y específicas de los pliegos.*

1.12.- Luego del proceso correspondiente la máxima Autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, en base al Informe de Recomendación de adjudicación emitido por la profesional responsable de las etapa precontractual y demás documentos que sustentaron para llevar a efecto el procedimiento de Menor Cuantía de Obras, signado con el código **MCO-GADML-2025-04,** emitió la **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 124-GADML-2025 ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA DE OBRAS CODIGO MCO-GADML-2025**-04, de fecha 19 de junio de 2025, adjudicando el contrato para la "**CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO**, al oferente **SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA**, con RUC: **2293534996001**, por el valor de **USD 57.291,67740 (CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 67740/100000 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, sin incluir el IVA**, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de **60 días**, contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato, para ello se deberá notificar previamente la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria del contratista, por haber cumplido con los aspectos técnicos, legales y económicos establecidos en los pliegos.

1.13.- Mediante Oficio N° 10863, de fecha 24 de marzo del 2025, el Abg. Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, absuelve la consulta realizada por la Empresa pública Metropolitana de agua Potable de Quito, y en el numeral 3 manifiesta: ***"…Pronunciamiento, en el primer párrafo dice lo siguiente: "En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con los artículos 69 de la LOSNCP y 257 de su Reglamento General, el acto administrativo de adjudicación deberá causar estado antes de proceder a la suscripción en el portal COMPRAS PUBLICAS, periodo durante el cual los interesados pueden presentar impugnaciones. Una vez que la adjudicación ha causado estado, el adjudicatario tiene un término de quince días para suscribir el contrato. En caso de que el adjudicatario sea compromiso de consorcio o asociación, se le concede un término adicional de quince días, para la formalización del contrato. El adjudicatario podrá solicitar una ampliación del término para la suscripción del contrato antes de que este venza, siempre que justifique la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, dicha ampliación no podrá exceder de siete días y, bajo ninguna circunstancia, podrá otorgarse una prórroga sobre un término ya vencido".***

1.14.- De conformidad al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 18, inciso tercero, en la parte pertinente dicen "…*En los procedimientos de contratación donde sea necesario estar registrado y habilitado en el RUP para participar, las entidades contratantes verificarán esta condición de los oferentes exclusivamente en la fecha y hora de: 1) apertura de ofertas: y, 2) suscripción del contrato…*", disposición legal que se da cumplimiento con la constancia mediante las capturas de pantallas que se adjunta a continuación y de la cual se constata que se encuentran debidamente habilitados en el RUP.



CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- Los que acrediten la calidad de los comparecientes;
- Pliego, Condiciones Generales y Particulares incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación;
- Oferta presentada por el oferente adjudicado.
- Certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;
- Resolución Administrativa de Aprobación de Pliegos;
- Resolución de Adjudicación;
- Pago de pliegos, certificado de no adeudar al Municipio, timbre;

- Garantía presentada por el contratista del 50% de anticipo; y,
- Los demás documentos que en virtud de la legislación vigente se requiere para formalización del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

3.1.- El Contratista, se obliga con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, a ejecutar, terminar y entregar a entera satisfacción de la entidad contratante la obra denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO",** se compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujeción a su oferta, planos, especificaciones técnicas generales y particulares de la obra, anexos, condiciones generales del contrato de ejecución de obra, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales y respetando la normativa legal aplicable, dentro del proceso constructivo de la obra, se deberá ejecutar los siguientes rubros constante en la siguiente tabla de cantidades y precios:

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

NUMERO	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	Derrocamiento de mampostería	m2	0,09	7,72	0,6948
2	Retiro de pieza sanitaria	u	5	10,79	53,95
3	Retiro de cerámica en piso/paredes	m2	6	4,52	27,12
4	Derrocamiento de hormigón (meson lavamanos)	m3	0,38	8,34	3,1692
5	Picado en piso y paredes	m2	6	7,88	47,28
6	Desalojo material	m3	1	9,25	9,25
7	Cerámica de pared en baño	m2	4	22,02	88,08
8	Cerámica de piso 43x43 cm, antideslizante	m2	3	25,63	76,89
9	Picado y resane en pared para instalaciones	m	14	3,94	55,16
10	Punto desague pvc aass 50 mm	pto	5	15,72	78,6
11	Canalizacion tuberia pvc 75 mm	m	6	6,77	40,62
12	Inodoro blanco- incluye accesorios	u	5	114,65	573,25
13	Urinario economico inc. Accesorios	u	2	90,86	181,72
14	Punto pvc-p roscable 1/2" agua	pto	4	20,45	81,8
15	Llave de paso 1/2"	u	2	12,36	24,72
16	Mesón de hormigón armado para lavabos inc. placa de granito.	m	6	158,35	950,1
17	Lavamanos empotrable 1 llave (provisión, montaje y grifería)	u	7	95,24	666,68
18	Limpieza, masillado e impermeabilizante de losa	m2	35,84	9,14	327,5776
19	Separadores de aluminio y alucobond	m2	0,6	104,33	62,598

20	Puerta de aluminio y alucobond	u	5	197,62	988,1
21	Tratamiento de hongos y humedad en losas y paredes	m2	22,85	3,2	73,12
22	Derrocamiento de acera e=7 cm	m2	3	7,88	23,64
23	Acera de h.s. f'c=180 kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	8	17,8	142,4
24	Pintura anticorrosiva para protectores metálicos	m2	5,04	5,02	25,3008
25	Mantenimiento de puerta tool	u	2	59,1	118,2
26	Caja de revisión 60x60 cm	u	3	72,04	216,12
27	Excavación para cimientos a maquina	m3	17,98	17,28	310,6944
28	Tuberia de pvc para desague de 4"	m	1,52	7,1	10,792
29	Tuberia de pvc para desague de 2"	m	0,5	5,59	2,795
30	Tuberia de drenaje de pvc perforada de 4"	m	6,9	8,32	57,408
31	Relleno con material (ripio)	m3	1,37	39,64	54,3068
32	Geotextil no tejido	m2	20,52	5,2	106,704
33	Suministro e instalación de biodigestor de1300 lt (inc. Caja de lodos y accesorios)	u	1	821,53	821,53
34	Relleno con material petreo compactado	m3	7,3	18,66	136,218
35	Retiro de juegos infantiles existentes	u	4	10,97	43,88
36	Replanteo y nivelación	m2	86,49	1,19	102,9231
37	Excavación manual en suelo natural	m3	17,29	8,84	152,8436
38	Compactación manual en suelo natural	m2	86,49	3,88	335,5812
39	Colchón de arena	m3	8,64	8,45	73,008
40	Suministro e instalación de cespéd sintetico	m2	86,49	10,97	948,7953
41	Bordillo de h.s. incluye encofrao fç= 180 kg/cm2 (0.10x0.30)	m	37,2	22,87	850,764
42	Suministro e instalación de un juego infaltil completo (resbaladera+columpio+pasamanos)	u	1	4.810,74	4.810,74
43	Suministro e instalación de sube y baja triple	u	2	1.090,75	2.181,50
44	Replanteo y nivelación	m2	94,09	1,19	111,9671
45	Excavación manual en suelo natural	m3	1,55	8,84	13,702
46	Hormigón ciclopeo 40 porciento piedra fç= 180 kg/cm2	m2	2,32	160,74	372,9168
47	H. simple en cadenas, riostras, dinteles fç=210 kg/cm2 + encofrado	m	1,55	230,16	356,748
48	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	Kg	248,8	2,41	599,608
49	Suministro de tubo h.g. poste 2" inc. Suelda y pintura	m	108	7,8	842,4
50	Instalación y provisión de malla galvanizada h=2m	m	77,6	13,04	1.011,90
51	Suministro e instalación de alambre de puas	m	116,4	1,33	154,812
52	Suministro e instalación de picaporte para puerta principal	u	1	31,72	31,72

53	Retiro de puerta de madera	u	1	5,94	5,94
54	Mampostería bloque liviano e=15 cm	m2	2	15,98	31,96
55	Enlucido vertical (paleteado) mortero 1:3	m2	4	8,54	34,16
56	Empaste interior/exterior	m2	4	4,2	16,8
57	Derrocamiento de mampostería	m2	2,76	7,72	21,3072
58	Enlucidos de filos y fajas	m	1,5	4,14	6,21
59	Suministro e instalación de puerta enrrollable	u	1	541,33	541,33
60	Suministro e instalación de griferia tipo cuello de ganzo	u	1	28,37	28,37
61	Tuberia pvc de 110 mm desague	m	20	19,56	391,2
62	Caja de revisión 60x60 cm	u	4	72,04	288,16
63	Retiro de cubierta y estructura metálica	m2	54	1,33	71,82
64	Pintura para correas y perfiles metalicos	m	146	2,5	365
65	Cubierta de galvalumen e=0.40 mm incluye cumbrero	m2	54	20,02	1.081,08
66	Mantenimiento de puerta de madera (pintura y laca)	u	1	53,34	53,34
67	Picado de piso	m2	42	3,85	161,7
68	Ceramica de piso rectangular 25x30cm, antideslizante	m2	42	24,92	1.046,64
69	Barrederas de ceramica h=10 cm	m	25	4,4	110
70	Retiro de cubierta y estructura metálica	m2	134,85	1,33	179,3505
71	Estructura metalica, construcción y montaje	Kg	1.344,94	4,4	5.917,74
72	Cubierta de galvalumen e=0.40 mm incluye cumbrero	m2	134,85	20,02	2.699,70
73	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32)	m	31	12	372
74	Bajantes de aguas lluvias (pvc 4")	m	24	10,19	244,56
75	Retiro de puerta metalica	u	2	6,79	13,58
76	Mampostería bloque liviano e=15 cm	m2	6,5	15,98	103,87
77	Enlucido vertical (paleteado) mortero 1:3	m2	13	8,54	111,02
78	Empaste interior/exterior	m2	13	4,2	54,6
79	Derrocamiento de mampostería	m2	2,2	7,72	16,984
80	H. simple en cadenas, riostras, dinteles fç=210 kg/cm2 + encofrado	m	0,04	230,16	9,2064
81	Enlucidos de filos y fajas	m	6	4,14	24,84
82	Protectores de varilla cuadrada-pintados	m2	24,7	69,73	1.722,33
83	Puerta de tol 2 hojas (1x2m)	u	2	241,8	483,6
84	Pintura para correas y perfiles metalicos	m	146	2,5	365
85	Retiro de cubierta y estructura metálica	m2	54	1,33	71,82
86	Cubierta de galvalumen e=0.40 mm incluye cumbrero	m2	54	20,02	1.081,08
87	Puerta de tol 2 hojas (1x2m)	u	1	241,8	241,8

88	Pintura para correas y perfiles metalicos	m	399	2,5	997,5
89	Retiro de cubierta y estructura metálica	m2	270	1,33	359,1
90	Cubierta de galvalumen e=0.40 mm incluye cumbrero	m2	270	20,02	5.405,40
91	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32)	m	60	12	720
92	Bajantes de aguas lluvias (pvc 4")	m	32	10,19	326,08
93	Caja de revisión 60x60 cm	u	8	72,04	576,32
94	Canalizacion tuberia pvc 110 mm	m	55	7,56	415,8
95	Mantenimiento de puerta tool	u	3	59,1	177,3
96	Derrocamiento de acera e=7 cm	m2	19	7,88	149,72
97	Excavación manual en suelo natural	m3	0,76	8,84	6,7184
98	Hormigón ciclopeo 40 porciento piedra fç= 180 kg/cm2	m2	1,9	160,74	305,406
99	Acera de h.s. f'c=180 kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	19	17,8	338,2
100	Derrocamiento de acera e=7 cm	m2	27	7,88	212,76
101	Excavación manual en suelo natural	m3	3,24	8,84	28,6416
102	Hormigón ciclopeo 40 porciento piedra fç= 180 kg/cm2	m2	8,1	160,74	1.301,99
103	Acera de h.s. f'c=180 kg/cm2 e=7cm-escobillado	m2	27	17,8	480,6
104	Relleno con material petreo compactado	m3	12,96	18,66	241,8336
105	Acometida eléctrica (cable 3x4)	m	80	7,18	574,4
106	Tablero de control de 2 puntos (incluye breakers)	u	9	49,73	447,57
107	Puntos de iluminación	pto	32	40,42	1.293,44
108	Punto de tomacorrientes	pto	16	35,2	563,2
109	Pintura látex vinil acrilica interior/exterior	m2	1.212,00	4,1	4.969,20
				TOTAL	**57291,67740**

3.02.- En la ejecución de la obra se utilizarán materiales de primera calidad, utilizando las más avanzadas técnicas, con los métodos más eficientes y eficaces, con utilización de mano de obra altamente especializada y calificada, tanto al CONTRATISTA como sus trabajadores, emplearán diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa leve.

3.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligación del CONTRATISTA ejecutar conforme a las especificaciones técnicas, cronograma y todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en la oferta y que constituye parte integrante del contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- PRECIO DEL CONTRATO

4.1.- El precio del contrato, que el CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA es por el valor de **USD 57.291,67740 (Cincuenta y siete Mil Doscientos Noventa y Un dólares con 67740/10000 centavos) sin incluir el IVA.**

4.2.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación a la contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar.

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:

5.1.- La CONTRATANTE, otorgará un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, en dólares de los Estados Unidos de América.

5.2.- El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

5.3.- El valor restante de la obra, esto es el cincuenta por ciento (50%), se cancelará mediante pago contra presentación de **PLANILLAS MENSUALES**, debidamente aprobadas por la Fiscalización y autorizada por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato. El monto del anticipo entregado por la Entidad será devengado proporcionalmente al momento del pago de cada planilla hasta la terminación del plazo contractual inicialmente estipulado y constará en el cronograma pertinente que es parte del contrato.

5.4.- El contratista preparará la planilla **MENSUAL**, la cual se pondrán a consideración de la fiscalización en los 5 días de cada periodo **MENSUAL**, y serán aprobadas por ella en el término de 10 días, luego de lo cual, en forma inmediata, se continuará con el trámite de autorización del Administrador del Contrato y solo con dicha autorización se procederá al pago.

5.5.- Las planillas serán preparadas siguiendo el orden establecido en el Formulario de la Oferta y se adjuntarán los anexos de medidas, ensayos de suelos y materiales, aprobaciones y otros que correspondan.

5.6.- Además, el contratista presentará con las planillas el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicará, para cada concepto de trabajo, el rubro, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor de los trabajos ejecutados hasta el periodo MENSUAL anterior, y en el período en consideración, y la cantidad y el valor de los trabajos ejecutados acumulado hasta la fecha. Estos documentos se elaborarán según el modelo preparado por la fiscalización y serán requisito indispensable para tramitar la planilla correspondiente.

5.7.- En cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador o la unidad de control de cada obra, calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en el contrato. En el caso de aplicar el reajuste de precios, se establecerá como fecha de partida -sub cero-, la correspondiente a los treinta (30) días anteriores de la fecha límite de presentación de las ofertas.

5.8.- El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC.

5.9.- Requisito previo al pago de la planilla.- Previamente al pago de la planilla LA CONTRATISTA presentará el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS, Sin este requisito la CONTRATANTE no realizará pago alguno conforme lo determinado en los artículos 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social excepto que sus empleados y trabajadores estuvieren bajo otro régimen legal de contratación.

5.10.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el Contrato.

5.11.- Previo al trámite de pago de la planilla de avance de la obra, la Contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio de hormigones y muestras que solicite el Administrador del Contrato de ser el caso.

5.12.- En todo contrato en que se contemple la entrega de anticipo, la entidad contratante entregará el anticipo en el término máximo de quince (15) días contados desde el día siguiente de la fecha de suscripción del contrato, conforme lo determinado en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, disposición que para el presente proceso de contratación no aplica.

5.13.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios competentes el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS:

6.1.- De conformidad con el artículo 75 de la LOSNCP, el Contratista ha rendido la siguiente garantía:

6.2.- Garantía del buen uso del anticipo, otorgado mediante Póliza No. 1212420 emitida por la ASEGURADORA DEL SUR C. A., misma que respalda el 100% del valor. En caso que el anticipo sea reajustado el valor de la garantía será igual al valor del anticipo reajustado. Esta garantía se reducirá en la medida que se amortice el anticipo, hasta su total cancelación.

6.3.- La garantía del anticipo se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciba provisionalmente la obra, hasta su cancelación. De no renovar las garantías por lo menos cinco días antes de su vencimiento, la Contratante las hará efectivas, sin más trámite.

6.4.- La garantía entregada se devolverá de acuerdo a lo establecido en el artículo 263 del RGLOSNCP, entre tanto, deberá mantenerse vigente, lo que será vigilado y exigido por la entidad CONTRATANTE a través del titular de Tesorería.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- PLAZO

7.1.- El plazo establecido para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de **sesenta (60) días**, contados partir del día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto de la disponibilidad del anticipo.

CLÁUSULA OCTAVA.- PRÓRROGAS DE PLAZO:

8.1.- El GAD Municipal de Loreto, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos y siempre que el CONTRATISTA así solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

8.2.- Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por el GAD Municipal de Loreto. El Contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas.

8.3.- Por suspensión ordenadas por el GAD Municipal de Loreto, y que no se deban a causas imputables al CONTRATISTA.

CLÁUSULA NOVENA. – MULTAS

9.1.- Por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, se aplicará la multa del 1 x 1.000, de acuerdo al Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

CLAUSULA DECIMA. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS

10.1.- En el caso de producirse variaciones en los costos de los componentes de los precios unitarios estipulados en este contrato, los costos se reajustarán, para efectos de pago del anticipo y de las planillas de ejecución de obra, desde la fecha de variación, mediante la aplicación de las siguientes formulas:

FORMULA POLINOMICA

DESCRIPCION DE SIMBOLOS Y FORMULA DE REAJUSTE

SIMBOLO	DESCRIPCION	COSTO DIRECTO	COEFICIENTE
A	ACERO EN BARRAS	14.327,27	0,058
B	MANO DE OBRA	64.578,00	0,260
C	CEMENTO PORTLAND	10.940,17	0,044
D	PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO	48.809,65	0,196
E	INSTALACIONES ELECTRICAS	1.886,50	0,008
G	LÁMINAS Y PLANCHAS GALVANIZADAS PREPINTADAS MOLDEADAS (CUBIERTAS Y RECUBRIMIENTOS)	18.578,76	0,075
P	MATERIALES PÉTREOS	11.032,56	0,044
Q	EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION VIAL	40.669,42	0,164
R	PINTURAS AL LATEX	14.509,93	0,058
S	INSTALACIONES SANITARIAS	1.002,60	0,004
X	COMPONENTE NO PRINCIPAL	22.204,10	0,089
		248.538,96	**1,000**

Pr=Po(0.058 A1/Ao + 0.260 B1/Bo + 0.044 C1/Co + 0.196 D1/Do + 0.008 E1/Eo + 0.075 G1/Go + 0.044 P1/Po + 0.164 Q1/Qo + 0.058 R1/Ro + 0.004 S1/So + 0.089 X1/Xo)

EN DONDE:

Pr = Valor reajustado del anticipo o de la planilla.

Po = Valor del anticipo o de la planilla calculada con las cantidades de obra ejecutado a los precios unitarios contractuales descontada la parte proporcional del anticipo, de haberlo pagado.

Bo = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes treinta días antes de la fecha de cierre para la presentación de la oferta que constará en el contrato.

B1 = Sueldos y salarios minimos de una cuadrilla tipo, fijados por Ley o Acuerdo Ministerial para las correspondientes ramas de actividad, más remuneraciones adicionales y obligaciones patronales de aplicación general que deban pagarse a todos los trabajadores en el país, exceptuando el porcentaje de la participación de los trabajadores en las utilidades de empresa, los viaticos, subsidios y beneficios de orden social: esta cuadrilla tipo estará conformada en base a los análisis de precios unitarios de la oferta adjudicada, vigentes a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Co,Do,Eo…Zo= Los precios o índices de precios de los componentes principales vigentes 30 días antes de la fecha de cierre para la presentación de las ofertas, fecha que constará en el contrato.

C1,D1,E1…Z1= Los precios o índices de precios de los componentes principales a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

Xo = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el indice de precios al consumidor treinta días antes de la fecha de cierre de la presentación de las ofertas, que constará en el contrato.

X1 = Indice de componentes no principales correspondiente al tipo de obra y a la falta de este, el indice de precios al consumidor a la fecha del pago del anticipo o de las planillas de ejecución de obra.

CUADRILLA TIPO

DESCRIPCION	COST.DIRECT.	SRH	#HOR./HOM.	COEF.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	17.079,14	4,75	3.595,61	0,243
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	20.533,69	4,28	4.797,59	0,325
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	26.965,17	4,23	6.374,74	0,432
	64.578,00		**14.767,94**	**1,000**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACIÓN:

11.1.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78 de la LOSNCP, la subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 266 del Reglamento General de la misma.

11.2.- LA CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO

12.1 La máxima Autoridad designa, a la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, con cédula Nro. 1315120483, Analista de OO.PP; y, con Certificado como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública Nro. hJYH8NpRhf de fecha 18 de enero del 2025; o quien haga sus veces, como Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los artículos 295 hasta el 303 de su Reglamento General; dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículo 41.1 y 41.3 de la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica; y, si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá exigir el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en referida fase por parte del Administrador de Contrato.

12.2.- El contratante podrá cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

12.3.- Las atribuciones del Administrador del Contrato conforme lo determinado en el artículo 303 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son las siguientes:

1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;
2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo componen;
3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato;
4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso;
5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde el

control y custodia de las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero;

6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;
7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;
8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;
9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución contractual;
10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;
11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;
12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;
13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;
15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;
16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista, la recepción del mismo;
17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;

18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;
19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra formalizada;
20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,
21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.

12.4.- La máxima Autoridad designa, al Ing. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS, con cedula de ciudadanía Nº 1307017796, Coordinador de Fiscalización, como Fiscalizador de la Obra, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato conforme lo determinado en la Norma de Control Interno 408-18 emitido por el Contralor General del Estado.

12.5.- El contratante ya sea de oficio o a petición del contratista por razones debidamente motivadas o fundamentadas y debidamente comprobadas, podrá cambiar de Fiscalizador de la Obra, para lo cual bastará notificar al contratista un ejemplar del acto administrativo emitido por la máxima autoridad ejecutiva de la institución con copia al Administrador del contrato.

12.6.- Las atribuciones del Fiscalizador de la Obra conforme lo determinado en Norma de Control Interno 408-18 emitido por el Contralor General del Estado, son las siguientes:

a) Revisar en conjunto con el jefe de fiscalización los documentos contractuales con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción de la obra y de presentarse este caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente.
b) Evaluar mensualmente el grado de cumplimiento del programa de trabajo en el área bajo su cargo y en caso de constatar desviaciones identificar las causas y proponer soluciones para corregir la situación.
c) Ubicar en el terreno las referencias necesarias para la correcta ejecución de la obra.
d) Verificar la exactitud de las cantidades incluidas en las planillas presentadas por el contratista solicitando los respectivos respaldos; además, calcular los reajustes correspondientes a esas planillas, comparando la obra realizada, con la que debía ser ejecutada de acuerdo con el programa de trabajo autorizado.
e) Verificar la calidad de los materiales, así como la de los elementos construidos, mediante ensayos de laboratorio o de campo, efectuados bajo su supervisión y siguiendo rigurosamente las especificaciones técnicas.
f) Resolver las dudas que surgieren de la interpretación de los planos, especificaciones, detalles constructivos y cualquier otro aspecto técnico relacionado con la obra.

g) Anotar en el libro de obra, además de una descripción del proceso de construcción de las obras a su cargo, las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deben ser considerados por el contratista para el mejor desarrollo de la obra.
h) Justificar técnicamente la necesidad de efectuar modificaciones o trabajos extraordinarios en las obras bajo su supervisión.
i) Coordinar con los diseñadores de la obra cuando sea necesario efectuar modificaciones de los planos originales o haya que realizar obras adicionales.
j) Realizar los cálculos pertinentes para determinar los costos de las modificaciones u obras extraordinarias por realizar.
k) Registrar en los planos constructivos todas las modificaciones realizadas durante el proceso de construcción, con el fin de obtener los planos finales de la obra ejecutada.
l) Aprobar los materiales y equipos por instalar propuestos por el contratista, tomando como guía las especificaciones.
m) Calificar al personal técnico del contratista y recomendar el reemplazo de aquél que no satisfaga los requisitos necesarios, conforme a la oferta técnica presentada.
n) Velar porque los equipos y maquinaria en la obra se encuentren en buenas condiciones, y éstas se ajusten a la oferta del contratista, además verificarán su vida útil; y en el caso de que la obra se realice por contrato, sean los especificados.
o) Verificar que el contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas de trabajo, licencias, permisos y demás documentos contractuales.
p) Coordinar con el contratista las actividades más importantes del proceso constructivo.
q) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el contratista y en caso necesario, sugerir las modificaciones que estime pertinentes.
r) Exigir al contratista el cumplimiento de las leyes de protección ambiental, laborales, de seguridad social y de seguridad industrial.
s) En proyectos de importancia, preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción de las obras, para que sean utilizados como fuentes de información en proyectos futuros.
t) Preparar, mensualmente, informes sobre la obra que contengan como mínimo la siguiente información:
    - ✓ Un análisis del estado del proyecto desde el punto de vista económico y del avance físico, respaldado por los cálculos correspondientes.
    - ✓ Los resultados de los ensayos de laboratorio, con comentarios al respecto.
    - ✓ Análisis de la cantidad y calidad de los equipos y maquinaria dispuestos en obra, con recomendaciones al respecto, si es necesario.
    - ✓ Estadísticas sobre las condiciones climáticas del sitio donde se ejecuta el proyecto (especialmente de la precipitación pluvial) y su incidencia en el desarrollo de los trabajos.
    - ✓ Referencia sobre la correspondencia intercambiada con el contratista.
    - ✓ Análisis del personal técnico del contratista
u) Entregar la información producida para las recepciones.
v) Efectuar el finiquito o liquidación económica de las obras a su cargo.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

13.1.- Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

13.2.- Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;

3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;

4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;

6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,

7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - TRABAJO PREFERENTE:

14.1.- La contratista está obligado a cumplir con lo dispuesto en el Art. 41.1 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporado mediante el artículo 34 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 488 del 30 de enero de 2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO:

15.1.- Por causas justificadas, las partes podrán firmar contratos complementarios o convenir en la ejecución de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u órdenes de trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Orgánica para la Eficiencia en la Contratación Pública, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 966 del lunes 20 de marzo del 2017, artículos mediante los cuales se sustituye a los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

Las recepciones serán: Provisional y Definitiva.

16.01.- RECEPCIÓN PROVISIONAL: La recepción provisional se realizará, a petición del CONTRATISTA, cuando a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y así lo notifique a la CONTRATANTE y solicite tal recepción, en los términos del artículo 81 de la LOSNCP, y observando el artículo 317 de su Reglamento General.

16.02.- RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses mínimo desde la recepción provisional o de la declaratoria de recepción provisional presunta, el CONTRATISTA solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la misma, conforme al artículo 81 LOSNCP y artículo 317 del Reglamento.

16.03.- La suscripción del acta de entrega recepción definitiva no quita la responsabilidad ulterior del contratista, que por vicios ocultos de la obra se pudieran encontrar luego de los diez (10) años siguientes contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción provisional.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - CONOCIMIENTO:

17.1.- La Contratista, declara conocer perfectamente el sitio sobre el cual deberá ejecutar el objeto contractual y que ha recibido del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, la información suficiente y necesaria referente a las condiciones y demás factores y características del medio ambiente. Cualquier descuido, falta de apreciación., error u omisión del Contratista no le exime de responsabilidad ni le enerva de estas ni le disminuye responsabilidad. De igual forma los precios acordados para la ejecución de los trabajos motivo del presente instrumento no podrán variar alegando desconocimiento de lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:

18.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existente no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

18.2.- La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES:

19.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones

entre el administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

CLÁUSULA VIGESIMA. - DOMICILIO:

20.1. Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Loreto.

20.2. Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EL CONTRATANTE:

Dirección:	Provincia de Orellana, Cantón Loreto, parroquia Loreto, Ciudad de Loreto, Av. Rafael Andrade Chacón y Gregorio Urapari
Teléfono:	(06)2-893-223 / Telefax: (06)-2- 893-239
E mail:	gadloreto92@gmail.com

LA CONTRATISTA:

Dirección:	Provincia Orellana, cantón Loreto, parroquia Loreto, calle principal Rufino Papa y Vicente Arauz.
Correo:	sumaconstrucservcialtda@gmail.com
Teléfono:	0993978913

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

21.1.- Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que están suscribiendo.

21.2.- Para constancia de lo acordado, las partes intervinientes firman electrónicamente, en la ciudad de Loreto, cantón Loreto, provincia de Orellana, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veinticinco.

Firmado electrónicamente por:
KLEBER FABIAN OLALLA TORRES
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTÓN LORETO

Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Segundo Vicente Feijoo Maldonado
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.
CONTRATISTA

CONVENIO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ENTIDAD MIUNICIPAL INTERVENGA EN LOS PREDIOS DE LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONSEÑOR ANTONIO CABRI, A SUSCRIBIRSE ENTRE EL VICARIATO DE LA PROVINCIA DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO

Comparecen a la celebración del presente Convenio de autorización para que la entidad municipal intervenga en los predios de la escuela fiscomisional Monseñor Antonio Cabri, por una parte, el **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO** legalmente representado por el señor Kleber Fabián Olalla Torres, en su calidad de **ALCALDE** quien para efectos del presente convenio se denominará **"MUNICIPIO"** y, por otra parte, el **VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO, MISIÓN JOSEFINA** representada legalmente por el Mgs. Luis Alberto Zambrano Solórzano, en calidad de Represente legal del **VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO, MISIÓN JOSEFINA** a quien en adelante y para los efectos del presente instrumento se denominará **"VICARIATO";** y, a quienes en conjunto se referirá como las "Partes" o "Comparecientes", que por los derechos que representan; debidamente autorizados, en forma libre y voluntaria acuerdan comprometerse al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. –

a) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, como Institución de Derecho Público, que representa a la parroquia Loreto de la Provincia de Orellana, tiene Personería Jurídica, con capacidad para realizar los actos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y condiciones que determina la Constitución y las Leyes; y, gozando de plena autonomía para su organización y funcionamiento; está facultado para suscribir convenios y contratos con entidades del sector público y/o privado, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador.

b) El Vicariato Apostólico de Napo es una entidad religiosa sin fines de lucro en beneficio de la comunidad con el objetivo de enseñar espiritualmente, ayudar en las necesidades de la comunidad y, dirigir la educación fiscomisional educativos distritales y zonales coordinar a los niveles desconcentrados de su territorio para garantizar tanto el acceso como la calidad de la Educación.

c) Mediante Oficio S/N de fecha 09 de mayo de 2024, los señores Carla Grefa, Presidenta de Padres de Familia, James Grefa, Representante de Concejo Estudiantil, Lic. Rogelio Calapucha, Docente, Lic. Silvia Pinargote, Docente, Lic. María Vargas, Secretaria y Lic. Rosa Chimborazo, Líder Educativo, solicitaron al señor Kleber Olalla, Alcalde del cantón Loreto se realice el estudio técnico y rehabilitación de baterías sanitarias existentes, ya que se encuentran en mal estado por lo cual están inhabilitadas para el uso de niños y niñas de la Institución Antonio Cabri, ya que es de uso prioritario para la salud de los estudiantes, por tal motivo acudimos ante su digna autoridad para que nos ayude en esta emergencia sanitaria.

d) El Informe de Necesidad Nro. 013-BPI-2025 de 09 de febrero de 2025 realizado por la Ing. Belén Párraga, INGENIERO DE OBRAS, revisado y aprobado por el Ing. Edison Egüez, DIRECTOR DE OOPP, de entre otras cosas recomienda: (…) "*Se elabore un convenio interinstitucional entre el Distrito de Educación Loreto – Orellana 22D02 y el GADML, para poder intervenir dentro de la Institución Educativa según sus competencias*".

e) El proyecto CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO, determina que, el GADML es la entidad ejecutora por un monto de Inversión de $ 57.291,68 (CINCUENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100, precio sin incluir IVA).

f) El Informe No. GADML-DP-2025-032-SCH de fecha 12 de febrero de 2025, elaborado por la Ing. Silvana Changoluisa SP6 – PROFESIONAL del GADML, en la parte de conclusiones detalla: *(…)* "*pongo en su conocimiento el presente informe y la planimetría del área destinada a favor del GADM Loreto con una superficie 0.100358 ha; con clave catastral 2204505101001099000; perteneciente a la Comunidad Kichwa Wankariska Chonta Cocha – Parroquia San José de Payamino* (Parroquia Puerto Murialdo) - *provincia de Orellana",* al mismo que se encuentra adjunto la planimetría del área a intervenir.

g) De acuerdo con la CERTIFICACIÓN DEL POA -010-2025 de fecha 18 de febrero de 2025, suscrito por el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano, DIRECTOR DE PLANIFICACION, se encuentra contemplado el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL

MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO.

h) Se cuenta con la CERTIFICACIÓN PAC 010-2025 de fecha 26 de febrero de 2025, suscrito por el Ing. JIMENEZ RIMACUNA JAIME RENE, en el cual contempla planificado el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO.

i) El proyecto cuenta con CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 124- DGF-GADML-2026, emitido con fecha 19 de febrero de 2026, por la Lcda. Lorena Toro COORD. PRESUPUESTO y la Mgs. Carmela Asipuela DIRECTORA FINANCIERA, en la que consta el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO, por un monto de Inversión de $ 57.291,68 (CINCUENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100, precio sin incluir IVA), que se detalla:

FUNCION	DIRECCION/ UNIDAD	NRO. PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION DE PARTIDA	SALDO POR CERTIFICAR
411	DIRECCION DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS	41175027	CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO	750107	Construcciones y Edificaciones	57.291,68

j) De acuerdo a la Escritura de Contrato de Comodato otorgado por la Comunidad Kichwa Wankurishka de Chonta Cocha, a favor de Vicariato Apostólico de Napo, el 21 de septiembre de 2022 ante la Notaria Pública Primera del cantón Loreto, en la cláusula tercera del objeto del comodato señala que, la Comunidad Kichwa Wankurishka de Chonta Cocha concede en calidad de comodato o préstamo de uso a favor de Escuela Fiscomisional "Monseñor Antonio Cabri", un predio de una superficie de 40,000m2, ubicado dentro del dominio de la Comunidad que será fraccionado posteriormente para establecer los respectivos linderos y en la cláusula cuarta de destino señala que, el predio a entregarse en comodato a la Escuela Fiscomisional "Monseñor Antonio Cabri", será utilizado exclusivamente para fines en favor de la educación.

k) De acuerdo a la Ficha Registral No. 298 de fecha 09 de mayo de 2025, la Escritura de Contrato de Comodato, se encuentra inscrita en el Registro de

la propiedad del cantón Loreto, con fecha 09 de mayo de 2025, bajo el número de inscripción 279, repertorio No. 397, Tomo 1.

l) Mediante memorando Nro. GADMCL-A-2025-2116-M-GD, de fecha 24 de abril de 2025, la Máxima Autoridad Municipal, dispuso al Procurador Síndico la preparación del informe jurídico y elaboración de los borradores de convenios de autorización a suscribirse con el vicariato, para la ejecución del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO; y, en respuesta mediante Oficio Nro. GADMCL-GPS-2025-0013-O-GD, de fecha 23 de abril de 2025, la Procuraduría Sindica recomendó a la Máxima Autoridad Municipal, que previamente se debe realizar el trámite para la entrega del uso, goce y usufructo a perpetuidad a favor del GAD Municipal del cantón Loreto para la ejecución de obra pública.

m) Con Oficio Nro. GADMCL-A-2025-0073-O-GD de fecha 13 de mayo de 2025, la Máxima Autoridad Municipal, remitió en físico la escritura pública de contrato de comodato, el certificado de Registro de la Propiedad y dispuso preparar el informe Jurídico y el borrador del convenio para continuar con lo que corresponde en el Legislativo.

n) Con memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0530-M-GD de fecha 25 de febrero de 2026, dirigido a la máxima Autoridad Municipal, el Ing. Edison Alberto Egüez Cevallos, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, solicita la RENOVACIÓN DE CONVENIO PARA EL PROCESO MCO-GADML-2025-04, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO", ya que el convenio había sido suscrito el 11 de diciembre de 2024 con un plazo de 90 días y al momento de ejecución de la etapa contractual del proyecto no se encuentra vigente, considerando que el inicio de obra ha sido notificado a la Contratista con fecha 10 de febrero de 2026.

o) Mediante INFORME TÉCNICO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO N.- 003-GADML-DGOP-2025, suscrito por el Ing. Edison Egüez Cevallos DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, respecto al convenio suscrito el 11 de diciembre de 2024, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto y el Vicariato Apostólico de Napo – Misión Josefina, concluye que: *"El convenio interinstitucional suscrito el 11 de*

diciembre de 2024 se encuentra legalmente fenecido desde el 10 de marzo de 2025. No se ejecutaron actividades físicas ni financieras dentro del plazo de vigencia del convenio. La principal causa del incumplimiento fue la falta de liquidez económica institucional en el periodo correspondiente. A pesar de contar actualmente con anticipo transferido dentro del contrato de obra, no es posible iniciar la ejecución sin la vigencia de un nuevo convenio"; finalmente en el informe se recomienda la suscripción de un nuevo convenio interinstitucional, que permita dar viabilidad legal y administrativa a la ejecución del proyecto.

p) Del expediente consta el ACTA DE FINIQUITO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO Y EL VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO, MISIÓN JOSEFINA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO". El acta de finiquito se encuentra debidamente firmada con fecha 25 de marzo de 2026, entre el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres en calidad de ALCALDE DEL CANTON LORETO y por otra parte el Mgs. Luis Alberto Zambrano Solórzano REPRESENTANTE LEGAL DEL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO.

q) Mediante memorando Nro. GADMCL-DGOPM-2026-0868-M-GD de fecha 27 de marzo de 2026, dirigido a la máxima Autoridad, el Ing. Edison Alberto Egüez Cevallos, DIRECTOR DE GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO, remite informe de terminación, liquidación y finiquito del Convenio Interinstitucional suscrito el 11 de diciembre de 2024, del PROCESO MCO-GADML-2025-04, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO", en el texto del documento se establece: *El convenio tuvo una vigencia de 90 días, culminando el 10 de marzo de 2025, sin que se haya podido iniciar la ejecución del proyecto debido a la falta de liquidez institucional ocasionada por retrasos en las asignaciones del Gobierno Central. En consecuencia: No se entregó el anticipo dentro del plazo del convenio. No se registró ejecución física ni financiera. El convenio feneció legalmente el 10 de marzo de 2025. Aunque el 10 de febrero de 2026 se transfirió el anticipo del contrato de obra MCO-GADML-2025-04, no es*

posible ejecutar la obra al no existir un convenio vigente que habilite la intervención".

r) Mediante memorando Nro. GADMCL-A-2026-1721-M-GD de fecha 06 de abril de 2026, la Máxima Autoridad Municipal, dispuso a Procurador Sindico preparar un nuevo convenio con el Vicariato Apostólico de Napo para el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO"

- Mediante Resolución de Concejo Nro. GADML-CM-052-2026, de fecha 15 de abril del año 2026, el Legislativo autoriza al Ejecutivo la suscripción del "CONVENIO DE AUTORIZACIÓN A SUSCRIBIRSE ENTRE EL VICARIATO APOSTOLICO DE LA PROVINCIA DE NAPO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO", cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".

CLÁUSULA SEGUNDA. – BASE LEGAL

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

- De conformidad al Art. 26.- "La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo".

- El Art. 27-"La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional".

- De acuerdo al Art. 28.- "La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones".

- El Art. 260.- "El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno".

- Art. 347.- Sera responsabilidad del Estado: numeral 1) "Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas".

- La Constitución de la República del Ecuador señala: "Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución."

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece "Art. 53.- Naturaleza jurídica. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden."

- El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización señala "Art. 54.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; (...) f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad;".

- El COOTAD dispone: "Art. 138.- Ejercicio de las competencias de infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, podrán construir y mantener la infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación, para lo cual deberán ***contar con la autorización previa del ente rector a través de convenio, y sujetarse a las regulaciones y procedimientos nacionales emitidos para el efecto***. Cada nivel de gobierno será responsable del mantenimiento y equipamiento de lo que administre.".

- Dentro de las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, en virtud del Art. 53,- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalídad y el respeto a la diversidad;

- El Art. 3 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización dice de los "Principios.- El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios: (...) e) Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de coda uno de ellos. Para el

cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso eficiente de los recursos.";

CODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

- "Artículo 2.- Ámbito. - La presente Ley rige para todo el territorio nacional y garantiza el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida; determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores […]"

- "Artículo 4.- Principios rectores de la educación, literal a) "Acceso universal a la educación: Se garantiza el acceso universal, integrador y equitativo a una educación de calidad; la permanencia, movilidad y culminación del ciclo de enseñanza de calidad para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todas y todos a lo largo de la vida sin ningún tipo de discriminación y exclusión".

- "Artículo 5.- Principios de aplicación de la Ley, literales: b) Interculturalidad y plurinacionalidad: La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan el reconocimiento, respeto y recreación de las expresiones culturales de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador; así como sus saberes ancestrales, promoviendo la unidad en la diversidad, el diálogo intercultural y reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a acceder a los servicios presenciales o virtuales y obras de la biblioteca escolar que se encuentre en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación intercultural; […] f) Corresponsabilidad: El sistema educativo tiene la responsabilidad de gestionar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las niñas, niños, adolescentes; y deberá coordinar con otras entidades para la ejecución de sus actos. Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. La educación, formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes demanda corresponsabilidad en el esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta ley; g) Pertinencia: Se garantiza a las y

los estudiantes una formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, nacional, regional y mundial".

- "Artículo 9.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: […] b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el bachillerato, bajo criterios de calidad; c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; […] j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en referente de educación liberadora de los pueblos; k. El fomento del conocimiento, respeto, valoración, rescate, preservación y promoción del patrimonio natural y cultural tangible e intangible"

- "Artículo 12.- Obligaciones. - […] m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; […]"

- "Artículo 28.- Autoridad Educativa Nacional. - Corresponde a la Función Ejecutiva la calidad de Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el ministro o ministra del ramo. Para el cumplimiento de sus funciones y en procura de la integralidad, la Autoridad Educativa Nacional articulará sus acciones con las entidades y organismos públicos competentes en materia de inclusión económica y social, educación intercultural bilingüe, evaluación educativa, formación docente y educación superior".

- "Artículo. 38.- […] La Autoridad Educativa Nacional ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional, garantiza y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución de la República y de conformidad con lo establecido en esta Ley. Está conformada por tres niveles de gestión, uno de carácter central y dos de gestión desconcentrada que son: zonal y distrital. La Autoridad Educativa Nacional establecerá las instancias correspondientes orientadas a la adecuada gestión educativa en los ámbitos público, particular, intercultural bilingüe y Fiscomisional".

- El artículo 82 establece que *"Las instituciones educativas pueden ser públicas, municipales, **fiscomisionales** y particulares, sean éstas últimas nacionales o binacionales, cuya finalidad es impartir educación escolarizada a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos según sea el caso. Las instituciones educativas particulares y **fiscomisionales, tendrán como entidades promotoras a organizaciones de derecho privado y sin fin de lucro**, como congregaciones, órdenes o cualquiera otra denominación confesional-religiosa, misional o laica. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional por su naturaleza, basada en su identidad, filosofía y valores institucionales, podrán ser promotoras de instituciones educativas fiscomisionales. La Autoridad Educativa Nacional es la responsable de **autorizar la constitución y funcionamiento de todos los establecimientos educativos y ejercer de conformidad con la Constitución de la República y la Ley, la supervisión y control de las mismas**, que tendrán un carácter inclusivo y cumplirán con las normas de accesibilidad para las personas con discapacidad, ofreciendo adecuadas condiciones arquitectónicas, tecnológicas y comunicacionales para tal efecto. Las instituciones educativas cumplen una función social, son espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las públicas como las privadas y fiscomisionales, se articulan entre sí como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir los fines, principios y disposiciones de la presente Ley. **Los establecimientos educativos, incluidos los particulares si así lo deciden, son espacios públicos**. Los establecimientos educativos de carácter binacional no podrán invocar tal calidad para incumplir las disposiciones establecidas en la presente Ley, su Reglamento y demás normativa expedida por la Autoridad Educativa Nacional".* El primer inciso del artículo 84 ibídem determina *"**Las instituciones educativas fiscomisionales son establecimientos educativos que contarán con financiamiento total o parcial del Estado** (…).* (Negrillas me pertenece)

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

- El Art. 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, dispone.- "Certificación Presupuestaria-Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria.";

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

- El Art. 11 del Código De La Niñez Y Adolescencia, determina: "El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de

los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-

- Nombramientos de los representantes legales de las partes.
- Documentos personales de los representantes legales de las partes.
- Proyecto para la intervención en la unidad educativa.
- Certificación presupuestaria.
- Resolución de administrativa.
- Escritura y Certificado de la Propiedad.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO.-

A través de la suscripción del presente convenio, el Vicariato Apostólico de Napo en calidad de ente rector de la Escuela Fiscomisional Antonio Cabri, ubicado en la Comunidad Chonta Cocha del cantón Loreto, provincia de Orellana, autoriza al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, para que intervenga con la ejecución de la obra denominada **"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO"**, obra que será ejecutada con recursos propios de la entidad municipal con cargo al ejercicio fiscal 2026, procurando que las condiciones sean las mejores para los estudiantes que son parte de dicha institución educativa.

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. -

OBLIGACIONES CONJUNTAS:

a) El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto y la Vicaría, suscribirán un convenio de autorización que permita intervenir al GADML en los predios de la escuela Antonio Cabri.
b) Las partes se comprometen a brindar las facilidades para la ejecución de los mecanismos convenidos y los que en el transcurso de las actividades se requieran; así corno también a transferir la información y documentación que se derive del trabajo de las instituciones involucradas en este convenio.
c) Cada una de las partes designará un administrador de convenio, debiendo notificar su identidad por escrito, los mismos quienes en conjunto velarán por el fiel cumplimiento de las cláusulas del convenio y la correcta ejecución del presente instrumento.
d) Proceder con la suscripción del acta de finiquito respectiva, la misma que contará con los informes técnicos necesarios.
e) Revisar temporalmente los avances de convenio.

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LORETO.

Se compromete a:

a) Firmar el convenio de autorización para que el GADML intervenga en los predios de la escuela Fiscomisional Monseñor Antonio Cabri a suscribirse con el Vicariato, que permita la ejecución del proyecto el "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".

b) Contratar y ejecutar el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO" de acuerdo con el presupuesto referencial, cronograma valorado, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas.

c) Invertir la suma de $ 57.291,68 (CINCUENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100 DOLARES), valor que no Incluye IVA, para la ejecución del proyecto de "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".

d) Designar un administrador del convenio para el respectivo seguimiento y evaluación del mismo.

EL VICARIATO PROVINCIAL DE NAPO:

a) Firmar el convenio de autorización para que el GADML intervenga en los predios de la escuela Fiscomisional Monseñor Antonio Cabri a suscribirse con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".

b) Designar un administrador del convenio quien será responsable de verificar el fiel cumplimiento del presente instrumento.
c) Disponer a la autoridad de la Institución Educativa beneficiaria, busque los mecanismos necesarios para velar por la seguridad de los niños y adolescentes; y de los bienes institucionales, mientras duren los trabajos de construcción; así como también cuidar de que no interfieran en la ejecución de los mismos.

d) Solicitar a la Autoridad de la Institución Educativa beneficiaria, facilite un espacio físico para resguardar los materiales y equipos que serán utilizados en los trabajos a realizarse, mientras se ejecutan y finalicen las obras.

CLAUSULA SEXTA: FINANCIAMIENTO. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto financiará la ejecución del proyecto, con Certificación Presupuestaria No. 124- DGF-GADML-2026 de fecha 19 de febrero del año 2026, partida presupuestaria 750107 denominada "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO" por un monto de $ 57.291,68 (CINCUENTA Y SIETEMIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 68/100 DOLARES), valor que no Incluye IVA

CLAUSULA SEPTIMA: ADMINISTRADOR Y FISCALIZADOR DEL CONVENIO. -

La supervisión y administración de la ejecución del presente Convenio, corresponde a cada una de las partes, según el siguiente detalle:

a) Como administradores: Por el Vicariato, se designa a Sor Gladis Susana Misess Cofre; y por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto se designa al **Director de Obras Públicas** que se encuentre en funciones o su delegado, quien será responsable de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, cuidado y mantenimiento con estricto cumplimiento de las cláusulas y estipulaciones.
b) Los administradores deberán informar a las instancias directivas jerárquicas superiores sobre la marcha del presente Convenio, así como también es su responsabilidad resguardar, según corresponda los intereses institucionales respecto de la ejecución, calidad y finalización satisfactoria de las actividades originadas por el presente Convenio.
c) Los Administradores del Convenio presentarán a las máximas autoridades de cada Institución un informe de gestión al final de las actividades y procesos realizados para el correcto cumplimiento del presente instrumento.
d) Es responsabilidad de los administradores elevar a conocimiento de la máxima autoridad cualquier incumplimiento o novedad dentro de la ejecución del proyecto.

CLAUSULA OCTAVA: PLAZO. -

El plazo de vigencia del presente convenio interinstitucional será hasta 30 días después de haber suscrito el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, contados desde la fecha de suscripción del presente Convenio. Las partes se comprometen a cumplir las obligaciones estipuladas de manera inmediata, sin interrumpir su ejecución salvo si llegaren a presentarse casos

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. -

Las partes acuerdan solucionar directamente las diferencias que se presenten entre ellas por razón del contenido y alcance de las disposiciones en el Convenio. No obstante, si no llegaren a algún acuerdo, las partes acuerdan someterse al procedimiento alternativo de Mediación conforme lo determina la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y la Ley de Arbitraje y Mediación; el procedimiento se celebrará en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado; y se regulará por su Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFIDENCIALIDAD. –

La información que se produzca o a la que se tenga acceso como resultado de la ejecución de las actividades realizadas en el marco del presente Convenio, se sujetarán al principio de confidencialidad.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ACUERDO INTEGRAL Y VINCULACIÓN LABORAL.-

El presente convenio no genera relación laboral alguna entre las partes; por lo que las personas que participen en el desarrollo de las actividades que se realice al amparo de este convenio conservarán su vínculo y relación laboral con la Entidad de la cual dependen.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. -

a) Una vez terminada la obra dentro del plazo señalado, se suscribirán entre las partes el acta de terminación del Convenio la misma que tendrá como efecto la liquidación de todas las obligaciones que contrajeron las partes al suscribir el presente Convenio.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO. -

a) El presente Convenio se dará por terminado, sin perjuicio de las demás causales establecidas en la ley, en los siguientes eventos:
b) Por incumplimiento comprobado de cualquiera de las obligaciones o compromisos previstos en el presente Convenio, caso en el cual la parte cumplida comunicará sin necesidad de requerimientos previos.
c) Vencimiento del plazo determinado en este Convenio o de cualquiera de sus prórrogas.
d) Mutuo acuerdo de las partes.
e) Aviso por escrito de una parte a otra, con quince (15) días de antelación a la fecha en que se pretenda dar por terminado.
f) Por caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten la ejecución del presente Convenio, de conformidad con lo que determina el Código Civil.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. -

Para todos los efectos de este Convenio, las partes convienen en señalar su domicilio conforme el siguiente detalle:

VICARIATO APOSTÓLICO DE NAPO	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
Dirección: Av. Juan Montalvo y Gral. Gallo, cantón Tena, provincia de Napo. Teléfono: 0984062029 Correo: luiszambrano19@gmail.com	Dirección. – Avenida Rafael Andrade y Chacón, cantón Loreto. Teléfono: 062 893 100 **Correo: gadloreto92@gmail.com**

Las comunicaciones y notificaciones en la ejecución del presente Convenio de Cooperación Interinstitucional, serán dirigidas por escrito o correo electrónico, bastando en cada caso, que el remitente tenga la correspondiente constancia de que su comunicación ha sido recibida en las direcciones de la otra parte.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. -

Libre y voluntariamente, las partes declaran expresamente su aceptación a todo el contenido en el presente Convenio, a cuyas estipulaciones se someten, en señal de aquello suscriben en cuatro ejemplares de igual tenor y valor.

Para constancia y legalidad de todo lo actuado, los comparecientes suscriben en la ciudad de Loreto, provincia de Orellana a los 15 días del mes de abril del 2026.

Firmado electrónicamente por:
KLEBER FABIAN OLALLA TORRES
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTON LORETO

Firmado electrónicamente por:
LUIS ALBERTO ZAMBRANO SOLORZANO
Validar únicamente con FirmaEC

Mgs. Luis Alberto Zambrano Solórzano
REPRESENTANTE LEGAL DEL VICARIATO APOSTOLICO DE NAPO

LABOCYV S.A.S	**Control de resistencia a la compresión simple**	LAB-EN-RG-008 Versión: 02 AMER15862

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".

UBICACIÓN: COMUNIDAD CHONTA COCHA - LORETO

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.

CONTRATISTA: SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.

FISCALIZADOR: ING. CARLOS VELEZ BURGOS - GADML

FECHA DE INFORME: 28/5/2026

CALIBRACIÓN DE PRENSA: TBTCTN-2000-2704

REFRENTADO: NO ADHERIDO

INFORME LABOCYV #: 001 - SCL

1 KN = 101,97 Kilogramos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE - F´c= 180 Kg./cm2

NORMA: INEN 1573 - ASTM C 39

Nº Muestra	ELEMENTO FUNDIDO	Asentamiento cms.	ϕ muestra cms.	Altura muestra cms.	Peso muestra gr.	Area muestra cm2	Fecha de Fundición	Edad días	Fecha de Rotura	Carga KN	Carga Kgr.	Resistencia obtenida Kg./cm2	Resistencia Maxima a 28 días Kg./cm2	% de resistencia obtenida	% de resistencia requerida	Tipo de Fract.
1	HORMIGÓN CICLOPEO		15,2	30,4	12544	181,5	7/5/2026	7	14/5/2026	254,32	25933	**142,9**	180	**79,4**	60	3
2	F´c= 180 Kg./cm2		15,1	30,3		179,1	7/5/2026	28	4/6/2026		0	**0,0**	180	**0,0**	100	
1	HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA		15,1	30,2	12756	179,1	20/5/2026	7	27/5/2026	243,65	24845	**138,7**	180	**77,1**	60	2
2	F´c= 180 Kg./cm2		15,3	30,3		183,9	20/5/2026	28	17/6/2026		0	**0,0**	180	**0,0**	100	

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS Y TRAIDAS AL LABORATORIO POR EL CONTRATISTA

LAS MUESTRAS ENSAYADAS SI CUMPLEN CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA A LOS 7 DÍAS DE CURADO.

Presente en los ensayos de compresión: Ing. Carol Carrera Vélez - SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.


Nota: El valor en cero corresponde a muestras que aun no cumplen los días de curado para el ensayo de compresión.


Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Tlgo. Mario Morales Villarroel
LABORATORISTA
ACI - Nº 1888783

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
FRANK LEONEL ALCIVAR HERRERA

Ing. Civil Frank Alcívar Herrera
COORD. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SENESCYT: 1016-15-1435692

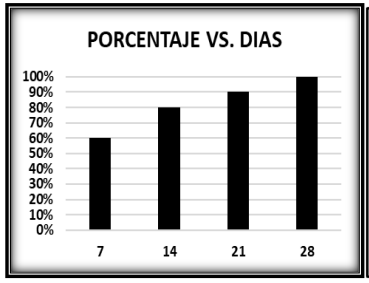

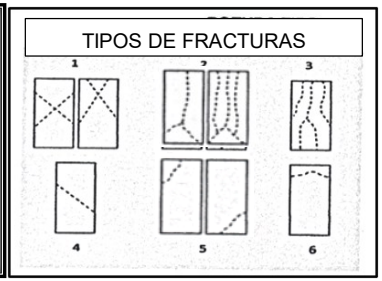

LABOCYV S.A.S	**Oficio**	LAB-DE-RG-009 Versión: 02 AMER15862

Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-155-O.
Francisco de Orellana, 28 de mayo de 2026.

Estimado
Segundo Vicente Feijoo Maldonado
Representante Legal
SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA

Presente.

ASUNTO: Entrega de informe de resultados del ensayo de compresión.

Me es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente y a la vez desearle éxitos en sus funciones que acertadamente desempeña.

Mediante la presente, me permito remitirle el informe de los resultados obtenidos en el ensayo de **COMPRESIÓN A MUESTRAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 6X12" EN LOS ELEMENTOS: HORMIGÓN SIMPLE EN ACERA Y HORMIGÓN CICLÓPEO, CORRESPONDIENTES A 7 DÍAS DE CURADO** para la obra: *"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS.ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO".*

Se adjunta un total de 1 hoja **(INFORME LABOCYV #: 001-SCL).**

Sin otro particular, agradecemos por tomarnos en cuenta y ser parte del control de calidad en su obra.

Atentamente;

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Tlgo. Mario Isaac Morales Villarroel.
GERENTE GENERAL.
LABOCYV S.A.S.

Elaborado por:
Ing. Fricson Romero.

Recibido por:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO

Nombres: _____

C.I: _____

Fecha: _____

Firma: _____

INFORME DE MANTENIMIENTO Y DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente	**LABOCYV S.A.S.**
Dirección	Antonio Llori y Río Negro - El Coca
Contacto	Mario Morales Villaroel
Informe Número	**LABOCYV-0226-WPS30-2703**
Ubicación del equipo	Laboratorio de ensayo de materiales
Condiciones ambientales:	
Temperatura ambiente	27 +/- 2 °C **HR** 71 +/- 5 % HR
Fecha de emisión del informe	23 de marzo del 2026

EQUIPO BAJO PRUEBA

Equipo	**Balanza de precisión**	
Marca	CAS/HIWEIGH	
CÓDIGO		
Modelo	WPS30	
Serie	XH24030040441	
Max	30	kg
d=	0,001	kg
e=	0,001	kg
Clase	III	

PRUEBAS METROLÓGICAS

EXCENTRICIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Carga Ensayo kg	**Posición** kg	**Lectura** kg	**Desviación Centro** kg
10,000	**10,000**	**Centro**	**10,001**	**0,000**
10,000	**10,000**	Fondo Izquierdo	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Fondo Derecha	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Frente Derecha	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Frente Izquierda	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Centro	10,001	0,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Excentricidad	0,000	kg
Error Máximo Permitido	0,003	kg

LINEALIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Valor Nominal kg	**Lectura Ascendente** kg	**Lectura Descendente** kg	**Histéresis** kg
0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000
0,010	**0,010**	0,010	0,010	0,000
0,100	**0,100**	0,100	0,100	0,000
1,001	**0,500**	0,500	0,500	0,000
2,002	**1,000**	1,000	1,000	0,000
5,004	**5,000**	5,000	5,000	0,000
10,008	**10,000**	10,000	10,000	0,000
20,017	**20,000**	20,000	20,001	0,001
30,025	**30,000**	30,001	30,002	0,001

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Histéresis Máximo	0,001	kg
Error Máximo Permitido	0,002	kg
Desviación Standard	0,00044	kg

REPETIBILIDAD

Unidades	**Vacío** kg	**Carga** kg	**Carga - Vacío** kg
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,000	15,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Desviación Standard	0,0	kg
Error Máximo Permitido	0,0	kg

SENSIBILIDAD

Carga de Ensayo	**Lectura**	**Desviación**
30,000	30,001	0,001

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Máximo Permitido	0,003	

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA DE LOS ENSAYOS DE MEDICIÓN

μ cal=	0,0016	kg

La incertidumbre combinada ha sido estimada evaluando todos los factores que influyen sobre el resultado medido. Los factores a considerar son repetibilidad, sensibilidad, no linealidad, carga descentrada, incertidumbre de las pesas patrón y resolución de la balanza.

μ_{cal} = **Incertidumbre típica de calibración**

k = **Factor de cobertura (probabilidad de cobertura de 95,45%)**

U = **Incertidumbre expandida de la medición** $U_{\mu cal} * k$ (**k**=2)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo a los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

CORRECTAMENTE: _X_ USO CONDICIONADO:__ DENTRO DEL EMP: _X_ FUERA DEL EMP: __

Observaciones: EMP (Error Máximo Permisible)

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Se realiza revisión técnica y verificación previa para determinar el estado inicial de la balanza.
Se realiza mantenimiento, ajustes de calibración siguiendo el procedimiento dado por los fabricantes o por experiencia adquirida.
Se realiza verificación para obtener los datos suficientes para llenar el Informe Técnico de Mantenimiento y Ajustes de Calibración
La verificación consiste en pruebas de carga excéntrica, linealidad, repetibilidad, sensibilidad, cálculos de la desviación estándar de linealidad y repetibilidad, estimación de la incertidumbre combinada de calibración.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PESAS PATRÓN UTILIZADAS

Juego de Pesas:	B132196801	Certificado No.: SECM-M-2024-255	Clase:	E2
Juego de Pesas:	D21, D22	Certificado No.: SECM-M-2022-256	Clase:	F2
Juego de Pesas:	B149512904	Certificado No.: SECM-M-2022-254	Clase:	F1

Para las pruebas metrológicas de verificación y ajustes de calibración se utilizó pesas con trazabilidad al SI a través del patrón nacional de masa del Laboratorio Nacional de Metrología.

TIPO DE TRABAJO REALIZADO

AJUSTES _X_ MANTENIMIENTO _X_ REPARACIÓN ____ INSTALACIÓN __ VERIFICACIÓN _X_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza revisión técnica, mantenimiento preventivo, ajustes de calibración y verificación.
La balanza se encuentra funcionando correctamente y dento de los errores máximos permisibles(emp).
Los resultados están únicamente relacionados con el equipo descrito en el presente informe técnico.
El presente informe técnico debe ser reproducido por entero para evitar posible mala interpretación de los resultados
Se adjunta el certificado de calibración de las masas utilizadas para las pruebas de verificación.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fecha de revisión **27**-febrero-2026 **Próxima revisión** febrero - 2027

Responsable Ing. Andrés Méndez B. **Firma**

Firmado electrónicamente por:
OLGER ANDRES MENDEZ BEDON
Validez únicamente con FirmaEC

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

CERTIFICADO TÉCNICO DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Informe No LABOCYV.SAS-0226-TBTCTN.2000-2704
Fecha de calibración 27 de febrero del 2026

Cliente	**LABOCYV SAS**
Ubicación	Antonio Llori y Río Negro - El Coca
Contacto	Mario Morales Villaroel
Fecha de emisión	24 de marzo del 2026
Condiciones ambientales	27 +/- 2 **°C;** 71 +/- 5 **% HR**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03
Serie	S/N
Resolución	0,1 kN

PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	TBTCTM - 2000(N)
Serie	2105
Capacidad	2 000 kN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CALIBRACIÓN

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	MATEST
Modelo	C138PN295
Serie	C138PN295/AI/0001
Resolución	0,00 1 kN / 0,01 kN

CELDA DE CARGA 3 000 kN

Marca	MATEST
Modelo	C140-08
Serie	C140-08/AI/0006

RANGO de 20 kN a 200 kN

Certificado INEN	LNM-F-2025-14
Fecha de calibración	2025/03/21

RANGO de 300 kN a 3 000kN

Certificado INEN	LNM-F-2025-15
Fecha de calibración	2025/03/27

REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS

Documentos
Norma ASTM E74-04: Standard Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the Force Indication of Testing Machines.

Criterio de aceptación
Error máximo aceptable **+/-**1 % de la carga aplicada **(**ASTM E4-03)

Vigencia
Se recomienda realizar una nueva verificación y/o ajustes de calibración en 12 meses o menos y no más de 18 meses, cuando el equipo es movido a otro sitio y/o se tenga duda de su precisión **(**ASTM E4-03)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

Correctamente _X_ **En tolerancias _X_** **Uso condicionado __**

Observaciones
Se realiza revisión técnica, ajustes de calibración y verificación.
Se utiliza un transductor digital certificado en 200 kN y 3000 kN con trazabilidad al INEN.

Procedimiento utilizado: MVC-PRENSA-010-REV.12

Realizado Ing. Andrés Méndez B.
ASISTENCIA TÉCNICA

Firma

Firmado electrónicamente por:
OLGER ANDRES MENDEZ BEDON
Validar únicamente con FirmaEC

Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

HOJA DE DATOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA			
UNIDAD DIGITAL DE LECTURA		**PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL**	
Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT	**Marca**	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03	**Modelo**	TBTCTM - 2000(N)
Serie	S/N	**Serie**	2105
Resolución	0,1 kN	**Capacidad**	2 000 kN

LECTURAS OBTENIDAS ANTES DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Rango compresión 25 kN a 2 000 kN

LECTURAS FUERZA	PRENSA APLICADA	LECTURAS PATRÓN TEST 1	*ERROR ABSOLUTO*	ERROR %	EMP %
kN	*kgf*	*kN*	*kN*		
50	5099	49,36	0,64	**1,28**	**1,0**
100	10197	99,68	0,32	**0,32**	**1,0**
200	20394	200,83	0,83	**-0,42**	**1,0**
400	40788	398,34	1,66	**0,42**	**1,0**
600	61182	597,75	2,25	**0,38**	**1,0**
800	81576	797,18	2,82	**0,35**	**1,0**
1000	101970	996,31	3,69	**0,37**	**1,0**
1200	122364	1195,06	4,94	**0,41**	**1,0**
1400	142758	1393,98	6,02	**0,43**	**1,0**
1600	163152	1592,55	7,45	**0,47**	**1,0**
1800	183546	1791,79	8,21	**0,46**	**1,0**
2000	203940	1989,12	10,88	**0,54**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible


Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

LECTURAS OBTENIDAS DESPUÉS DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

LECTURAS	PRENSA	CELDA DIGITAL PATRÓN 3 000 kN				*ERROR*	*INCERTIDUMBRE*		ERROR	EMP
FUERZA	APLICADA	TEST 1	TEST 2	TEST 3	*PROMEDIO*	*PROMEDIO*	*U (k=2)*		%	%
kN	*kgf*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*		*kN*		
50	5099	50,12	50,08	50,10	**50,10**	-0,10	+/-	0,08	**-0,20**	**1,0**
100	10197	100,24	100,29	100,11	**100,21**	-0,21	+/-	0,21	**-0,21**	**1,0**
200	20394	200,37	200,58	200,48	**200,48**	-0,48	+/-	0,26	**-0,24**	**1,0**
400	40788	400,67	401,15	400,91	**400,91**	-0,91	+/-	0,55	**-0,23**	**1,0**
600	61182	601,57	601,17	601,37	**601,37**	-1,37	+/-	0,55	**-0,23**	**1,0**
800	81576	800,97	802,15	801,56	**801,56**	-1,56	+/-	1,28	**-0,19**	**1,0**
1000	101970	1001,09	1002,17	1001,63	**1001,63**	-1,63	+/-	1,24	**-0,16**	**1,0**
1200	122364	1199,83	1201,28	1200,56	**1200,56**	-0,55	+/-	1,62	**-0,05**	**1,0**
1400	142758	1399,33	1401,81	1400,57	**1400,57**	-0,57	+/-	2,62	**-0,04**	**1,0**
1600	163152	1598,96	1602,27	1600,62	**1600,62**	-0,62	+/-	3,45	**-0,04**	**1,0**
1800	183546	1798,01	1802,21	1800,11	**1800,11**	-0,11	+/-	4,34	**-0,01**	**1,0**
2000	203940	2000,90	2003,37	2002,14	**2002,14**	-2,13	+/-	2,75	**-0,11**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible

Curva: (Error +/- Incertidumbre) en % vs (Fuerza Aplicada Celda Patrón) en kN

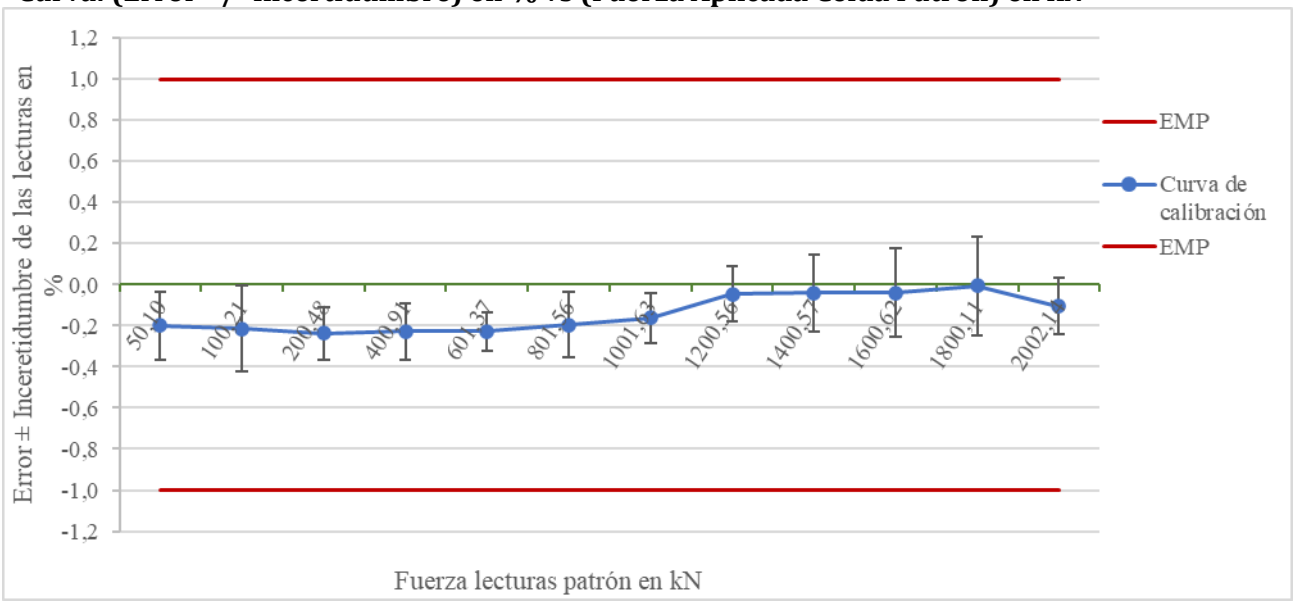


EMP=Error Máximo Permisible

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Compresión



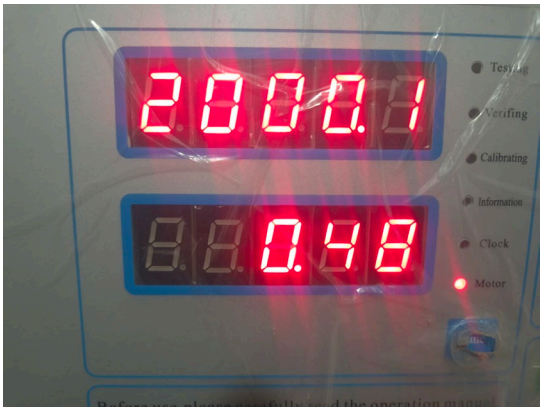



Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS
SUMACONSTRUCSERV CIA.LTDA.
RUC: 2293534996001



Oficio No. 05-SCSS-CH-2026
Loreto, 28 de mayo de 2026

PARA: LABOCYV
LABORATORIO DE OBRAS CIVILES Y VIALES

ASUNTO: Solicitando servicio de Ensayo de Compresión (Hormigón)

De mi consideración:

El que suscribe, Segundo Vicente Feijoo Maldonado, como Representante Legal de la compañía SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA.LTDA CONTRATISTA de la obra: **"CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y MANTENIMIENTO DE AULAS Y BAÑOS EN LA ESCUELA FISCOMISIONAL MONS. ANTONIO CABRI, UBICADA EN LA COMUNIDAD CHONTA COCHA DEL CANTÓN LORETO";** con la entidad del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTON LORETO, para lo cual solicito de su servicio para realizar el debido control de calidad referente a los hormigones.

Por la atención que se sirva dar al presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
SEGUNDO VICENTE FEIJOO MALDONADO

Segundo Vicente Feijoo Maldonado
Representante Legal
SUMACO CONSTRUCCIONES & SERVICIOS SUMACONSTRUCSERV CIA. LTDA.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

CONSORCIO RIVERSJAZ

Oficio No. 06-CRJ-HJ-2026
Loreto, 03 de junio de 2026

PARA: LABOCYV LABORATORIO DE OBRAS CIVILES Y VIALES

ASUNTO: Solicitando servicio de Ensayo de Compresión (Hormigón)

De mi consideración:

El que suscribe, Víctor Hugo Zapata Gonzales en calidad de Procurador Común del Consorció Riversjaz de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO"; con la entidad del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO CANTON LORETO, para lo cual solicito de su servicio para realizar el debido control de calidad referente a los hormigones.

Por la atención que se sirva dar al presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

Víctor Hugo Zapata Gonzales
PROCURADOR COMÚNCONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

PLANILLA NO1 (AVANCE DE OBRA)

“CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO TIEMPO”.

***.- ADMINISTRADOR DE CONTRATO:**	**ING. DALIA SANMARTIN TORRES**
***.- FISCALIZADOR DE CONTRATO:**	**ING. CAROL CARRERA VÉLEZ**
***.- CONTRATISTA:**	**CONSORCIO RIVERSJAZ**
***.- MONTO DE CONTRATO:**	**$ 290,455.810**
***.-PLAZO CONTRATO PRINCIPAL:**	**90 DIAS CALENDARIO**
***.-FECHA DE INICIO CONTRATO**	**07/05/2026**
***.-FECHA DE VENCIMIENTO CONTRATO**	**04/08/2026**
***.-PERIODO:**	**DEL (07/05/2026 al 31/05/2026)**

***ENSAYO DE HORMIGÓN**

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
VICTOR HUGO ZAPATA GONZALES

CONSORCIO RIVERSJAZ
CONTRATISTA

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
CAROL VALERIA CARRERA VELEZ

ING. CAROL CARRERA VÉLEZ
FISCALIZADORA DE CONTRATO

LABOCYV S.A.S	**Oficio**	LAB-DE-RG-009 Versión: 02	AMER15862

Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-165-O.
Francisco de Orellana, 04 de junio de 2026

Estimado.
Víctor Hugo Zapata Gonzales
Representante Legal
CONSORCIO RIVERSJAZ
Presente.

ASUNTO: Entrega del INFORME LABOCYV #: 001 - CRJAZ.

De mi consideración.

Expreso un atento y cordial saludo a ustedes a la vez deseándoles éxitos en sus funciones diarias que desempeñan acertadamente.

La presente tiene como finalidad remitir el informe de los resultados obtenidos en los ensayos de **COMPRESIÓN A MUESTRAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 6X12" DE LOS ELEMENTOS: PLINTOS, MUROS, CADENAS Y COLUMNAS A 23, 19, 14 Y 9 DÍAS DE CURADO** de la obra: *"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO"*

Se adjunta un total de 1 hoja.

Sin otro particular, agradecemos por tomarnos en cuenta y ser parte del control de calidad en su obra.

Atentamente;

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Tlgo. Mario Isaac Morales Villarroel.
GERENTE GENERAL.
LABOCYV S.A.S.

Elaborado por:
Esp. Dayana Meneses.

Recibido por:
Nombres: Jessica Moreira S.
C.I: 1308890076
Fecha: 04-06-2026
Firma:

Oficio Nro. LABOCYV-GG-2026-165-O.
Francisco de Orellana, 04 de junio de 2026

Estimado.
Víctor Hugo Zapata Gonzales
Representante Legal
CONSORCIO RIVERSJAZ
Presente.

ASUNTO: Entrega del INFORME LABOCYV #: 001 - CRJAZ.

De mi consideración.

Expreso un atento y cordial saludo a ustedes a la vez deseándoles éxitos en sus funciones diarias que desempeñan acertadamente.

La presente tiene como finalidad remitir el informe de los resultados obtenidos en los ensayos de **COMPRESIÓN A MUESTRAS CILÍNDRICAS DE HORMIGÓN 6X12" DE LOS ELEMENTOS: PLINTOS, MUROS, CADENAS Y COLUMNAS A 23, 19, 14 Y 9 DÍAS DE CURADO** de la obra*: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UE FISCOMISIONAL P. RICARDO NARDI UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO"*

Se adjunta un total de 1 hoja.

Sin otro particular, agradecemos por tomarnos en cuenta y ser parte del control de calidad en su obra.

Atentamente;

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Tlgo. Mario Isaac Morales Villarroel.
GERENTE GENERAL.
LABOCYV S.A.S.

Elaborado por:
Esp. Dayana Meneses.

Recibido por:

Nombres: _____

C.I: _____

Fecha: _____

Firma: _____

LABOCYV S.A.S	**Control de resistencia a la compresión simple**	LAB-EN-RG-008 Versión: 02 AMER15862

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CUBIERTA 30X40 Y ALTAR PATRIO, MANTENIMIENTO DE CANCHA CUBIERTA EXISTENTE, Y CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS DEL BAR ESCOLAR PARA LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL PADRE RICARDO NARDI, UBICADA EN LA PARROQUIA PUERTO PUERTO MURIALDO DEL CANTÓN LORETO".

UBICACIÓN: U. E. F. PADRE RICARDO NARDI - PARROQUIA PUERTO MURIALDO

CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO.

CONTRATISTA: CONSORCIO RIVERSJAZ

FISCALIZADOR: ING. CAROL CARRERA VÉLEZ - GADML

FECHA DE INFORME: 4/6/2026

CALIBRACIÓN DE PRENSA: TBTCTN-2000-2704

REFRENTADO: NO ADHERIDO

INFORME LABOCYV #: 001 - CRJAZ

1 KN = 101,97 Kilogramos

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE - F´c= 180 Y 210 Kg./cm2

NORMA: INEN 1573 - ASTM C 39

Nº Muestra	ELEMENTO FUNDIDO	Asentamiento cms.	ϕ muestra cms.	Altura muestra cms.	Peso muestra gr.	Area muestra cm2	Fecha de Fundición	Edad días	Fecha de Rotura	Carga KN	Carga Kgr.	Resistencia obtenida Kg./cm2	Resistencia Maxima a 28 días Kg./cm2	% de resistencia obtenida	% de resistencia requerida	Tipo de Fract.
1	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS		15,2	30,4	12858	181,5	11/5/2026	23	3/6/2026	359,70	36679	**202,1**	210	**96,3**	93	3
2	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS		15,2	30,3	12514	181,5	11/5/2026	23	3/6/2026	367,21	37444	**206,4**	210	**98,3**	93	2
1	HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS		15,2	30,2	12326	181,5	15/5/2026	19	3/6/2026	295,60	30142	**166,1**	180	**92,3**	87	5
2	HORMIGÓN SIMPLE EN MUROS		15,2	30,3	12504	181,5	15/5/2026	19	3/6/2026	301,24	30717	**169,3**	180	**94,0**	87	3
1	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS		15,1	30,4	12557	179,1	20/5/2026	14	3/6/2026	325,43	33184	**185,3**	210	**88,2**	80	5
2	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS		15,2	30,3	12734	181,5	20/5/2026	14	3/6/2026	311,65	31779	**175,1**	210	**83,4**	80	2
1	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS		15,2	30,2	12659	181,5	25/5/2026	9	3/6/2026	317,85	32411	**178,6**	210	**85,1**	65	2
2	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS		15,1	30,3	12517	179,1	25/5/2026	9	3/6/2026	333,22	33978	**189,7**	210	**90,4**	65	3

OBSERVACIONES: MUESTRAS TOMADAS Y TRAIDAS AL LABORATORIO POR EL CONTRATISTA

LAS MUESTRAS ENSAYADAS SI CUMPLEN CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA EN LOS DIFERENTES DÍAS DE CURADO.


Presente en los ensayos de compresión: Ing. Carol Carrera Vélez - FISCALIZADORA e Ing. Dalia Sanmartin Torres - ADMINISTRADORA DEL CONTRATO


Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Tlgo. Mario Morales Villarroel
LABORATORISTA
ACI - Nº 1888783

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
FRANK LEONEL ALCIVAR HERRERA

Ing. Civil Frank Alcívar Herrera
COORD. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SENESCYT: 1016-15-1435692

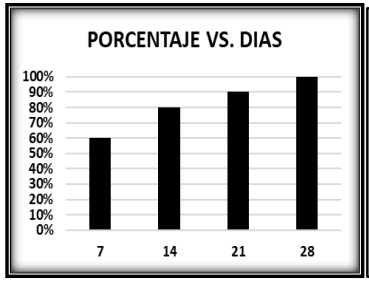

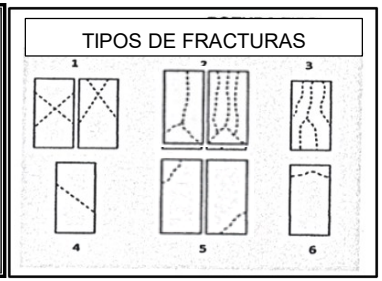

INFORME DE MANTENIMIENTO Y DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

DATOS DEL CLIENTE

Cliente	**LABOCYV S.A.S.**
Dirección	Antonio Llori y Río Negro - El Coca
Contacto	Mario Morales Villaroel
Informe Número	**LABOCYV-0226-WPS30-2703**
Ubicación del equipo	Laboratorio de ensayo de materiales
Condiciones ambientales:	
Temperatura ambiente	27 +/- 2 °C **HR** 71 +/- 5 % HR
Fecha de emisión del informe	23 de marzo del 2026

EQUIPO BAJO PRUEBA

Equipo	**Balanza de precisión**	
Marca	CAS/HIWEIGH	
CÓDIGO		
Modelo	WPS30	
Serie	XH24030040441	
Max	30	kg
d=	0,001	kg
e=	0,001	kg
Clase	III	

PRUEBAS METROLÓGICAS

EXCENTRICIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Carga Ensayo kg	**Posición** kg	**Lectura** kg	**Desviación Centro** kg
10,000	**10,000**	**Centro**	**10,001**	**0,000**
10,000	**10,000**	Fondo Izquierdo	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Fondo Derecha	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Frente Derecha	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Frente Izquierda	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Centro	10,001	0,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Excentricidad	0,000	kg
Error Máximo Permitido	0,003	kg

LINEALIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Valor Nominal kg	**Lectura Ascendente** kg	**Lectura Descendente** kg	**Histéresis** kg
0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000
0,010	**0,010**	0,010	0,010	0,000
0,100	**0,100**	0,100	0,100	0,000
1,001	**0,500**	0,500	0,500	0,000
2,002	**1,000**	1,000	1,000	0,000
5,004	**5,000**	5,000	5,000	0,000
10,008	**10,000**	10,000	10,000	0,000
20,017	**20,000**	20,000	20,001	0,001
30,025	**30,000**	30,001	30,002	0,001

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Histéresis Máximo	0,001	kg
Error Máximo Permitido	0,002	kg
Desviación Standard	0,00044	kg

REPETIBILIDAD

Unidades	**Vacío** kg	**Carga** kg	**Carga - Vacío** kg
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,001	15,001
	0,0	15,000	15,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Desviación Standard	0,0	kg
Error Máximo Permitido	0,0	kg

SENSIBILIDAD

Carga de Ensayo	**Lectura**	**Desviación**
30,000	30,001	0,001

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Máximo Permitido	0,003	

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA DE LOS ENSAYOS DE MEDICIÓN

μ cal=	0,0016	kg

La incertidumbre combinada ha sido estimada evaluando todos los factores que influyen sobre el resultado medido. Los factores a considerar son repetibilidad, sensibilidad, no linealidad, carga descentrada, incertidumbre de las pesas patrón y resolución de la balanza.

μ_{cal} = **Incertidumbre típica de calibración**

k = **Factor de cobertura (probabilidad de cobertura de 95,45%)**

U = **Incertidumbre expandida de la medición** $U_{\mu cal} * k$ (**k**=2)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo a los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

CORRECTAMENTE: _X_ USO CONDICIONADO:__ DENTRO DEL EMP: _X_ FUERA DEL EMP: __

Observaciones: EMP (Error Máximo Permisible)

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Se realiza revisión técnica y verificación previa para determinar el estado inicial de la balanza.
Se realiza mantenimiento, ajustes de calibración siguiendo el procedimiento dado por los fabricantes o por experiencia adquirida.
Se realiza verificación para obtener los datos suficientes para llenar el Informe Técnico de Mantenimiento y Ajustes de Calibración
La verificación consiste en pruebas de carga excéntrica, linealidad, repetibilidad, sensibilidad, cálculos de la desviación estándar de linealidad y repetibilidad, estimación de la incertidumbre combinada de calibración.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PESAS PATRÓN UTILIZADAS

Juego de Pesas:	B132196801	Certificado No.: SECM-M-2024-255	Clase:	E2
Juego de Pesas:	D21, D22	Certificado No.: SECM-M-2022-256	Clase:	F2
Juego de Pesas:	B149512904	Certificado No.: SECM-M-2022-254	Clase:	F1

Para las pruebas metrológicas de verificación y ajustes de calibración se utilizó pesas con trazabilidad al SI a través del patrón nacional de masa del Laboratorio Nacional de Metrología.

TIPO DE TRABAJO REALIZADO

AJUSTES _X_ MANTENIMIENTO _X_ REPARACIÓN ____ INSTALACIÓN __ VERIFICACIÓN _X_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza revisión técnica, mantenimiento preventivo, ajustes de calibración y verificación.
La balanza se encuentra funcionando correctamente y dento de los errores máximos permisibles(emp).
Los resultados están únicamente relacionados con el equipo descrito en el presente informe técnico.
El presente informe técnico debe ser reproducido por entero para evitar posible mala interpretación de los resultados
Se adjunta el certificado de calibración de las masas utilizadas para las pruebas de verificación.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



Fecha de revisión **27**-febrero-2026 **Próxima revisión** febrero - 2027

Responsable Ing. Andrés Méndez B. **Firma**

Firmado electrónicamente por:
OLGER ANDRES MENDEZ BEDON
Validez únicamente con FirmaEC

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

CERTIFICADO TÉCNICO DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Informe No LABOCYV.SAS-0226-TBTCTN.2000-2704
Fecha de calibración 27 de febrero del 2026

Cliente	**LABOCYV SAS**
Ubicación	Antonio Llori y Río Negro - El Coca
Contacto	Mario Morales Villaroel
Fecha de emisión	24 de marzo del 2026
Condiciones ambientales	27 +/- 2 **°C;** 71 +/- 5 **% HR**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03
Serie	S/N
Resolución	0,1 kN

PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	TBTCTM - 2000(N)
Serie	2105
Capacidad	2 000 kN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CALIBRACIÓN

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	MATEST
Modelo	C138PN295
Serie	C138PN295/AI/0001
Resolución	0,00 1 kN / 0,01 kN

CELDA DE CARGA 3 000 kN

Marca	MATEST
Modelo	C140-08
Serie	C140-08/AI/0006

RANGO de 20 kN a 200 kN

Certificado INEN	LNM-F-2025-14
Fecha de calibración	2025/03/21

RANGO de 300 kN a 3 000kN

Certificado INEN	LNM-F-2025-15
Fecha de calibración	2025/03/27

REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS

Documentos
Norma ASTM E74-04: Standard Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the Force Indication of Testing Machines.

Criterio de aceptación
Error máximo aceptable **+/-**1 % de la carga aplicada **(**ASTM E4-03)

Vigencia
Se recomienda realizar una nueva verificación y/o ajustes de calibración en 12 meses o menos y no más de 18 meses, cuando el equipo es movido a otro sitio y/o se tenga duda de su precisión **(**ASTM E4-03)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

Correctamente _X_ **En tolerancias _X_** **Uso condicionado __**

Observaciones
Se realiza revisión técnica, ajustes de calibración y verificación.
Se utiliza un transductor digital certificado en 200 kN y 3000 kN con trazabilidad al INEN.

Procedimiento utilizado: MVC-PRENSA-010-REV.12

Realizado Ing. Andrés Méndez B.
ASISTENCIA TÉCNICA

Firma

Firmado electrónicamente por:
OLGER ANDRES MENDEZ BEDON
Validar únicamente con FirmaEC

Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

HOJA DE DATOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA			
UNIDAD DIGITAL DE LECTURA		**PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL**	
Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT	**Marca**	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03	**Modelo**	TBTCTM - 2000(N)
Serie	S/N	**Serie**	2105
Resolución	0,1 kN	**Capacidad**	2 000 kN

LECTURAS OBTENIDAS ANTES DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Rango compresión 25 kN a 2 000 kN

LECTURAS FUERZA	PRENSA APLICADA	LECTURAS PATRÓN TEST 1	*ERROR ABSOLUTO*	ERROR %	EMP %
kN	*kgf*	*kN*	*kN*		
50	5099	49,36	0,64	**1,28**	**1,0**
100	10197	99,68	0,32	**0,32**	**1,0**
200	20394	200,83	0,83	**-0,42**	**1,0**
400	40788	398,34	1,66	**0,42**	**1,0**
600	61182	597,75	2,25	**0,38**	**1,0**
800	81576	797,18	2,82	**0,35**	**1,0**
1000	101970	996,31	3,69	**0,37**	**1,0**
1200	122364	1195,06	4,94	**0,41**	**1,0**
1400	142758	1393,98	6,02	**0,43**	**1,0**
1600	163152	1592,55	7,45	**0,47**	**1,0**
1800	183546	1791,79	8,21	**0,46**	**1,0**
2000	203940	1989,12	10,88	**0,54**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible


Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

LECTURAS OBTENIDAS DESPUÉS DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

LECTURAS	PRENSA	CELDA DIGITAL PATRÓN 3 000 kN				*ERROR*	*INCERTIDUMBRE*		ERROR	EMP
FUERZA	APLICADA	TEST 1	TEST 2	TEST 3	*PROMEDIO*	*PROMEDIO*	*U (k=2)*		%	%
kN	*kgf*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*		*kN*		
50	5099	50,12	50,08	50,10	**50,10**	-0,10	+/-	0,08	**-0,20**	**1,0**
100	10197	100,24	100,29	100,11	**100,21**	-0,21	+/-	0,21	**-0,21**	**1,0**
200	20394	200,37	200,58	200,48	**200,48**	-0,48	+/-	0,26	**-0,24**	**1,0**
400	40788	400,67	401,15	400,91	**400,91**	-0,91	+/-	0,55	**-0,23**	**1,0**
600	61182	601,57	601,17	601,37	**601,37**	-1,37	+/-	0,55	**-0,23**	**1,0**
800	81576	800,97	802,15	801,56	**801,56**	-1,56	+/-	1,28	**-0,19**	**1,0**
1000	101970	1001,09	1002,17	1001,63	**1001,63**	-1,63	+/-	1,24	**-0,16**	**1,0**
1200	122364	1199,83	1201,28	1200,56	**1200,56**	-0,55	+/-	1,62	**-0,05**	**1,0**
1400	142758	1399,33	1401,81	1400,57	**1400,57**	-0,57	+/-	2,62	**-0,04**	**1,0**
1600	163152	1598,96	1602,27	1600,62	**1600,62**	-0,62	+/-	3,45	**-0,04**	**1,0**
1800	183546	1798,01	1802,21	1800,11	**1800,11**	-0,11	+/-	4,34	**-0,01**	**1,0**
2000	203940	2000,90	2003,37	2002,14	**2002,14**	-2,13	+/-	2,75	**-0,11**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible

Curva: (Error +/- Incertidumbre) en % vs (Fuerza Aplicada Celda Patrón) en kN

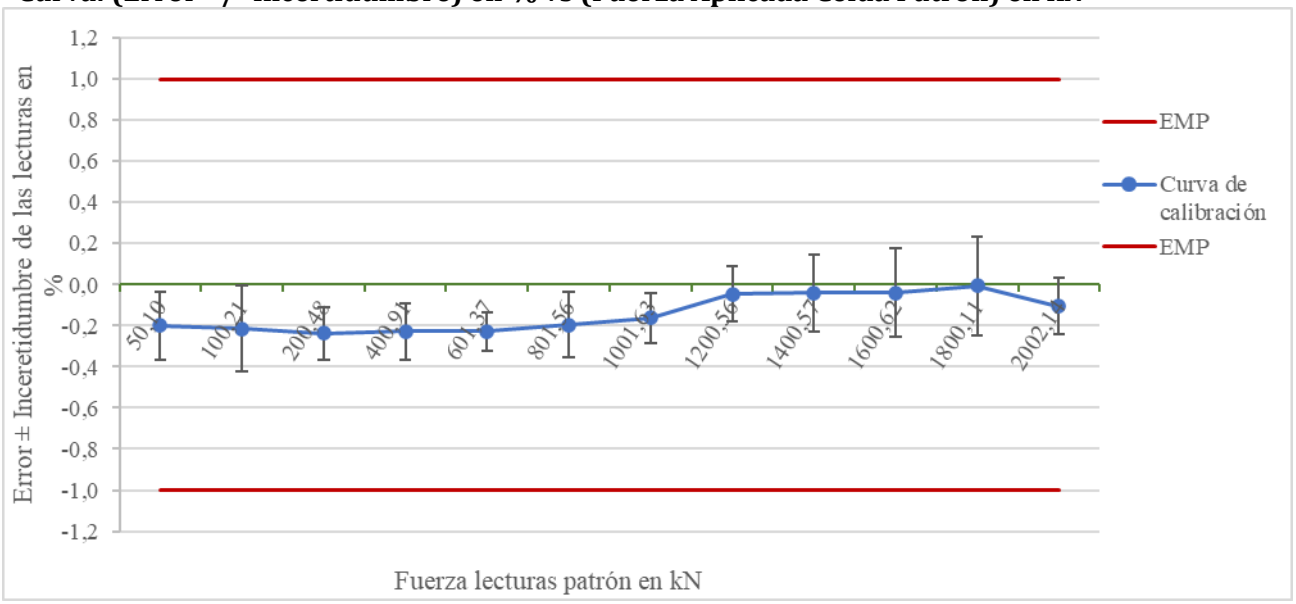


EMP=Error Máximo Permisible

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Compresión



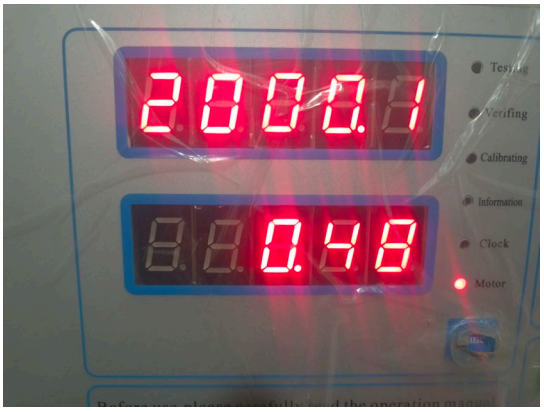



Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

CONTRATACIÓN PARA LA "ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"

En la ciudad de Loreto, cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los catorce días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, comparece por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, debidamente representado por el señor Kleber Fabián Olalla Torres, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, quien en lo posterior se le denominará "EL CONTRATANTE"; y, por otra parte, al señor Roberto Rolando Salinas Moreno, con RUC 1500679574001, a quien más adelante, para efectos de este contrato se le denominará "EL CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1.- Se cuenta con el Informe Técnico, Estudio de Mercado, Especificaciones Técnicas y demás información necesaria para la contratación, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, de la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO".**

1.2.- El Ing. Milton Chacha Analista de Compras Públicas del GAD Municipal de Loreto, mediante Certificado de Verificación de Bienes y Servicios Normalizados en el Catálogo Electrónico Nro. 115-CCP-2025 de fecha 18 de junio de 2025, CERTIFICA que la contratación de la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"**, *NO se encuentra disponible en el Catálogo Electrónico del portal de Compras Públicas, con lo cual se ha procedido en estricto cumplimiento con el primer inciso del Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 45 de su Reglamento General; y; que, Que, el* ***CPC (452100011)*** *seleccionados por el área requirente,* ***NO*** *se encuentra restringido, conforme consulta en el portal de COMPRAS PÚBLICAS, con lo cual se ha procedido en estricto cumplimiento con el primer inciso del Artículo 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP. Que, el* ***CPC (452100011) NO*** *se encuentra dentro del ANEXO 4 - REQUERIMIENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC, cumpliendo con el artículo 87 de la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública.*

1.3.-Se cuenta con la autorización con código de solicitud AUTCE-09-25-1080, en el que el COMITÉ DE GESTIÓN DE CATALOGACIÓN mediante ACTA-CC 059-2025, dejó constancia de lo siguiente *"De la revisión de la solicitud presentada por el MUNICIPIO DE LORETO, se verifica que en el Catálogo electrónico únicamente constan neumáticos para automóviles, camionetas, VAN y camiones, mientras que la entidad requiere neumáticos para vehículos pesados y maquinaria, los cuales no se encuentran disponibles en el Catálogo. Conforme al "Instructivo de AUTCES", la entidad entregó la documentación e información necesaria para el respectivo análisis. Por tanto, se recomienda autorizar la solicitud de desbloqueo de CPC. La autorización corresponde únicamente al desbloqueo del CPC restringido. Cabe señalar que la entidad contratante deberá proceder con la contratación en función de la documentación presentada, sin modificar el tipo de contratación. Asimismo, este Comité, en el marco de sus atribuciones, deja constancia de que la selección de la modalidad de contratación y la determinación del presupuesto referencial constituyen responsabilidades exclusivas de la entidad contratante.*

1.4.- Se cuenta con el certificado de compromiso presupuestario N° 751 de fecha 1 de julio de 2025, emitida por la Ing. Carmela de los Ángeles Asipuela Vasco, Directora de Gestión

Financiera, y la Lic. Marlene Lorena Toro Valencia jefa de presupuesto, con cargo a la partida presupuestaria N° 4.1.1.7.3.08.13 denominada "Repuestos y Accesorios", para el proyecto de contratación de **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO".**

PARTIDAS PRESUPUESTARIA					
Dirección	Partida	Nombre	Proyecto	Objeto	Valor
411 - DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	730813	Repuestos y Accesorios	Producto : 41173022 - ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO		40.744,86
				Valor	40.744,86

1.5.- El Arq. Washington Jaramillo, Director de Planificación mediante CERTIFICACIÓN POA 2025 N° 142-2025 con fecha 01 de julio de 2025, CERTIFICA que la contratación de la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"**, se encuentra planificada y con los recursos disponibles en la Planificación Operativa Anual (POA) 2025.

1.6.- El Licenciado Jaime René Jiménez, Coordinador de Compras Públicas, mediante CERTIFICACION PAC 064-2025, de fecha 04 de julio de 2025, CERTIFICA de conformidad a los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP, en concordancia con el artículo 43 y 45 de su Reglamento General, esta dependencia CERTIFICA que el objeto de contratación "ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO / ", SI se encuentra debidamente planificado en el Plan Anual de Contratación PAC - 2025 y publicado en el portal de compras públicas.

1.7.- Previo los informes y los estudios respectivos emitidos por los Técnicos de la Institución, la máxima autoridad mediante Resolución Administrativa No.150-GADML-2025, aprobación de pliegos de Subasta inversa Electrónica código proceso SIE-GADML-2025-30 de fecha 17 de septiembre de 2025, resolvió: ***Autorizar*** *el inicio del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica* ***Nro. SIE- GADML-2025-30****, cuyo objeto de contratación es la* ***"Adquisición de Neumáticos No Catalogados para Vehículos Pesados y Maquinaria del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto",*** *con un presupuesto referencial de* ***USD 40.744,86 (CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS), sin incluir el IVA,*** *y un plazo estimado* ***de treinta (30) días*** *contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 47 de la LOSNCP y en concordancia con el artículo 129 de su Reglamento General.* ***Artículo 2.- Aprobar*** *los pliegos y el cronograma correspondientes al procedimiento Subasta Inversa Electrónica* ***Nro. SIE-GADML-2025-30****, cuyo objeto de contratación es la* ***"Adquisición de Neumáticos No Catalogados para Vehículos Pesados y Maquinaria del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto",*** *en observancia de lo establecido en la LOSNCP, su Reglamento General y la Normativa Secundaria de Sistema Nacional de Contratación Pública.* ***Artículo 3.-*** *Disponer la convocatoria, a través del Portal de Contratación Pública, del procedimiento Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-GADML-2025-30.* ***Artículo 4.- Designar,*** *conforme lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento General de la LOSNCP, al Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, con cédula de ciudadanía Nro. 1311012338, en calidad de Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, quien cuenta con la Certificación como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública Nro. AHQSuyxfkK de fecha*

24 de junio de 2023, para que lleve a cabo todas las etapas de la fase precontractual del presente proceso. ***Artículo 5.-*** *Disponer al Coordinador de Compras Públicas del GADML la publicación de la presente resolución y de toda la información relevante en el Portal de Contratación Pública.*

1.8.- Se realizó la respectiva convocatoria el 17 de septiembre del 2025, a través del Portal de Contratación Pública.

1.9.- Mediante memorando Nro. GADMCL-CCP-2025-0820-M-GD, de fecha 25 de septiembre de 2025, el Licenciado Jaime René Jiménez, Coordinador de Compras Públicas, realiza la entrega de dos ofertas técnicas en formato MFC-USHAY presentadas oportunamente a través del Portal de Contratación Pública hasta la fecha límite de recepción de propuestas:

Nro.	Oferentes	Contenido de las ofertas técnicas
1	LLANTICENTRO L&M S.A	Nombre / Tipo / Tamaño part0 — Archivo USHAY — 8.625 KB part1 — Archivo USHAY — 8.625 KB part2 — Archivo USHAY — 8.625 KB part3 — Archivo USHAY — 8.625 KB part4 — Archivo USHAY — 1 KB
2	IMPORTADORA HELLBAM S.A.	Nombre / Tipo / Tamaño part0 — Archivo USHAY — 8.665 KB part1 — Archivo USHAY — 8.665 KB part2 — Archivo USHAY — 8.665 KB part3 — Archivo USHAY — 1 KB

1.10.- Mediante Acta de Calificación de ofertas para el proceso de Subasta Inversa Electrónica código **Nº SIE-GADML-2025-30** de fecha 01 de octubre de 2025, *Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, con cédula de ciudadanía Nro. 1311012338, en calidad de Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura*, técnico responsable etapa precontractual, procede con la calificación de las ofertas en el numeral 4. RESULTADOS, manifiesta lo siguiente*:(…) Se CALIFICAN las ofertas técnicas de los oferentes IMPORTADORA HELLBAM S.A. con RUC: 2290350487001 cuyo representante Legal es el Ing. MONTERO QUIROZ WILSON EDMUNDO, con C.I. 0201844263 y el Sr. SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO con RUC: 1500679574001; por cumplir con los requerimientos mínimos legales, técnicos y económicos exigidos en el pliego del presente proceso de contratación. (…)".*

1.11.-Mediante memorando Nro. GADMCL-CCP-2025-0820-M-GD, de fecha 25 de septiembre de 2025, el Licenciado Jaime René Jiménez, Coordinador de Compras Públicas, en vista del triste fallecimiento del Ing. Carlos Andrés Malla Valdiviezo, con cédula de ciudadanía Nro. 1311012338, en calidad de Coordinador de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, delegado para llevar a cabo la estaba precontractual del proceso de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADML-2025-30, cuyo objeto es la "Adquisición de neumáticos no catalogados para vehículos pesados y maquinaria del parque automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto" solicita a la máxima autoridad muy respetuosamente se sirva designar a un nuevo servidor que asuma la responsabilidad de llevar a cabo la fase precontractual del citado procedimiento.

1.12.-Mediante Resolución Administrativa No.206-GADML-2025, aprobación de pliegos de Subasta inversa Electrónica código proceso SIE-GADML-2025-30 de fecha 17 de octubre de 2025, resolvió: **Artículo 2.-** Designar al Ing. Juan Pedro Sanmartín Eras, con cédula de ciudadanía Nro. 1724960479, en su calidad de Coordinador de Mantenimiento Vial, como nuevo servidor responsable

de llevar a cabo la fase precontractual del procedimiento Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-GADML-2025-30, cuyo objeto es la "Adquisición de Neumáticos No Catalogados para Vehículos Pesados y Maquinaria del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto" para que continúe con la etapa de recomendación de adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, y con las demás actuaciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación.

1.13.- Mediante informe de resultados y recomendación de adjudicación del proceso Subasta Inversa Electrónica No. **SIE-GADML-2025-30** de fecha 17 de octubre de 2025, Ing. Juan Pedro Sanmartín Eras, Coordinador de Mantenimiento Vial, Técnico responsable etapa precontractual, en recomendaciones dice lo siguiente: *"(…) En la fase de puja electrónica, el oferente SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO, con RUC Nro. 1500679574001, resultó ganador de la puja con la oferta económica de USD 38,590.00, valor inferior al presupuesto referencial, cumpliendo con los requisitos legales, técnicos y económicos exigidos. IV. RECOMENDACIÓN En mérito de lo expuesto y de acuerdo con el resultado de la puja electrónica registrada en el Portal de Compras Públicas, se recomienda adjudicar el proceso SIE-GADML-2025-30 al oferente: SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO RUC: 1500679574001 Monto adjudicado: USD 38,590.00 (sin IVA) Objeto: Adquisición de Neumáticos No Catalogados para Vehículos Pesados y Maquinaria del Parque Automotor del GAD Municipal del Cantón Loreto. (…).*

1.14.- Mediante Resolución Administrativa de Adjudicación **No. 207-GADML-2025** de fecha de firma 17 de octubre de 2025, se resuelve: Adjudicar el contrato correspondiente al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica SIE-GADML-2025-30, cuyo objeto de contratación es la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO",** al oferente **SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO, con RUC 1500679574001,** por un monto de **USD 38,590.00 (treinta y ocho mil quinientos noventa dólares 00/100 centavos de los Estado Unidos de América),** sin incluir el IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de **30 días,** contado a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato, por haber cumplido con las condiciones mínimas de calidad, financieras y legales, exigidas en los documentos precontractuales, quien oferta el precio más bajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 89 del Reglamento General a la LOSNCP.

1.15.- Mediante oficio N° 10863, de fecha 24 de marzo del 2025, el Abg. Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, absuelve la consulta realizada por la Empresa pública Metropolitana de agua Potable de Quito, y en el numeral 3 manifiesta: ***"…Pronunciamiento, en el primer párrafo dice lo siguiente: "En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con los artículos 69 de la LOSNCP y 257 de su Reglamento General, el acto administrativo de adjudicación deberá causar estado antes de proceder a la suscripción en el portal COMPRAS PUBLICAS, periodo durante el cual los interesados pueden presentar impugnaciones. Una vez que la adjudicación ha causado estado, el adjudicatario tiene un término de quince días para suscribir el contrato. En caso de que el adjudicatario sea compromiso de consorcio o asociación, se le concede un término adicional de quince días, para la formalización del contrato. El adjudicatario podrá solicitar una ampliación del término para la suscripción del contrato antes de que este venza, siempre que justifique la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, dicha ampliación no podrá exceder de siete días y, bajo ninguna circunstancia, podrá otorgarse una prórroga sobre un término ya vencido"***.

1.16.- De conformidad al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 18, inciso tercero, en la parte pertinente dicen "…*En los procedimientos de contratación donde sea necesario estar registrado y habilitado en el RUP para participar, las entidades contratantes verificarán esta condición de los oferentes exclusivamente en la*

fecha y hora de: 1) apertura de ofertas: y, 2) suscripción del contrato…", disposición legal que se da cumplimiento con la constancia mediante la captura de pantalla que se adjunta a continuación y de la cual se constata que se encuentran debidamente habilitado en el RUP.



CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- Los que acrediten la calidad de los comparecientes;
- Pliego, Condiciones Generales y Particulares incluyendo las especificaciones técnicas, o términos de referencia del objeto de la contratación.
- Oferta presentada por el contratista.
- Certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;
- Resolución Administrativa de Aprobación de Pliegos;
- Resolución de Adjudicación
- Garantía Técnica;
- Pago de pliegos, certificado de no adeudar al Municipio, timbre; y,
- Los demás documentos que en virtud de la legislación vigente se requiere para formalización del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

3.1.- LA CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, esto es la contratación de la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"**.

TABLA DE PRECIOS Y CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO AJUSTADO	FÓRMULA VALOR TOTAL
	CAMION QMA 1340				
1	NEUMÁTICO 7.50 R15 LT MIXTA	UNIDAD	6	239,62	1.437,72
2	TUBO 7.50 R15 LT MIXTA	UNIDAD	6	21,78	130,68
3	DEFENSA 7.50 R15 LT MIXTA	UNIDAD	6	16,34	98,04

	CAMION 1339				-
4	NEUMÁTICO 8.25R16 DIRECCIONAL	UNIDAD	2	424,78	849,56
5	TUBO 8.25R16 DIRECCIONAL	UNIDAD	2	22,87	45,74
6	DEFENSA 8.25R16 DIRECCIONAL	UNIDAD	2	17,43	34,86
7	NEUMÁTICO 8.25R16 TRACCION	UNIDAD	4	424,78	1.699,12
8	TUBO 8.25R16 TRACCION	UNIDAD	4	22,87	91,48
9	DEFENSA8.25R16 TRACCION	UNIDAD	4	17,43	69,72
	CAMIONES QMA 1045-1046				-
10	NEUMÁTICO 7.50R16 DIRECCION	UNIDAD	8	305,31	2.442,48
11	TUBO 7.50R16 DIRECCION	UNIDAD	8	22,87	182,96
12	DEFENSA 7.50R16 DIRECCION	UNIDAD	8	17,43	139,44
13	NEUMÁTICO 7.50R16 TRACCION	UNIDAD	16	317,77	5.084,32
14	TUBO 7.50R16 TRACCION	UNIDAD	16	22,87	365,92
15	DEFENSA 7.50R16 TRACCION	UNIDAD	16	17,43	278,88
	BUS INTERNACIONAL QMA - 1101				-
16	NEUMÁTICO 245/70 R19.5 DIRECCION	UNIDAD	4	319,23	1.276,92
17	NEUMÁTICO 245/70 R19.5 TRACCION	UNIDAD	8	413,89	3.311,12
	MOTONIVELADORA				-
18	NEUMÁTICO 14.00-24	UNIDAD	8	980,26	7.842,08
19	TUBO 14.00-24	UNIDAD	8	54,46	435,68
20	DEFENSA 14.00-24	UNIDAD	8	38,12	304,96
	RETROEXCAVADORA KOMATSU W96R				-
21	NEUMÁTICO 12.5/80/18 DIRECCION	UNIDAD	4	506,46	2.025,84
22	TUBO 12.5/80/18 DIRECCION	UNIDAD	4	38,12	152,48
23	DEFENSA 12.5/80/18 DIRECCION	UNIDAD	4	32,68	130,72
	RETROEXCAVADORAS KOMATSU				-
24	NEUMÁTICO 19.5L24 TRACCION	UNIDAD	6	812,60	4.875,60
25	TUBO 19.5L24 TRACCION	UNIDAD	6	65,35	392,10

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

26	DEFENSA 19.5L24 TRACCION	UNIDAD	6	54,46	326,76
27	NEUMATICO 14-17.5 DIRECCIÓN	UNIDAD	6	475,95	2.855,70
28	TUBO 14-17.5 DIRECCION	UNIDAD	6	63,84	383,04
29	DEFENSA 14-17.5 DIRECCION	UNIDAD	6	50,16	300,96
	MINICARGADORA BOBCAT S590				-
30	NEUMÁTICOS 10/16.5	UNIDAD	4	256,28	1.025,12
				TOTAL	**38.590,00**

CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1.- El precio del contrato, que el CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA es por el valor de **USD 38,590.00 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES 00/100 CENTAVOS DE LOS ESTADO UNIDOS DE AMÉRICA), SIN INCLUIR EL IVA.**

4.2.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

4.3.- La Contratista declara que, durante todas las fases de la contratación, no estar inmerso en prácticas o conductas ilícitas o éticamente incorrectas.

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:

De acuerdo al pliego el pago se realizará de la siguiente manera:

Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes posterior a la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva, de conformidad a lo establecido en los artículos 319 y 325 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a entera satisfacción de la entidad contratante.

Será causa de responsabilidad de los funcionarios competentes el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS:

6.1- Por el tipo de Contratación no contempla Garantía de buen uso del anticipo por cuanto no se entrega anticipo y tampoco por el monto de la contratación, está sujeta a la exigencia de rendir garantía de fiel cumplimiento del contrato.

6.2.- El oferente presenta la Garantía Técnica que dice lo siguiente: *Yo, SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO, con RUC Nro. 1500679574001, en calidad de adjudicatario del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-GADML-202530, cuyo objeto es la "Adquisición de Neumáticos No Catalogados para Vehículos Pesados y Maquinaria del Parque Automotor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto", presento la siguiente garantía técnica: 1. Cobertura de la*

Garantía La garantía tendrá una vigencia mínima de doce (12) meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los bienes. o Cubre de manera expresa los defectos de fabricación, materiales y mano de obra que pudieran presentarse durante el período de vigencia. 2. Alcance de la Garantía o Incluye la reparación, en su defecto, la sustitución del neumático defectuoso, sin costo adicional para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto. La sustitución se realizará por un bien nuevo de iguales características técnicas y de la misma marca ofrecida, garantizando su correcto funcionamiento. 3. Exclusiones La garantía no cubre daños ocasionados por mal uso, accidentes, modificaciones no autorizadas, condiciones inadecuadas de operación o falta de mantenimiento preventivo. 4. Responsabilidad y Cumplimiento Como oferente me obligo a coordinar con los fabricantes, distribuidores vendedores autorizados en el Ecuador de las marcas ofertadas, a fin de garantizar el cumplimiento de la presente carta compromiso. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a las acciones administrativas y legales correspondientes conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO

7.1.- El plazo total para la entrega de los bienes contratados es de **TREINTA (30)** días, contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. - PRÓRROGAS DE PLAZO:

El GAD Municipal de Loreto, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos y siempre que el CONTRATISTA así solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

Por causa de fuerza mayor o caso fortuito, aceptados como tales por el GAD Municipal de Loreto. El Contratista tiene la responsabilidad de actuar con toda la diligencia razonable para superar la imposibilidad producida por causa de fuerza mayor o caso fortuito. En estos casos, el plazo se prorrogará por un período igual al tiempo de duración de las causas indicadas.

Por suspensión ordenadas por el GAD Municipal de Loreto, y que no se deban a casusas imputables al CONTRATISTA.

CLÁUSULA NOVENA. - MULTAS

9.1.- De acuerdo al Art. 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública reformado, las multas se impondrán por retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al plazo establecido y/o al cronograma, las que se impondrán por cada día de retardo y se calcularán sobre la valoración de la obligación incumplida conforme los parámetros que determine el Reglamento General.

La multa se fundamentará en el principio de proporcionalidad, de acuerdo con la gravedad del incumplimiento debidamente calificado con relación al objeto contractual. El procedimiento para la imposición de multas será el regulado a través del Reglamento de la LOSNCP, respetando el derecho el debido proceso y concluirá con la emisión del acto administrativo de imposición de la multa.

Las multas impuestas al contratista pueden ser impugnadas siguiendo la cláusula contractual, en sede administrativa, a través de los respectivos recursos, o en sede judicial o arbitral, de ser el

caso. En todo lo no previsto en este inciso, se aplicará las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Administrativo, con relación al procedimiento administrativo.

Las multas obedecen al ejercicio de la facultad coercitiva de la administración pública, cuyo fin es que el contratista corrija el retardo o el incumplimiento contractual acusado durante la ejecución. Su detección e imposición debe ser oportuna, razón por la cual, hacerlo de manera paralela a la terminación unilateral del contrato o posterior a ella acarrea su ilegalidad.

CLÁUSULA DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN:

10.1.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen los artículos 78 de la LOSNCP, la subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 79 de la Ley ibídem y 266 del Reglamento General de la misma.

10.2.- EL CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

11.1.- El contratante designa a la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, con cédula de ciudadanía Nro. 1315120483 - Analista de OO.PP; y, con Certificado como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública bajo el código Nro. hJYH8NpRhf (vigente desde el 18 de enero de 2025); o quien haga sus veces, como Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los artículos 295 hasta el 303 de su Reglamento General; dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículo 41.1 y 41.3 de la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica; y, si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá exigir el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en la referida fase por parte del Administrador de Contrato.

11.2.- El contratante podrá cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

11.3.- El Administrador del Contrato deberá verificar si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en cuyo caso deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase, de conformidad con lo dispuesto en el art. 40.2, numeral 9. del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11.4. - Las atribuciones del Administrador del Contrato conforme lo determinado en el artículo 303 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son las siguientes:

1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;
2. Cumplir y hacer cumplir todas las obligaciones derivadas del contrato y los documentos que lo componen;
3. Adoptar las acciones para evitar retrasos injustificados en la ejecución del contrato;
4. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso;
5. Administrar las garantías correspondientes que se mantendrán vigentes durante todo el plazo de vigencia del contrato, esta obligación podrá ser coordinada con el tesorero de la entidad contratante o quien haga sus veces, a quien corresponde el control y custodia de las garantías. La responsabilidad por la gestión de las garantías será solidaria entre el administrador del contrato y el tesorero;
6. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;
7. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;
8. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;
9. Verificar que los movimientos de la cuenta bancaria del contratista correspondan estrictamente al devengamiento del anticipo y a lo correspondiente en la ejecución contractual;
10. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato sobre la base de las especificaciones técnicas o términos de referencia y en las condiciones establecidas en los pliegos del proceso;
11. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;
12. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;
13. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
14. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;

15. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de Valor de Agregado Ecuatoriano, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;
16. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista, la recepción del mismo;
17. Publicar en el Portal COMPRASPÚBLICAS durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o directrices que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;
18. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;
19. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante, la modificación de las características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra formalizada;
20. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,
21. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

12.1.-Terminación del contrato. - El contrato termina conforme lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2.-Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

1. Por incumplimiento del contratista;
2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o

fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

12.3.- Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo dispuesto en su Reglamento General.

DÉCIMA TERCERA. - TRABAJO PREFERENTE:

13.1.- El contratista está obligado a cumplir con lo dispuesto en el Art. 41.1 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporado mediante el artículo 34 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 488 del 30 de enero de 2024.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO:

14.1.- Por la naturaleza de la contratación, no aplica para el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

15.1.- De acuerdo al artículo 81 de la LOSNCP la recepción para la contratación de la **"ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"**, se realizará a entera satisfacción del CONTRATANTE, observando lo dispuesto en los Arts. 320 y 325 del Reglamento General de la LOSNCP; la liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 326 Ibídem y formará parte del acta que tendrá los efectos de definitivos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONOCIMIENTO:

16.1.- La Contratista, declara conocer perfectamente el sitio sobre el cual deberá ejecutar el objeto contractual y que ha recibido del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, la información suficiente y necesaria referente a las condiciones y demás factores y características del medio ambiente. Cualquier descuido, falta de apreciación, error u omisión del Contratista no le exime de responsabilidad ni le enerva de estas ni le disminuye la responsabilidad. De igual forma los precios acordados para la ejecución de los trabajos motivo del presente instrumento no podrán variar alegando desconocimiento de lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

17.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existente no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal

Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

17.2. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

17.3. - En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas acuerdan someterse a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de la Procuraduría General del Estado y a las siguientes normas:

a) Previo a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someterán a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de la Procuraduría General del Estado.

c) El Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías.

d) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO

19.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Loreto.

19.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EL CONTRATANTE:

Dirección: Provincia de Orellana, Cantón Loreto, parroquia Loreto, Ciudad de Loreto, Av. Rafael Andrade Chacón y Gregorio Urapari
Teléfono: (06)2-893-223 / Telefax: (06)-2- 893-239

E mail: gadloreto92@gmail.com

LA CONTRATISTA:

Dirección: Provincia Orellana, Cantón Orellana, Parroquia Puerto Francisco de Orellana (El Coca), Calle 6 De diciembre, Número S/N, Intersección Juan Montalvo, Número de Oficina Pb, Referencia frente a las Oficinas de la ESPE.
Teléfono: 062883345 / 0981663173
E-mail: mauroparco@hotmail.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

20.1.- Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que están suscribiendo.

20.2.- Para constancia de lo acordado, las partes intervinientes firman electrónicamente, en el lugar y fecha inicialmente indicados.

Firmado electrónicamente por:
KLEBER FABIAN OLALLA TORRES
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTÓN LORETO

Firmado electrónicamente por:
ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Roberto Rolando Salinas Moreno
CONTRATISTA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Agosto del 2026 16:30 **RUC:** 1560001830001 | **Entidad:** MUNICIPIO DE LORETO | **Usuario:** CAROLCARRERA92 | **[Cerrar Sesión]**

Consultar

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves		Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	Buscar Entidad	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	SIE-GADML-2025-30	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	**Desde:** 2025-07-01 **Hasta:** 2025-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Buscar Limpiar

Código	Entidad	Objeto del Proceso	Estado del	Provincia/	Presupuesto	Fecha de	Opciones

	Contratante		Proceso	Cantón	Referencial Total(sin iva)	Publicación
SIE-GADML-2025-30	MUNICIPIO DE LORETO	ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA VEHICULOS PESADOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	Finalizada	ORELLANA / LORETO	$40,744.86	2025-09-17 17:00:00

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.

CONTRATACIÓN PARA LA "ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"

En la ciudad de Loreto, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, a los 03 días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, comparece por una parte el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Loreto, debidamente representado por el señor Kleber Fabián Olalla Torres, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Loreto, quien en lo posterior se le denominará "EL CONTRATANTE"; y, por otra parte, el Sr. Roberto Rolando Salinas Moreno con RUC N° 1500679574001, quién más adelante, para efectos de este contrato se le denominará "EL CONTRATISTA". Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor de las siguientes clausulas:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES:

1.1.- Se cuenta con el Informe de necesidad, Especificaciones Técnicas, Estudio de Mercado y demás información necesaria para la contratación, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, de la "***ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO***".

1.2.- La Ing. Milton Chacha SP6 Analista de Compras Públicas del GAD Municipal de Loreto, mediante Certificado de Verificación en el Catálogo Electrónico Nro. 197-CCP-2025 de fecha 04 de diciembre de 2025, CERTIFICA que la contratación de la "***ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO***"", NO se encuentra disponible dentro de las modalidades vigentes del Catálogo Electrónico. Con lo cual se ha procedido en estricto cumplimiento con el primer inciso del Art. 46 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 66 de su Reglamento General; y; que, *el CPC (*333800211, 333800231, 333800212, 342501321, 354300113, 354302311*) seleccionados por el área requirente, para el presente procedimiento, NO se encuentra restringido en el portal de contratación públicas, por lo que su utilización se ajusta a la normativa aplicable.*

1.3.- Se cuenta con el certificado de compromiso presupuestario N° 967 de fecha 12 de diciembre de 2025, emitida por la Ing. Carmela de los Ángeles Asipuela Vasco, Directora de Gestión Financiera; y, la Ing. Marlene Lorena Toro Valencia, Área de presupuesto, con cargo a la partida N° 730819 denominada "Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos", para el proyecto de contratación de la "***ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO".***

PARTIDAS PRESUPUESTARIA

Partida	Nombre	Fuente	Proyecto	Valor
730803	Lubricantes	002	Producto : 41173017 - ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL LORETO	65.527,24
			Valor	65.527,24

1.4.- El Arq. Jorge Washington Jaramillo, Director de Planificación mediante CERTIFICACIÓN POA 2025 N° 256-2025 con fecha 12 de diciembre de 2025, CERTIFICA que la contratación de la "***ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO".*** se encuentra planificada y con los recursos disponibles en la Planificación Operativa Anual (POA) 2025.

1.5.- El Sr. Jaime René Jiménez R COORDINADOR DE COMPRAS PÚBLICAS, mediante CERTIFICACION PAC Nro. GADML-CCP-2025-112, de fecha 24 de diciembre de 2025, CERTIFICA que el objeto de contratación denominado para la ***"ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO",*** SI consta en el Plan Anual de Contrataciones PAC-2025.

1.6.- Mediante Informe de Análisis de Mejor Valor por Dinero, de fecha de 21 de noviembre de 2025, del proceso de contratación de **" *ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"*** elaborado por la Dirección de Gestión de Agua

Potable y Alcantarillado, el cual manifiesta lo siguiente: *En consecuencia, y de conformidad con los artículos 65 y 74 del Reglamento General de la LOSNCP, se determina que la modalidad adecuada para este proceso es la SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA. Se recomienda continuar con la fase precontractual del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, elaborando los pliegos conforme la normativa vigente y publicando el proceso en el Portal de Compras Públicas.*

1.7.- Previo los informes y los estudios respectivos emitidos por los Técnicos de la Institución, la máxima autoridad mediante Resolución Administrativa No.242-GADML-2025, aprobación de pliegos e inicio del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica código proceso SIE-GADML-2025-42 de fecha 29 de diciembre de 2025, resolvió: **Artículo 1.-**. Autorizar el inicio del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE GADML-2025-42, cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", con un presupuesto referencial de USD 65.527,24 (sesenta y cinco mil quinientos veintisiete dólares de los Estados Unidos de América con 24/100 centavos), sin incluir el IVA, y un plazo estimado para la ejecución contractual de treinta (30) días calendario, contados a partir del día siguiente a la suscripción del respectivo contrato, de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 257 de su Reglamento General. **Artículo 2.-** Aprobar los documentos que integran la fase preparatoria, incluidos los pliegos, cronograma y demás instrumentos técnicos y administrativos del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica Nro. SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto de contratación es la "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General. **Artículo 3.** Convocar a través del Portal de Contratación Pública, el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, con código SIE-GADML-2025-42. **Artículo 4.-** Designar a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, con cédula Nro. 1314792076, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, y con la Certificación como Operador del SNCP Nro. l3D4H6HiaO de fecha 08 de octubre de 2025, para que lleve a cabo las etapas de la fase precontractual y generar la siguiente documentación actas de preguntas, respuestas y aclaraciones, apertura de las ofertas; convalidación de errores; calificación, y acta de negoción, informe de evaluación de las ofertas realizado por el servidor designado para el efecto, en el que se recomiende a la máxima autoridad de forma expresa, la adjudicación o la declaratoria de desierto, según sea el caso, y demás documentación precontractual, previstas en la LOSNCP y su Reglamento General de aplicación. En concordancia con las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, particularmente aquellas establecidas en los numerales 1 y 7 del Informe DPO-0007-2025, el servidor designado y/o la comisión técnica evaluara los documentos presentados, conforme a cada uno de los requisitos establecidos en el pliego, en cuanto a validez tanto técnica como legal, para determinar si se ajustan a lo solicitado, con la finalidad de que la calificación de la etapa cumple/no cumple, incluya a los oferentes que ameriten pasar a la fase siguiente. **Artículo 5.-** Disponer al Coordinador de Compras Públicas, la publicación de la presente resolución y toda la información relevante en el portal de contratación públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. **Artículo 6.-** La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el portal de contratación pública.

.

1.8.- *Se realizó la respectiva convocatoria el 24 de diciembre del 2025, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.*

1.9.- Mediante memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0018-M-GD, de fecha 12 de enero de 2026, el Lcdo. Jaime Jiménez, Coordinador de Compras Públicas, remite a la Sra. Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, en el cual entrega seis ofertas técnicas en formato MFC-USHAY presentadas oportunamente a través del Portal de Contratación Pública hasta la fecha límite de recepción de propuestas, conforme se detalla a continuación:

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	NUMERO DE HOJAS POR OFERTAS
1	CARLOS ARTURO NARVAEZ MALDONADO	0912722717001	$ 65.516,37	30 DÍAS	24 archivos en PDF 12.0 MB
2	SANMARTIN ESPINOZA LEONARDO FLABIO	1500817653001	$ 65.519,90	30 DÍAS	36 archivos en PDF 18.4 MB

3	PRODUCTOS AUTOMOTRICES PRODUCTRIZ S.A.	1792501253001	$ 65.527,23	30 DÍAS	9 archivos en PDF 6.84 MB
4	ALOMIA SANTANDER ARIANA CAROLINA	1500594021001	$65.522,30	30 DIAS	37 archivos en PDF 18.2 MB
5	SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO	1500679574001	$65.527,00	30 DIAS	37 archivos en PDF 10.6 MB
6	SISTEMAS ENERGÉTICOS F&C S.A.S.	1793211640001	$ 65.527,23	30 DÍAS	19 archivos en PDF 6.40 MB

1.10.- Mediante Acta No. 004 de Evaluación y Calificación de ofertas para el proceso de Subasta Inversa Electrónica código **Nº SIE-GADML-2025-42** de fecha 14 de enero de 2026, La Sra. Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, procede con la calificación de las ofertas en el numeral 4. CONCLUSIÓN, manifiesta lo siguiente*:* Una vez que se ha revisado, analizado y calificado la documentación de las ofertas presentadas durante el proceso de evaluación y calificación, se pone a consideración de la Máxima Autoridad el Acta de Evaluación y Calificación del proceso de SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA signado con el código No. SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto de contratación es la "**ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO**". De las SEIS ofertas presentas, CINCO no cumplen con los requerimientos establecidos en los pliegos.

1.11.- Mediante el Acta de Negociación Nro. SIE-GADML-2025-42, de fecha 20 de enero de 2026, del proceso de Subasta Inversa Electrónica código N° SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto es la ***"ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"*** suscrito entre la Sra. Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, y el Sr. Roberto Rolando Salinas Moreno, en la parte pertinente dice lo siguiente: *Luego de las deliberaciones, análisis cualitativo y cuantitativo del objeto materia de la presente negociación, el oferente habilitado manifiesta que el valor final de la oferta económica es de* ***SECENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 33/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 62.244,33),*** *equivalente a una rebaja del 5.01% calculado sobre la oferta económica inicial, propuesta que es aceptada toda vez que el presupuesto referencial del presente proceso fue elaborado en base a precios de bienes similares adjudicados en años anteriores y proformas con precios actuales de mercado(…).*

1.12.- Mediante informe de Evaluación de las ofertas en el que se Recomendación de Adjudicación, del proceso Subasta Inversa Electrónica con el código **No. SIE-GADML-2025-42** de fecha 20 de enero de 2026, La Sra. Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, en recomendaciones dice lo siguiente: *(…) En calidad de servidor responsable de llevar a cabo la fase precontractual, RECOMIENDO,* a la máxima autoridad adjudicar al Sr. ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO, con RUC 1500679574001, el proceso de Subasta Inversa Electrónica SIEGADML-2025-42 para la **"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"** por un monto de USD 62.244,33 (sesenta y dos mil doscientos cuarenta y cuatro con 33/100 dólares de los Estados Unidos de América) con un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, por haber cumplido con los requisitos generales y específicas de los pliegos.

1.13.- Mediante Resolución Administrativa **No. 009-GADML-2026** Adjudicación de Subasta Inversa Electrónica código de proceso: **SIE-GADML-2025-42**, de fecha de firma 02 de febrero de 2026, resolvió: ***Artículo 1.***- Adjudicar el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica con código SIE-GADML 2025-42, cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO",** al oferente ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO con RUC 1500679574001, por un valor de USD 62.218,11 (sesenta y dos mil doscientos dieciocho dólares 11/100 centavos de los Estados Unidos de América), más el IVA, y un plazo estimado para la ejecución del contrato es de 30 días, contados a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato, por haber presentado la oferta que asegura las mejores condiciones para la entidad contratante en términos de valor por dinero y que cumple las condiciones mínimas de calidad y los requisitos legales y financieros previstos en los documentos precontractuales, presenta el precio más bajo, de conformidad con lo dispuesto en los pliegos, artículo 112 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa aplicable. ***Artículo -2*** *Notificar* la presente Resolución

al oferente ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO con RUC 1500679574001, a través del Portal de Contratación Pública y mediante el Sistema de Gestión Documental "e-Doc Manager". ***Artículo 3.-*** disponer que la Dirección de Gestión de Procuraduría Síndica proceda con la elaboración del contrato correspondiente al procedimiento de Subasta Inversa Electrónica con código SIE-GADML-2025-42.

1.14.- Mediante Oficio N° 10863, de fecha 24 de marzo del 2025, el Abg. Juan Carlos Larrea Valencia, Procurador General del Estado, absuelve la consulta realizada por la Empresa pública Metropolitana de agua Potable de Quito, y en el numeral 3 manifiesta: ***"…Pronunciamiento, en el primer párrafo dice lo siguiente: "En atención a los términos de su consulta se concluye que, de acuerdo con los artículos 69 de la LOSNCP y 257 de su Reglamento General, el acto administrativo de adjudicación deberá causar estado antes de proceder a la suscripción en el portal COMPRAS PUBLICAS, periodo durante el cual los interesados pueden presentar impugnaciones. Una vez que la adjudicación ha causado estado, el adjudicatario tiene un término de quince días para suscribir el contrato. En caso de que el adjudicatario sea compromiso de consorcio o asociación, se le concede un término adicional de quince días, para la formalización del contrato. El adjudicatario podrá solicitar una ampliación del término para la suscripción del contrato antes de que este venza, siempre que justifique la existencia de una causa de fuerza mayor o caso fortuito. No obstante, dicha ampliación no podrá exceder de siete días y, bajo ninguna circunstancia, podrá otorgarse una prórroga sobre un término ya vencido".***

1.15.- De conformidad al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 26, en la parte pertinente dice "…*En los procedimientos de contratación donde sea necesario estar registrado y habilitado en el RUP para participar, las entidades contratantes verificarán esta condición de los oferentes exclusivamente en la fecha y hora de: a) apertura de ofertas; b) adjudicación; y, c) suscripción del contrato.***"**, disposición legal que se da cumplimiento con la constancia mediante la captura de pantalla que se adjunta a continuación y de la cual se constata que se encuentran debidamente habilitado en el RUP.



CLÁUSULA SEGUNDA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

2.1.- Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos:

- Los que acrediten la calidad de los comparecientes;
- Pliego, Condiciones Generales y Particulares, incluyendo las Especificaciones Técnicas del objeto de la contratación.
- Oferta presentada por el contratista.
- Certificación de la Dirección Financiera, que acredita la existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato;
- Acta de Negociación;
- Informe de evaluación y recomendación de adjudicación;
- Resolución Administrativa de Aprobación de Pliegos;
- Resolución de Adjudicación
- Tabla de cantidades y precios;
- Pago de pliegos, certificado de no adeudar al Municipio, timbre; y,
- Garantía Técnica;
- Certificado Bancario;
- RUC;
- Los demás documentos que en virtud de la legislación vigente se requiere para formalización del contrato.

CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO:

3.1.- LA CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar el contrato a entera satisfacción de la CONTRATANTE, según las características y especificaciones técnicas constantes en la oferta, que se agrega y forma parte integrante de este contrato, esto es la contratación de la

PROCURADURIA SINDICA

SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SIE-GADML-2025-42

CONTRATO N° 06

"ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO", mismo que se detalla a continuación la tabla de cantidades y precios:

ITEM	DESCRIPCIÓN	U	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL REFERENCIAL
1	**ACEITE TRANSMISIÓN 80W90 –TANQUE.** (80W90; DENSIDAD A 15°C DIN51757D MIN 887KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 139MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 14.9 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 104, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 207°C, PUNTO DE CONGELACIÓN ASTM D97 MIN -30°C)	UNIDAD	5	1.187,54	5.937,70
2	**ACEITE DEL MOTOR 15W40 –TANQUE.** (15W40; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 MIN 887KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 98.6MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 13.4 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 135.9, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 236°C, TBN ASTM D2896 MIN 11 MG KOH/G)	UNIDAD	10	1.187,54	11.875,40
3	**ACEITE HIDRÁULICO ISO 68 –TANQUE.** (ISO 68; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 MIN 862KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 68MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 9.3 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 110, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 259°C, PUNTO DE ESCURRIMIENTO ASTM D97 MIN -36°C.)	UNIDAD	12	1.187,54	14.250,48
4	**ACEITE DE TRANSMISIÓN SAE30 –TANQUE.** (SAE 30; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 MIN 894,5KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 102,5MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 11 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 98, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 220°C, PUNTO DE ESCURRIMIENTO ASTM D97 MIN -24°C.)	UNIDAD	3	1.094,98	3.284,95
5	**ACEITE DE TRANSMISIÓN 85W140 –TANQUE.** (85W140; VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40 °C, ASTM D445 MIN 336 MM2/S, VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 100 °C, ASTM D445 MIN 25 MM2/S, PUNTO DE FLUIDEZ, ASTM D97 MIN -12C, ÍNDICE DE VISCOSIDAD, ASTM D2270 MIN 96, DENSIDAD DIN51757 MIN 905 KG/M3.)	UNIDAD	6	1.187,54	7.125,24
6	**ACEITE HIDRAULICO TRANSFLUID DIII –TANQUE.** (ATF DEXRON III; VISCOSIDAD CINEMÁTICA A 40°C ASTM D445 MIN 36 MM2/S ASTM D445, VISCOCIDAD CINEMATICA A 100°C ASTM D445 MIN 7 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D 2270 MIN 178, PUNTO DE INFLAMABILIDAD ASTM D92 MIN 236°C, PUNTO DE ESCURRIMIENTO ASTM D97 MIN -39°C.)	UNIDAD	3	1.187,54	3.562,62
7	**GRASA DE RODAMIENTO BALDE.** (GRADO NLGI ASTM D 217/DIN51818 MIN 2, COLOR MARRON CLARO, PENETRACIÓN A 25C ASTM D 217/DIN51 818 MIN (-25 A 120), SOLDADURA 4 BOLAS DIN 51350-4 MIN (260-280) DAN, PUNTO DE GOTEO ASTM D2265/DIN 2265/IP396/DIN ISO2176 MIN 185 C, CARGA TIMKEN ASTM D 2509 MIN 47,5 LBS)	UNIDAD	20	67,99	1.359,87
8	**GRASA DE CHASIS DE 16KG –BALDE.** (NLGI ASTM D217 MIN 2; PENETRACIÓN TRABAJADA 60 GOLPES, 25°C D217 MIN (265-295), COLOR D-1500 AMBAR, PUNTO DE GOTEO D2255 MIN 180°C, ESPESANTE UNICAMENTE LITIO, TIMKEM,OK,LB D2509 MIN 40)	UNIDAD	10	67,99	679,94
9	**GRASA DE RODAMIENTO –TANQUE.** (GRADO NLGI ASTM D 217/DIN51818 MIN 2, COLOR MARRON CLARO, PENETRACIÓN A 25C ASTM D 217/DIN51 818 MIN (-25 A 120), SOLDADURA 4 BOLAS DIN 51350-4 MIN (260-280) DAN, PUNTO DE GOTEO ASTM D2265/DIN 2265/IP396/DIN ISO2176 MIN 185 C, CARGA TIMKEN ASTM D 2509; 181KG)	UNIDAD	4	766,55	3.066,20
10	**ACEITE 20W50.** (20W50; VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 156,5 MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 17,8 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 125.5, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 247,5°C, PUNTO DE ESCURRIMIENTO ASTM D97 MIN -30°C, DENSIDAD ASTM D1298 MIN 883 KG/M3.)	LITRO	60	6,88	413,03
11	**ACEITE 10W30.** (10W30; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 869,8 KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 82,6 MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 12,18 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 142, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 220°C, PUNTO DE CONGELACIÓN ASTM D97 MIN -36°C)	GALÓN	30	21,59	647,75
12	**ACEITE 10W30.** (10W30; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 869,8 KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 82,6 MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 12,18 MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 142, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 220°C, PUNTO DE CONGELACIÓN ASTM D97 MIN -36°C)	LITRO	18	6,88	123,91
13	**ACEITE DE LIGAR.** (2T; DENSIDAD A 15°C ASTM D1298 MIN 863,5 KG/M3, VISCOSIDAD A 40°C ASTM D445 MIN 49,5 MM2/S, VISCOSIDAD A 100°C ASTM D445 MIN 8MM2/S, INDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 MIN 145, PUNTO DE INFLAMACIÓN ASTM D92 MIN 220°C, PUNTO DE CONGELACIÓN ASTM D97 MIN -36°C)	LITRO	60	7,60	455,76
14	**AMBIENTAL PARA VEHÍCULO DE 500ML.** (PROTECTOR AUTOMOTRIZ EN SILICONA CON PROTECCIÓN UV; 450ML)	UNIDAD	200	7,60	1.519,20
15	**DESENGRASANTES DE MANOS.** (LIMPIADOR DE MANOS COMPOSICIÓN LIMONENO-AGUA, APARIENCIA LOCIÓN VISCOSA,OLOR NARANJA CÍTRICO, COLOR BLANCO, GRAVEDAD ESPECÍFICA MIN 1.01, PUNTO DE INFLAMACIÓN MIN 200F Y PH MIN 7.0)	GALÓN	50	18,99	949,50
16	**LIQUIDO DE FRENO.** (COLOR: AMARILLO DOT 4 PUNTO DE COMBUSTIÓN: MIN 125°C VISCOCIDAD A -40: MIN (1390 MM2/S) SAE J1703/1704 VALOR PH A 20°C: MIN 6-10 FMVSS 166 VISCOSIDAD A 100°C: MIN (2,5MM2/S) PUNTO DE EBULLICIÓN ERBP: MIN 165°C SAE J1703/1704; 946ML)	UNIDAD	48	14,72	706,43
17	**LIQUIDO DE FRENO.** (COLOR: AMARILLO DOT 4 PUNTO DE COMBUSTIÓN: MIN 125°C VISCOCIDAD A -40: MIN (1390 MM2/S) SAE J1703/1704 VALOR PH A 20°C: MIN 6-10 FMVSS 166 VISCOSIDAD A 100°)	UNIDAD	48	7,60	364,61
18	**LIMPIA PARTES ELECTRÓNICAS.** (APARIENCIA LIQUIDO INCOLORO, GRAVEDAD ESPECÍFICA MIN (063-0.74 G/ML), PUNTO DE EBULLICIÓN MIN 37°C, PUNTO DE INFLAMACIÓN MIN 6°C, COMPONENTES ORGÁNICOS VOLATILES MIN 95,5% Y TASA DE EVAPORACIÓN MIN 1.00)	UNIDAD	60	12,14	728,65
19	**LIMPIA CONTACTO.** (APARIENCIA LIQUIDO INCOLORO, GRAVEDAD ESPECÍFICA MIN (063-0.74 G/ML), PUNTO DE EBULLICIÓN MIN 37°C, PUNTO DE INFLAMACIÓN MIN 6°C, COMPONENTES ORGÁNICOS VOLATILES MIN 95,5% Y TASA DE EVAPORACIÓN MIN 1.00; 450ML)	UNIDAD	60	8,60	516,15
20	**LIMPIA CARBURADOR.**	UNIDAD	60	9,26	555,46

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

	(APARIENCIA OLOR DE UN PRODUCTO EN AEROSOL, PESO ESPECÍFICO MIN 0,75- PUNTO DE INFLAMACIÓN MIN -156F, INTERVALO DE EBULLICIÓN (-44F-231F); 450ML)				
21	**LIMPIA PARABRISAS.** (APARIENCIA VISUAL CRISTALINA, COLOR VERDE, PH A 100% D445 MIN 7,50 Y GRAVEDAD ESPECÍFICA A 15.6C D 4052 MIN 0.99)	GALÓN	30	8,45	253,52
22	**AGUA DESTILADA.** (APARIENCIA: LÍQUIDO INCOLORO, SIN OLOR, INSÍPIDO, GRAVEDAD ESPECÍFICA MIN 1.000, PUNTO DE EBULLICIÓN 100C, PUNTO DE FUSIÓN MIN 0, PRESIÓN DE VAPOR MIN)	UNIDAD	25	2,14	53,41
23	**AGUA DESTILADA CON ACIDO.** (AGUA ACIDULADA COMPOSICIÓN AGUA DESTILADA MIN 98%, ÁCIDO SULFÚRICO MIN 2%)	UNIDAD	25	2,14	53,41
24	**LIQUIDO PENETRANTE.** (PRESENTACIÓN: COLOR: ÁMBAR PUNTO EBULLICIÓN: MIN (300°F) ESPESOR DE PELÍCULA HUMEDAD: MIN (0.002IN) FUERZA DIELECTRICA: MIN (38,000V X 0.10 IN) PUNTO DE VERTIDO: MIN (-81°F) OLOR: CARACTERÍSTICO GRAVEDAD ESPECIFICA: MIN (0.81) PORCENTAJE VOLÁTIL: MIN (74% POR PESO) VALOR KB: MIN 25 MÉTODO DE PRUEBA: ASTM B-117: MIN 0-20% EN 72 HORAS; 450ML)	UNIDAD	120	17,09	2.050,92
25	**SILICÓN GRIS DE ALTA TEMPERATURA.** (SILICONA QUÍMICA, ASPECTO PASTA GRIS, PESO ESPECÍFICO A 20C MIN 1,45- COMPONENTES MONOCOMPONENTES SIN MEZCLADO, APLICACIONES SELLADO, VENTAJAS ESPECÍFICAS MIN NO CORROSIVA)	UNIDAD	72	7,79	560,58
26	**FIJADOR DE ROSCA.** (TECNOLOGÍA ACRÍLICO, TIPO DE QUÍMICO ÉSTER DE DIMETACRILATO ASPECTO (SIN CURAR) LIQUIDO VERDE, COMPONENTES MONOCOMPONENTE - SIN MEZCLADO, VISCOSIDAD BAJA, APLICACIÓN FIJADOR DE ROSCAS, RESISTENCIA ALTA; 50ML)	UNIDAD	48	23,41	1.123,45
SUBTOTAL				**$**	**62.218,11**

CLÁUSULA CUARTA. - PRECIO DEL CONTRATO

4.1.- El precio del contrato, que el CONTRATANTE pagará a la CONTRATISTA es por el valor de **USD 62.218,11 (sesenta y dos mil doscientos dieciocho dólares 11/100 centavos de los Estados Unidos de América)**, más el IVA.

4.2.- Los precios acordados en el contrato, constituirán la única compensación al contratista por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que tuviese que pagar, excepto el Impuesto al Valor Agregado que será añadido al precio del contrato.

4.3.- La Contratista declara que, durante todas las fases de la contratación, no estar inmerso en prácticas o conductas ilícitas o éticamente incorrectas.

CLÁUSULA QUINTA. - FORMA DE PAGO:

De acuerdo al pliego el pago se realizará de la siguiente manera:

5.1 -Pago contra entrega de 100%. El pago se lo realizará 100 por ciento contra entrega de los bienes posterior a la suscripción del Acta de Entrega Recepción definitiva, de conformidad a lo establecido en los artículos 364, 367 y 374 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

5.2.- Será causa de responsabilidad de los funcionarios competentes el que no cumplan oportunamente con las obligaciones de pago previstas en este Contrato, contando con los recursos económicos suficientes, y se aplicará lo establecido en el artículo 114 de la LOSNCP.

CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS:

6.1- Por el tipo de Contratación **NO APLICA** Garantía de buen uso del anticipo por cuanto no se entrega anticipo.

6.2.- De conformidad con el artículo 87 de la LOSNCP, el Contratista ha rendido la siguiente garantía técnica:

*Yo, **SALINAS MORENO ROBERTO ROLANDO**, portador de la cédula de ciudadanía N.° 1500679574, en calidad de oferente dentro del procedimiento de contratación pública Subasta Inversa Electrónica N.° SIE-GADML-2025-42, cuyo objeto es la **"ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO"**, manifiesto de manera libre, voluntaria y expresa lo siguiente:*

Que, en caso de resultar adjudicatario del referido proceso de contratación, ME COMPROMETO a otorgar una GARANTÍA TÉCNICA mínima de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva, conforme a lo establecido en el pliego del proceso, la oferta adjudicada, el contrato correspondiente y la normativa vigente aplicable.
La garantía técnica cubrirá, como mínimo:

- *La calidad, idoneidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados.*
- *El cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego.*
- *La reposición, reparación o sustitución inmediata, sin costo adicional para la entidad contratante, de cualquier bien que presente defectos de fabricación, fallas, deterioro prematuro o incumplimiento técnico durante el período de garantía.*
- *La asistencia técnica y capacitación, cuando corresponda, conforme a lo previsto en las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.*

Declaro que la presente carta constituye un compromiso formal y vinculante, para efectos de verificación y evaluación de la oferta dentro del procedimiento de contratación pública, y que el incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones y medidas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y el contrato respectivo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. - PLAZO

7.1.- El plazo total para la entrega de los bienes contratados es de **TREINTA (30)** días, contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato.

CLÁUSULA OCTAVA. - PRÓRROGAS DE PLAZO:

8.1.-El GAD Municipal de Loreto, prorrogará el plazo total o los plazos parciales, solo en los siguientes casos y siempre que el CONTRATISTA así solicite, por escrito, justificando los fundamentos de aquella, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

8.2.- Las prórrogas de plazo proceden únicamente a pedido motivado y justificado del contratista, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción del contrato conforme lo determinado en el artículo 356 del Reglamento de la LOSNCP en concordancia con lo dispuesto en el artículo 357 del antes indicado cuerpo legal.

CLÁUSULA NOVENA. – MULTAS

9.1.- De conformidad con el artículo 82 numeral 4, de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, en concordancia con el artículo 375 de su Reglamento General.

9.2.- La multa tendrá como finalidad que el GAD municipal, en ejercicio de su facultad de coerción para la correcta ejecución del contrato, sin terminar el mismo, impulsen al contratista a corregir su conducta y cumplir con sus obligaciones, a efectos de que el interés público se vea beneficiado por medio de la ejecución del objeto contractual.

9.3.- En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento del objeto contractual, la entidad contratante establecerá, por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista, una multa del 1 x 1.000 de la valoración de la obligación incumplida, conforme lo determinen los pliegos.

9.4.- En caso de ser obligaciones que no pueden cuantificarse, para obtener el valor de multa se podrá aplicar el valor del 1 x 1.000 del monto del contrato, el cual en ningún caso superará los quinientos dólares diarios (USD 500).

9.5.- En virtud de los artículos 1551 y 1553 del Código Civil, corresponde la imposición y cobro de multas por el mero retardo del contratista.

9.6.- Las multas pueden ser objeto de compensación de valores entre la entidad contratante y el contratista, previo acuerdo mutuo entre las partes, en los montos que sean recíprocamente deudoras.

9.7.- Las multas impuestas se descontarán mensualmente en las planillas de pago, siguiendo el debido procedimiento administrativo, establecido en los artículos 376 y 377 del presente Reglamento.

9.8.- Para el cálculo e imposición de las multas, el Administrador del Contrato deberá fundamentarse en aquello que conste, documentadamente, en el expediente del respectivo contrato.

9.9.- En cualquier caso, la entidad contratante deberá justificar razonadamente el valor de las multas que se impondrán al contratista.

CLÁUSULA DÉCIMA. - SUBCONTRATACIÓN:

10.1.- El presente contrato es intransferible y no podrá cederse a terceras personas ni total ni parcialmente, en conformidad con lo que disponen el artículo 91 de la LOSNCP, la subcontratación podrá efectuarse de conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley ibídem y 354 del Reglamento General de la misma.

10.2.- EL CONTRATISTA será el único responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. - DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

11.1.- El contratante designa como Administrador del Contrato; a la Ing. Carol Valeria Carrera Vélez, con cédula de ciudadanía No. 1315120483, en su calidad de Analista de OO.PP, quien cuenta con la Certificación como Operador del Sistema Nacional de Contratación Pública No. hJYH8NpRhf, de fecha 18 de enero de 2025; o a quien legalmente haga sus veces como Administrador del Contrato, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato; adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en concordancia con los artículos 359, 360, 361 y 363 de su Reglamento General; dar estricto cumplimiento a lo establecido en los artículo 41.1 y 41.3 de la Ley para Planificación de la Circunscripción Territorial Amazónica; y, si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, deberá exigir el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en la referida fase por parte del Administrador de Contrato.

11.2.- El contratante podrá cambiar de Administrador del Contrato, para lo cual bastará notificar al contratista la respectiva comunicación; sin que sea necesario la modificación del texto contractual.

11.3.- El Administrador del Contrato deberá verificar si el contratista realiza una actividad económica sujeto a reporte a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en cuyo caso deberá contar con el Certificado de Cumplimiento de la UAFE en la fase de ejecución contractual, lo cual se verificará exclusivamente en dicha fase, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53. numeral 9. del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

11.4. - Las atribuciones del Administrador del Contrato conforme lo determinado en el artículo 361 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, son las siguientes:

1. Coordinar todas las acciones necesarias para garantizar la debida ejecución del contrato;
2. Imponer las multas establecidas en el contrato, para lo cual se deberá respetar el debido proceso;

3. Reportar a la máxima autoridad de la entidad contratante, cualquier aspecto operativo, técnico, económico y de otra naturaleza que pudieren afectar al cumplimiento del contrato;
4. Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato;
5. Notificar la disponibilidad del anticipo cuando sea contemplado en el contrato como forma de pago coordinando con el área financiera de la entidad contratante;
6. Verificar los movimientos de la cuenta bancaria del contratista, y su relación con el devenga miento del anticipo o lo correspondiente a la ejecución contractual;
7. Proporcionar al contratista las instrucciones necesarias para garantizar el cumplimiento del contrato;
8. Requerir motivadamente al contratista, la sustitución de cualquier integrante de su personal cuando lo considere incompetente o negligente en su oficio, presente una conducta incompatible con sus obligaciones, o se negare a cumplir las estipulaciones del contrato y los documentos anexos, debidamente justificado. El personal con el que se sustituya deberá acreditar la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos;
9. Autorizar o negar el cambio del personal asignado a la ejecución del contrato, verificando que el personal que el contratista pretende sustituir acredite la misma o mejor capacidad, experiencia y demás exigencias establecidas en los pliegos, desarrollando adecuadamente las funciones encomendadas;
10. Verificar de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación, que el contratista disponga de todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad, en cumplimiento de la legislación ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones adicionales que se hayan establecidos en el contrato;
11. Reportar a las autoridades competentes, cuando tenga conocimiento que el contratista se encuentra incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley;
12. Verificar permanentemente y en los casos aplicables, el cumplimiento de participación nacional, desagregación y transferencia tecnológica, así como cualquier otra figura legalmente exigible y que se encuentre prevista en el contrato o que por la naturaleza del objeto y el procedimiento de contratación sean imputables al contratista;
13. Elaborar e intervenir en las actas de entrega recepción a las que hace referencia el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; así como, coordinar con el contratista, la recepción del mismo;
14. Publicar en el Portal de Contratación Pública durante la fase contractual toda la información relevante, de conformidad con los manuales de usuario o instructivos que emita el Servicio Nacional de Contratación Pública. Para dicho efecto, el usuario creador del proceso deberá habilitar el usuario para el administrador del contrato;
15. Preparar y organizar el expediente de toda la gestión de administración del contrato, dejando evidencia documental a efectos de las auditorías ulteriores que los órganos de control del Estado realicen;
16. Solicitar a los contratistas y servidores que elaboraron los estudios, que en el término máximo de quince (15) días, desde la notificación, informen sobre la existencia de justificación para suscribir contratos complementarios, órdenes de trabajo y diferencias en cantidades de obra que superen el quince por ciento (15%) del valor del contrato principal; y,
17. Cualquier otra que de acuerdo con la naturaleza del objeto de contratación sea indispensable para garantizar su debida ejecución. Las atribuciones adicionales del administrador del contrato deberán estar descritas en el contrato.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

12.1.-Terminación del contrato. – De acuerdo al art. 406 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el contrato termina conforme lo previsto en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las Condiciones Particulares y Generales del Contrato.

12.2.-Causales de Terminación unilateral del contrato. - Tratándose de incumplimiento del contratista, procederá la declaración anticipada y unilateral de la contratante, en los casos establecidos en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Además, se considerarán las siguientes causales:

1. Por incumplimiento del contratista;

2. Por quiebra o insolvencia del contratista;
3. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato;
4. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
5. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley;
6. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza; y,
7. La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente el contrato cuando, ante circunstancias técnicas o económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato ni se inscribirá al contratista como incumplido.

En este último caso, el contratista tiene la obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la garantía de fiel cumplimiento del contrato; y, Las demás causas previstas en el Reglamento a esta Ley.

12.3.- Procedimiento de terminación unilateral. - El procedimiento a seguirse para la terminación unilateral del contrato será el previsto en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con lo dispuesto en su Reglamento General.

Art. 109.- Notificación y trámite. - Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista, con la anticipación de diez (10) días término, sobre su intención de terminarlo unilateralmente. Junto con la notificación, se remitirán los informes técnico y económico, referentes al cumplimiento de las obligaciones de la Entidad Contratante y del contratista. La notificación señalará específicamente el incumplimiento o mora en que ha incurrido el contratista de acuerdo al artículo anterior y le advertirá que, de no remediarlo en el término señalado, se dará por terminado unilateralmente el contrato.

Si el contratista no justificare la mora o no remediare el incumplimiento, en el término concedido, la Entidad Contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato, mediante resolución de la máxima autoridad de la Entidad Contratante, que se comunicará por escrito al contratista en un plazo máximo de un mes contado desde que finalizó el término de diez (10) días establecido en el inciso anterior y se publicará en el portal institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.
Los contratistas no podrán aducir que la Entidad Contratante está en mora del cumplimiento de sus obligaciones económicas en el caso de que el anticipo que les fuere entregado en virtud del contrato no se encontrare totalmente amortizado. La forma de calcular la amortización del anticipo constará en el Reglamento respectivo.

Solo se aducirá mora en el cumplimiento de las obligaciones económicas de la Entidad Contratante cuando esté amortizado totalmente el anticipo entregado al contratista, y éste mantenga obligaciones económicas pendientes de pago.

La declaración unilateral de terminación del contrato dará derecho a la Entidad Contratante a establecer el avance físico de las obras, bienes o servicios, su liquidación financiera y contable, a ejecutar las garantías de fiel cumplimiento y, si fuere del caso, en la parte que corresponda, la garantía por el anticipo entregado debidamente reajustados hasta la fecha de terminación del contrato, teniendo el contratista el plazo término de diez (10) días para realizar el pago respectivo. Si vencido el término señalado no efectúa el pago, deberá cancelar el valor de la liquidación más los intereses fijados por el Directorio del Banco Central del Ecuador, los que se calcularán hasta la fecha efectiva del pago.
La Entidad Contratante también tendrá derecho a demandar la indemnización de los daños y perjuicios, a que haya lugar.

Una vez declarada la terminación unilateral, la Entidad Contratante podrá volver a contratar inmediatamente el objeto del contrato que fue terminado, de manera directa, de conformidad con el procedimiento que se establezca en el reglamento de aplicación de esta Ley.

DÉCIMA TERCERA. - TRABAJO PREFERENTE:

13.1.- El contratista está obligado a cumplir con lo dispuesto en el Art. 41.1 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica incorporado mediante el artículo 34 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 488 del 30 de enero de 2024.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U ÓRDENES DE TRABAJO:

14.1.- Por la naturaleza de la contratación, no aplica para el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

15.1.- De acuerdo al artículo 93, de la LOSNCP la recepción de los bienes correspondientes al proceso denominado "***ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO",*** se realizará a entera satisfacción del CONTRATANTE, observando lo dispuesto en los Arts. 367 y 374 del Reglamento General de la LOSNCP; la liquidación final del contrato se realizará en los términos previstos por el artículo 378 Ibídem y formará parte del acta que tendrá los efectos de definitivos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONOCIMIENTO:

16.1.- La Contratista, declara conocer perfectamente el sitio sobre el cual deberá ejecutar el objeto contractual y que ha recibido del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, la información suficiente y necesaria referente a las condiciones y demás factores y características del medio ambiente. Cualquier descuido, falta de apreciación, error u omisión del Contratista no le exime de responsabilidad ni le enerva de estas ni le disminuye la responsabilidad. De igual forma los precios acordados para la ejecución de los trabajos motivo del presente instrumento no podrán variar alegando desconocimiento de lo establecido en la presente cláusula.

CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

17.1.- Si respecto de la divergencia o controversia existente no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas se someterán al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la Entidad Contratante.

17.2. - La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.

17.3. - En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el cumplimiento, interpretación y ejecución del presente contrato, no se lograre un acuerdo directo entre las partes, éstas acuerdan someterse a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de la Procuraduría General del Estado y a las siguientes normas:

a) El Contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si el Contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y ejecutar las garantías.

b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante la mediación, las partes se someterán a arbitraje administrado por el centro de arbitraje y mediación de la Procuraduría General del Estado.
c) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el Contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato.
d) Previo a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

18.1.- Todas las comunicaciones, sin excepción, entre las partes, relativas a los trabajos, serán formuladas por escrito o por medios electrónicos y en idioma español. Las comunicaciones entre el administrador del contrato y el contratista se harán a través de documentos escritos o por medios electrónicos.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - DOMICILIO

19.1.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Loreto.

19.2.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

EL CONTRATANTE:

Dirección: Provincia de Orellana, Cantón Loreto, Parroquia Loreto, Ciudad de Loreto, Av. Rafael Andrade Chacón y Gregorio Urapari.
Teléfono: (06)2-893-223 / Telefax: (06)-2- 893-239
E mail: gadloreto92@gmail.com

EL CONTRATISTA:

Dirección: Provincia Orellana, Cantón Loreto, Calle Vía Interoceánica, Número SN, Calle Secundaria Juan Montalvo, Código Postal 220209
Teléfono: 0992841954
E-mail: rj.19robert@hotmail.com

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

20.1.- Declaración. - Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen y aceptan el texto íntegro de las Condiciones Generales del Contrato, publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, vigente a la fecha de la convocatoria del procedimiento de contratación, y que forma parte integrante de este Contrato que están suscribiendo.

20.2.- Para constancia de lo acordado, las partes intervinientes firman electrónicamente, en el lugar y fecha inicialmente indicados.

Firmado electrónicamente por:
KLEBER FABIAN OLALLA TORRES
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTÓN LORETO

Firmado electrónicamente por:
ROBERTO ROLANDO SALINAS MORENO
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Salinas Moreno Roberto Rolando
CONTRATISTA

Sistema Oficial de Contratación Pública

Viernes 21 de Agosto del 2026 16:31 **RUC:** 1560001830001 | **Entidad:** MUNICIPIO DE LORETO | **Usuario:** CAROLCARRERA92 | **[Cerrar Sesión]**

Consultar

»Búsqueda de Procesos de Contratación

Para Buscar Procesos: Debe Presionar el botón 'Buscar Entidad', e ingresar el nombre de la Entidad que desea consultar.

Palabras claves		Para encontrar procesos según palabras claves ingresadas; ej: "computador", "camarón".
Entidad Contratante	Buscar Entidad	Presione el botón "Buscar Entidad", para encontrar el nombre de la Entidad Contratante, de la cual desea buscar Procesos.
Tipo de Contratación	TODOS	Que tipo de contratación es el proceso: Licitación, Subasta Inversa o Publicación u otro.
Tipo de compra		Qué tipo de compra se realizó en el proceso: Bienes, Obras o Servicios incluidos Consultoría
Estado del Proceso		Seleccione el Estado en que se encuentren los procesos interesados.
Código del Proceso	SIE-GADML-2025-42	Ingrese el código del proceso a buscar, ej: INCOP-SI-001
Por Fechas de Publicación (*)	**Desde:** 2025-07-01 **Hasta:** 2025-12-31	Seleccione el Período de la fecha de Publicación del Proceso. (Periodo válido 6 meses antes y 15 días después de la fecha de publicación)
Para una búsqueda más avanzada	Buscar en google	Esta opción permite buscar información e inclusive documentos que se encuentren en el Portal. Para acceder puede ingresar en el campo "Palabras claves" lo que necesita buscar y clic en el enlace.

Buscar Limpiar

Código	Entidad	Objeto del Proceso	Estado del	Provincia/	Presupuesto Referencial	Fecha de	Opciones

	Contratante		Proceso	Cantón	Total(sin iva)	Publicación
SIE-GADML-2025-42	MUNICIPIO DE LORETO	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO	Finalizada	ORELLANA / LORETO	$65,527.24	2025-12-29 17:30:00

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2026 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1280-M-GD

Loreto, 09 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
Responsable de realizar el Seguimiento y Evaluacion de las Recomendaciones de la Contraloria

ASUNTO: En atención al memorando Nro. GADMCL-A-2026-1717-M-GD

En referencia al memorando Nro. GADMCL-A-2026-1717-M-GD, de fecha 06 de abril de 2026, suscrito por el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres ALCALDE DEL CANTÓN LORETO, mediante el cual dispone *"el cumplimiento de la recomendación N° 17 constante en el informe No. DPO-0007-2025 aprobado el 15 de septiembre del 2025, por parte de la Contraloría General del Estado, la misma que en la parte pertinente dice: "…Dispondrá y verificará que los servidores designados en calidad de Fiscalizadores efectúen la supervisión sobre la toma de muestras y ejecución de los ensayos; y, a los Administradores de los Contratos, verificar el cumplimiento de estos y de las cláusulas establecidas en los contratos". Esto es relacionado a las Planillas de obra aprobadas sin supervisión de los informes de ensayos de laboratorio de hormigones, disposición que fue dirigida únicamente para el Coordinador de Fiscalización".*

Respuesta:

Hasta la presenta fecha en la Dirección de Gestión Ambiental, no se han realizado obras para las tomas de muestras y ejecución de los ensayos. Cabe mencionar, cuando se realice obras se tomará en cuenta la recomendación emitida por la contraloría.

Adjunto documentación

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
FREDY RIGOBERTO
MASTIAN CHILLO

Ing. Fredy Rigoberto Mastian Chillo
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Anexos: ANEXOS
- Oficio 02-signed.pdf
- ALCANCE REC. 17.pdf

NUT: GADMCL-2026-13513

Oficio No. DGA-C-002-2026
Loreto, 09 de septiembre de 2026

Asunto: En atención al memorando Nro. GADMCL-A-2026-1717-M-GD

Señor
Kleber Fabián Olalla Torres
ALCALDE DEL CANTÓN LORETO

Presente. -

De mis consideraciones:

En referencia al memorando Nro. GADMCL-A-2026-1717-M-GD, de fecha 06 de abril de 2026, suscrito por el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres ALCALDE DEL CANTÓN LORETO, mediante el cual dispone *"el cumplimiento de la recomendación N° 17 constante en el informe No. DPO-0007-2025 aprobado el 15 de septiembre del 2025, por parte de la Contraloría General del Estado, la misma que en la parte pertinente dice: "…Dispondrá y verificará que los servidores designados en calidad de Fiscalizadores efectúen la supervisión sobre la toma de muestras y ejecución de los ensayos; y, a los Administradores de los Contratos, verificar el cumplimiento de estos y de las cláusulas establecidas en los contratos". Esto es relacionado a las Planillas de obra aprobadas sin supervisión de los informes de ensayos de laboratorio de hormigones, disposición que fue dirigida únicamente para el Coordinador de Fiscalización".*

Respuesta:

Hasta la presenta fecha en la Dirección de Gestión Ambiental, no se han realizado obras para las tomas de muestras y ejecución de los ensayos. Cabe mencionar, cuando se realice obras se tomará en cuenta la recomendación emitida por la contraloría.

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
FREDY RIGOBERTO MASTIAN CHILLO

Ing. Fredy Rigoberto Mastián Chillo, MSc.
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web

Memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2026-2465-M-GD

Loreto, 14 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
Responsable de realizar el Seguimiento y Evaluacion de las Recomendaciones de la Contraloria

ASUNTO: REMITIENDO ALCANCE A LA INFORMACIÓN SOLICITADA REC. 1 Y 5 PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ANTECEDENTES

En atención al Memorando Nro. GADMCL-GPS-2025-0432-M-GD, de fecha 12 de diciembre de 2026, suscrito por Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo – RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA del GAD Municipal Loreto, que en su parte pertinente indica: Solicitando medios de verificación en forma ordenada, en cada archivo detallando de que recomendación se trata de igual manera las acciones o actividades a realizarse, fecha de inicio sugerida; y, fecha final sugerida y demás información a fin de llevar el Registro de Cumplimiento de recomendaciones de la página web de la Contraloría General del Estado. (...), al respecto manifiesto lo siguiente:

Mediante memorando Nro. GADMCL-A-2025-5827-M-GD, de fecha 21 de noviembre del 2025, el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres - ALCALDE DEL CANTÓN LORETO, dirigido a Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano - Director de Planificación; en el cual manifiesta que en observancia en las recomendaciones 1 y 5: **DISPONGO** a ustedes que, cuando se designe o contrate fiscalizadores externos, se les disponga, revisar en conjunto con los diseñadores, los planos y estudios, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción, y de ser el caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Esta disposición se recomienda impartir a los Administradores de Contratos para que supervisen el cumplimiento.

En virtud de lo anteriormente indicado, y a fin de cumplir las recomendaciones 1 y 5, se detalla lo solicitado de conformidad al requerimiento:

ACCIONES O ACTIVIDADES

Desde la Dirección de Planificación se establecerá como hito de control obligatorio en la fase contractual de obras, la revisión técnica conjunta entre la fiscalización externa y los diseñadores de los estudios con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la obra y garantizar la integralidad del proyecto.

FECHAS DE INICIO SUGERIDA Y FECHA FINAL SUGERIDA

Memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2026-2465-M-GD

Loreto, 14 de septiembre de 2026

Referente a las fechas de inicio y fecha final en este caso no lleva fechas porque es **PERMANENTE**

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Como medio de verificación se adjunta el Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0974-M-GD en el cual se **DISPONE el fiel cumplimiento**

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
JORGE WASHINGTON
JARAMILLO MANZANO

Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Anexos:
- GADMCL-CPUR-2026-0974-M-GD.pdf
- REC. 1 Y 5.pdf

Copia:
Sr. Mgs. Byron Fernando Mejía Barreiros
Coordinador de Desarrollo Urbano, Rural y Proyectos

NUT: GADMCL-2026-5962

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Byron Fernando Mejía Barreiros	CPUR	2026-09-14

Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0974-M-GD

Loreto, 18 de abril de 2026

PARA: Sra. Arq. Nohely Melissa Rojas Canteral
Servidor Publico 6 Proyectista

Luis Humberto Auquilla Auquilla
SP6 Estructura y Presupuesto

Sr. Arq. Eric Nelson Verdesoto Verdesoto
Analista de Estudios e Infraestructura

Sr. Ing. Darío Javier Laica Fernández
Analista Hidrosanitario

Sr. Arq. Jose Claudio Felix Castro
Inspector de Construcciones

Sr. Mgs. Alexander Eduardo Acosta Supe
SP5-Profesional Seguimiento y Evaluación

ASUNTO: DISPOSICION DE CUMPLIMIENTO AL INFORME DPO-0007-2025, APROBADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025, SUSCRITA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

En atención al Memorando Nro. GADMCL-GPS-2025-0432-M-GD, de fecha 12 de diciembre de 2026, suscrito por Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo – RESPONSABLE DE REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA del GAD Municipal Loreto, que en su parte pertinente indica: Solicitando medios de verificación en forma ordenada, en cada archivo detallando de que recomendación se trata de igual manera las acciones o actividades a realizarse, fecha de inicio sugerida; y, fecha final sugerida y demás información a fin de llevar el Registro de Cumplimiento de recomendaciones de la página web de la Contraloría General del Estado. (...), al respecto manifiesto lo siguiente:

Mediante memorando Nro. GADMCL-A-2025-5827-M-GD, de fecha 21 de noviembre del 2025, el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres - ALCALDE DEL CANTÓN LORETO, dirigido a Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano - Director de Planificación; en el cual manifiesta que en observancia en las recomendaciones 1 y 5: **DISPONGO** a ustedes que, cuando se designe o se contrate fiscalizadores externos, se realice revisiones en conjunto con los diseñadores, los planos y estudios, con el fin de verificar la existencia de algún error, omisión o imprevisión técnica, que pueda afectar la construcción, y de ser el

Memorando Nro. GADMCL-CPUR-2026-0974-M-GD

Loreto, 18 de abril de 2026

caso, sugerir la adopción de medidas correctivas o soluciones técnicas, oportunamente. Esta disposición se recomienda a quienes sean Administradores de Contratos para que supervisen el cumplimiento.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
BYRON FERNANDO MEJIA BARREIROS

Mgs. Byron Fernando Mejía Barreiros
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO, RURAL Y PROYECTOS

Anexos:
- REC. 1 Y 5.pdf

Copia:
Sr. Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano
Director de Planificación

NUT: GADMCL-2026-5951

Memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1279-M-GD

Loreto, 09 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
Responsable de realizar el Seguimiento y Evaluacion de las Recomendaciones de la Contraloria

ASUNTO: En atención al memorando Nro. GADMCL-A-2026-1715-M-GD

En referencia memorando Nro. GADMCL-A-2026-1715-M-GD, de fecha 06 de abril de 2026, suscrito por el Sr. Kleber Fabián Olalla Torres ALCALDE DEL CANTÓN LORETO, mediante el cual dispone *"el cumplimiento de la recomendación N° 12 constante en el informe No. DPO-0007-2025 aprobado el 15 de septiembre del 2025, por parte de la Contraloría General del Estado, la misma que en la parte pertinente dice: "…Dispondrá y supervisará a los titulares de las áreas requirentes, que en los proceso de determinación de las necesidad y solicitudes de inicio de los procedimientos de contratación, verifiquen que las obras y proyectos considerados, sean concordantes con las actividades y fines institucionales, y que, los predios en donde se vayan a ejecutar los trabajos, sean de propiedad institucional o en su efecto, cuenten con los permisos y autorizaciones que permitan su ocupación, durante el tiempo de vida útil de los proyectos"*.

1. Acción:

Se realizó el trámite administrativo dentro de la institución de municipal para la obtención de la legalización de predios a intervenir con obra pública.

1. Fecha de inicio

05 de enero de 2026 hasta 14 de mayo de 2027.

1. Medio de verificación

Se cuenta en trámite en jurídico del certificado de registro de la propiedad, (memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1183-M-GD).

Adjuntos documentación:

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
FREDY RIGOBERTO
MASTIAN CHILLO

Memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1279-M-GD

Loreto, 09 de septiembre de 2026

Ing. Fredy Rigoberto Mastian Chillo
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Anexos: ANEXOS

NUT: GADMCL-2026-13509

Memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1183-M-GD

Loreto, 26 de agosto de 2026

PARA: Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZAR LA REGULARIZACIÓN DEL ÁREA DEL PARQUE DE LA FAMILIA, PARA PROCEDER CON EL PROYECTO: REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PARQUE DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE LORETO, PARROQUIA LORETO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA.

En atención al memorando Nro. GADMCL-DGPDT-2026-2254-M-GD, de fecha 20 de agosto de 2026, suscrito por el Arq. Jorge Washington Jaramillo Manzano - DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, mediante el cual solicita *se subsane las observaciones relacionadas con el proceso denominado REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL PARQUE DE LA FAMILIA DE LA CIUDAD DE LORETO, PARROQUIA LORETO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"*.

Por lo antes expuesto, solicito a Usted autorizar a quien corresponda se inicien con las acciones administrativas, técnicas, notariales y registrales necesarias, del área del parque La familia:

- Regularizar y legalizar la lotización Samuel Jipa aprobada el 26 de abril de 2010.
- Individualizar y validar técnicamente el área verde correspondiente al Parque de la Familia.
- Instrumentar e inscribir la transferencia de dominio del predio a favor del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal de Loreto.
- Actualizar la información catastral y registral, a fin de obtener la certificación del inmueble y dar continuidad al proceso de remodelación.

Nota adjunto el expediente tanto físico como digital, que incluye la planimetría de la lotización del año 2010, el levantamiento del Parque de la Familia, la documentación catastral y el informe de riesgos, para que sirvan de sustento en el proceso de regularización.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
FREDY RIGOBERTO
MASTIAN CHILLO

Ing. Fredy Rigoberto Mastian Chillo
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Memorando Nro. GADMCL-DGAMB-2026-1183-M-GD

Loreto, 26 de agosto de 2026

Referencias:
- GADMCL-CCA-2026-0193-M-GD

Anexos:
- ESPECIFICACIONES TECNICA _PF-1-signed-signed.pdf
- INFORME_NECESIDAD_ MANTENIMIENTO_PF-2-signed-signed.pdf
- MEMORIA TECNICA _MANTENIMIENTO _PF-signed.pdf
- CERTIFICADO ABIENTAL [4].rar
- IMPLANTACIONES [3].rar
- PRESUPUESTOS_[2].rar
- 9288_INFORME_PARQUE_LA_FAMILIA-signed.pdf
- 9288 PARQUE DE LA FAMILIA-signed-signed.pdf
- 9288 SUS_INUNDACIONES_PARQUE_LA_F-signed-signed.pdf
- 9288 SUS_MOV_MASAS_PARQUE_LA_F-signed-signed.pdf
- LEVANTAMIENTO_PARQUE_LA_FAMILIA.dwg
- CERTIFICACION DE RIESGOS 015 PARQUE DE LA FAMILIA-signed.pdf
- INFORME RIESGOS 153 PARQUE DE LA FAMILIA 2026-signed-signed.pdf
- JIPA AJON SAMUEL JAMIL Nº 36 FICHA 178 (HISTORIAL DE VENTAS)-signed (1).pdf
- 005-483-2014 GAD MUNICIPAL DEL CANTON LORETO (AREA VERDE).pdf
- Lotizacion_Samuel_Jipa_260819_144044-2010.pdf

NUT: GADMCL-2026-9288

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Sonia Barbara Huatatoca Aguinda	DGAMB	2026-08-26

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0245-M-GD

Loreto, 28 de septiembre de 2026

PARA: Sra. Abg. Paola Yolanda Villafuerte Jaramillo
Responsable de realizar el Seguimiento y Evaluacion de las Recomendaciones de la Contraloria

ASUNTO: REMITO INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DDE LAS RECOMENDACIONES DE CONTRALORIA.

En referencia al memorando Nro. GADMCL-GPS-2025-0432-M-GD, de fecha 12 de diciembre de 2025, suscrito por la Abg. Paola Villafuerte, como responsable de realizar el seguimiento y evaluación de las recomendaciones de la Contraloría, dirigido a los Directores y Coordinadores en el cual solicita se remita los medio de verificación de las acciones o actividades realizadas en cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloria.

Con lo expuesto, se anexa a este memorando carpetas comprimidas por cada recomendación y su medio de verificación correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes,

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
COORDINADORA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- GADMCL-DGOPM-2026-0249-M-GD

Anexos:
- GADMCL-A-2025-5615-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5827-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5536-M-GD (1).pdf
- GADMCL-A-2025-5719-M-GD (1).pdf
- GADMCL-A-2025-5838-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5699-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5657-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5839-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5656-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5840-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5568-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5566-M-GD (1).pdf

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0245-M-GD

Loreto, 28 de septiembre de 2026

- GADMCL-A-2025-5567-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5569-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5618-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5536-M-GD (2).pdf
- GADMCL-A-2025-5700-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-5723-M-GD.pdf
- ING. FLORES SOLICITA INFORMACION DE LAS RECOMENDACIONES PARA SUBIR AL SISTEMA.zip
- INFORME -FINAL-CGE (1) INF. APROBADO 2025-09-15.pdf
- CUMPLIMIENTO DE CONTRALORIA, ING. BELEN PARRAGA.zip
- MATRIZ DE ACTIVIDADES REALIZADAS - ING. BELEN.pdf

Copia:

Sr. Ing. Edison Alberto Egüez Cevallos
Director de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

NUT: GADMCL-2025-14547

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0026-M-GD

Loreto, 30 de enero de 2026

PARA: Sr. Mgs. Danny Daniel Vargas Tierras
Director de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado

ASUNTO: SOLICITANDO INFORMACIÓN SOBRE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PARA EL PROCESO MCO-GADML-2025-05

Estimado Compañero, mediante Resolución Administrativa Nro. 127-GADML-2025, la máxima autoridad Resuelve designar a mi persona como Administradora del Contrato Nro. 31 Proceso MCO-GADML-2025-05 para la "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", las cuales dentro del mismo contrato en su Claúsula Decima segunda.-DE LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO en su inciso 12.3. numeral 7 establece: "*Coordinar con las direcciones institucionales y con los profesionales de la entidad contratante, que, por su competencia, conocimientos y perfil, sea indispensable su intervención para garantizar la debida ejecución del contrato"*

Ante lo expuesto, y en atención al Memorando Nro.GADMCL-CFISC-2026-0005-M-GD, emitido por la Coordinación de Fiscalización, en el cuál se informa la inexistencia de red de agua potable en el sitio de ejecución de la obra antes mencionada, me permito solicitar a su Dirección se sirva indicar de manera oficial:

- La ubicación exacta de la acometida de agua potable más cercana a la obra
- Si existe la factibilidad técnica de conexión al sistema de agua potable municipal.
- En caso de no existir acometida disponible, señalar las alternativas de provisión de agua (cisternas, tanques de reserva u otros mecanismos) que permitan garantizar la funcionalidad de las instalaciones de cocina, lavamanos y baños de hombres y mujeres contemplados en el proyecto.

La presente solicitud tiene como finalidad asegurar la **higiene, seguridad y operatividad** de la infraestructura en construcción, así como dar cumplimiento a las normas técnicas y contractuales vigentes.

Agradeciendo su atención y pronta respuesta, me suscribo con sentimientos de consideración y respeto.

Atentamente,

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0026-M-GD

Loreto, 30 de enero de 2026

Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA
PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago
COORDINADORA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Referencias:
- GADMCL-CFISC-2026-0005-M-GD

Anexos:
- 2_INFORME_CASA TALLER SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA-signed.pdf
- 4.-PRESUPUESTO_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 3_planimetria_2_CASA TALLER Sinchi Llankak Warmikuna-signed-signed.pdf
- 1.-Docuemntos_scaneado.pdf
- 7.-CUADRILLA_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 8.-EQUIPO_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 6.-CROBARRAS_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 9.-FORMULA_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 10.-MATERIAL_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 11.-MOBRA_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- 15.-PLANTA ARQUITECTONICA CASA TALLER DAHUANO-signed-signed-signed.pdf
- 20.-Certificado_Avaluo_Catastral_2204545101001606000_RURAL-signed.pdf
- 16.-CUBIERTA Y FACHADAS CASA TALLER DAHUANO-signed-signed-signed.pdf
- 17.-INSTALACIONES CASA TALLER DAHUANO-signed-signed-signed.pdf
- 19.-CERTIFICADO DE RIESGOS-GADM CL-CGIR-CR-016-2025-signed.pdf
- 18.-CASA TALLER ACTUALIZADO.dwg
- ANALISIS_PU_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA.xlsx
- COORDENADAS_SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA.xlsx
- 22.-registro usufructo actualizado.pdf
- 23.-USO GOCE COMUNA 24 DE MAYO.pdf
- 21.-CODIGO DE PROYECTO MAATE-RA-2025-547669.rar
- PRESUPUESTO_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA.xlsx
- CUADRILLA_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA.xlsx
- CROBARRAS_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA.xlsx
- FORMULA_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA.xlsx
- 13.-ESP. TECNICAS CASA TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMICUNA-signed.pdf
- 14.-INFORME-DE-NECESIDAD-ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMICUNA-signed.pdf

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0026-M-GD

Loreto, 30 de enero de 2026

- 15.-PROYECTO CASA TALLER _GRUPO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMICUNA-signed.pdf
- Certificación POA.pdf
- Resolucion-8reforma-PAC-signed.pdf
- CERTIFICACION-PAC-signed.pdf
- certificacion 576.pdf
- Formulario de requerimiento
- Informe de necesidad
- GADMCL-DGOPM-2025-1214-M-GD.pdf
- PLIEGO-signed.pdf
- contratacion_pli_menobr.rar
- RESOLUCION-INICIO-signed.pdf
- acta_002_preguntas_y_respuestas_proceso_mco-gadml-2025-05-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_001_DESIGNACIÓN_DE_SECRETARIO_MCO-GADML-2025-05-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0114-M-GD.pdf
- OFERTAS-TECNICAS-FORMATO-MFC-USHAY.part2.rar
- OFERTAS-TECNICAS-FORMATO-MFC-USHAY.part4.rar
- OFERTAS-TECNICAS-FORMATO-MFC-USHAY.part3.rar
- OFERTAS-TECNICAS-FORMATO-MFC-USHAY.part1.rar
- ACTA_005_CALIFICACION_MCO-GADML-2025-05-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_004_CONVALIDACION_DE_ERRORES_MCO-GADML-2025-05-signed-signed-signed-signed.pdf
- ACTA_003_APERTURA_DE_OFERTAS_MCO-GADML-2025-05-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0125-M-GD.pdf
- INFORME_EVALUACION_RECOMENDACION_ADJUDICACION-signed-signed-signed-signed.pdf
- GADMCL-CCMI-2025-0131-M-GD.pdf
- RESOLUCION-DE-ADJUDICACION-signed.pdf
- RUP.pdf
- nombramiento.pdf
- Francazu-signed (1).pdf
- CONSTRUCCIONES_FRANCAZU_CIA__LTDA__1900669220000000-signed-signed-signed-signed.pdf
- CONSTRUCCIONES_FRANCAZU_CIA__LTDA__1300849230000000-signed-signed-signed-signed.pdf
- registro.pdf
- 31 CONTRATO CONSTRUCCION-signed-signed.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0224-M-GD.pdf
- registro de garatía cumplimiento de contrato.pdf
- REGISTRO DE CONTRATO.pdf
- registro de garantía buen uso de anticipo.pdf
- GADMCL-DGOPM-2025-1805-M-GD.pdf
- GADMCL-A-2025-3900-M-GD.pdf
- CONTRATO MODIFICATORIO CASA COMUNAL-signed-signed.pdf
- GADMCL-GPS-2025-0278-M-GD.pdf
- certificado_empresa_ruc (56).pdf
- SUPERCIASfranncazu.pdf
- CALCULO PAGO francazu20250908_15210617.pdf
- CHECK LIST francazu20250909_07483199.pdf
- buen uso de anticipo n 378 construcciones francazu cia ltda-signed.pdf

Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0026-M-GD

Loreto, 30 de enero de 2026

-
ANALISIS_PU_2025_CASA_TALLER_ASO_MUJERES_SHINCHI_LLANKAK_WARMIKUNA-signed.pdf
- POLIZA CIA FRANCAZO BU-0066922-signed.pdf
- RENOVACION BU-0066922-signed-signed.pdf
- propuesta de pago no 2133 - francazu.pdf
- comprobante de pago no 2078 - francazu.pdf
- OPI 0227 CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA.pdf
- GADMCL-CT-2025-1588-M-GD - reporte de transferencia 227.pdf
- OPI 0227 CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA.pdf
- POLIZA_BU 0066922-signed-signed-signed-signed.pdf
- POLIZA CIA FRANCAZO BU-0066922-signed.pdf
- POLIZA FC-0084923-signed-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Kleber Fabián Olalla Torres
Alcalde del Cantón Loreto

Sr. Ing. Edison Alberto Egüez Cevallos
Director de Gestión de Obras Públicas y Mantenimiento

Sr. Ing. Carlos Norberto Vélez Burgos
Coordinador de Fiscalización

NUT: GADMCL-2025-4311

INFORME TÉCNICO 002-GADML-RJN-MIR-2025-IPC

Loreto, 06 de febrero de 2026

1 DATOS

SECTOR:	RECINTO SANTA LUCÍA
PARROQUIA:	SAN JOSÉ DE DAHUANO.
CANTÓN:	LORETO.
OBJETO DEL INFORME:	FACTIBILIDAD TÉCNICA DE CONEXIÓN DE AGUA PARA LA CASA TALLER SHINCHI LLANKAN WARMIKUNA QUE SE CONSTRUYE EN EL RECINTO SANTA LUCÍA, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO.
RESPONSABLE DEL INFORME:	ING. RODRIGO NOGUERA, MG. *COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES.*

2 BASE LEGAL.

- **CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR**

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:
(…)
Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
(…)

- **COOTAD**

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; (…)
d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley; (…)

3 ANTECENDENTES

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCMI-2026-0026-M-GD, La Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago, Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructura, solicita a la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado un Informe técnico que cuente con los siguientes puntos:

- La ubicación exacta de la acometida de agua potable más cercana a la obra.
- Si existe la factibilidad técnica de conexión al sistema de agua potable municipal.
- En caso de no existir acometida disponible, señalar las alternativas de provisión de agua (cisternas, tanques de reserva u otros mecanismos) que permitan garantizar la funcionalidad de las instalaciones de cocina, lavamanos y baños de hombres y mujeres contempladas en el proyecto.

4 DESARROLLO

La casa taller SHINCHI LLANKAN WARMIKUNA se construye en el Recinto Santa Lucía, y sus límites se describen en el siguiente cuadro:

Orientación	Lado		Distancia (m)	Colindante
	EST	PV		
Norte	P1	P2	25	Cancha deportiva del recinto
Este	P1	P4	25	Sra. Zenaida Magdalena Yumbo Chongo
Oeste	P2	P3	25	Casa comunal del recinto
Sur	P3	P4	25	Sr. Iván Héctor Alvarado Chongo

Cuadro 1. Datos de planimetría. Fuente: INFORME N° GADML-DP-2024-002-SCH

El Recinto Santa Lucía cuenta con un sistema de abastecimiento de agua a cargo de una junta de agua, el cual, se despliega por el margen derecho de la vía en dirección hacia la ciudad de Loreto, como se muestra en la siguiente imagen:



Imagen 1. Con rojo, línea de abastecimiento de agua del recinto Santa Lucía. Con azul, área de construcción de la casa taller SHINCHI LLANKAN WARMIKUNA.

El servicio de abastecimiento agua del Recinto Santa Lucía no es constante debido a que este depende de las lluvias que alimentan al estero de donde se capta agua. Por esto, es recomendable que la obra cuente con su propia fuente de abastecimiento para contar con agua de manera ininterrumpida. Esto podría ser mediante la perforación y adecuación de un pozo y posterior a este, un tratamiento local según el análisis de agua que debe realizarse.

Otra alternativa es la construcción de una cisterna para el almacenamiento de agua y con esto, la coordinación con la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado para la entrega del servicio de abastecimiento de agua mediante el tanquero municipal. Este, llena su tanque en la PTAP Juan Montalvo y entrega agua a las comunidades que no cuentan con sistemas de abastecimiento del líquido vital.

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En atención a los puntos solicitados:

- La acometida más próxima se encuentra al margen derecho de la vía E20 en sentido hacia la ciudad de Loreto. (Ver Imagen 1.)
- Existe un sistema de abastecimiento de agua que no entrega de manera constante el servicio y está a cargo de la junta de agua de dicho recinto. Por lo que no es técnicamente factible la conexión en dicho sistema.
- Se recomienda que la casa taller SHINCHI LLANKAN WARMIKUNA que se construye en el Recinto Santa Lucía cuente con su propio sistema para el abastecimiento de agua. Esto, según la disponibilidad presupuestaria, puede optarse entre la construcción de un pozo con post tratamiento, o la construcción de una cisterna y la coordinación con la Dirección de Gestión de Agua Potable y Alcantarillado para su llenado en días preestablecidos.

Firmado electrónicamente por:
RODRIGO JAVIER NOGUERA MENDOZA
Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Rodrigo Noguera, Mg.
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES.
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

ACTA 001
DE APERTURA DE OFERTAS

En la Ciudad de Loreto, el 8 de Septiembre del 2026, siendo las 17:30 pm, en la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, ubicado en el primer piso alto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, en la Av. Rafael Andrade y Gregorio Urapari, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, Comparece la ing. Belén Párraga Intriago, Coordinadora de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura designada mediante resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026 para llevar a cabo la fase precontractual del proceso LICITACIÓN DE OBRA Nro. LICO-GADML-2026-10 "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO

CÓDIGO DE PROCESO	LICO-GADML-2026-10
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ETAPA PRECONTRACTUA:	Ing. Belén Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructuras
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$52.137,96 Cincuenta y dos mil ciento treinta y siete con 96/100 centavos, sin incluir IVA.

2. ANTCEDENTES

Mediante Resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026, de 04 de agosto de 2026, la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, el pliego, sus anexos, las condiciones económicas, la metodología de evaluación y el cronograma; autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra Nro. LICO-GADML-2026-10; y designó a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago como servidora responsable de atender, sustanciar y llevar a cabo las actuaciones de la fase precontractual, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General a la LOSNCP.

El procedimiento tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", CPC Nro. 532900011, con presupuesto referencial de USD 52.137,96879 sin incluir IVA, quince (15) rubros, plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, anticipo del treinta y cinco por ciento (35 %) y saldo del sesenta y cinco por ciento (65 %) mediante planillas de avance.

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0749-M-GD, de 08 de septiembre de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió una (1) oferta técnica y económica descargada del Portal de Contratación Pública, en formato MFC-USHAY y con documentos cargados directamente al SOCE.

3. DESARROLLO DEL DOCUMENTO

APERTURA DE OFERTAS

Se deja constancia que los oferentes han cumplido con la entrega de las ofertas técnicas a través del portal de compras públicas, de conformidad con el siguiente detalle:

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	CONTIENE:
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001	$ 52.107,36	45 DIAS	28 archivos, 2 Carpetas. 10.1 MB

La existencia de una sola oferta no implica por sí misma aceptación, cumplimiento ni adjudicación. Su efecto es únicamente que la evaluación posterior se realizará respecto de un solo participante, manteniendo íntegramente las reglas de habilitación, integridad, experiencia, oferta económica, puntaje y verificación de impedimentos previstas en el pliego.

VINCULACIÓN DE LA HABILITACIÓN DE LOS OFERNTES, SOCIOS U ACCIONISTAS EN EL RUP Y VINCULACIÓN DE OFERTAS.

Nro.	SUJETO	RUC	CALIDAD	ESTADO RUP	VINCULACIÓN DE OFERTAS
1	LORETOGREEN S.A	2290325954001	Oferente	Habilitado	NO
2	Edgar Geovanny Asanza Apolo	0702973538001	Representante legal y accionista 58,06 %	Habilitado	NO
3	Angelo Geovanny Asanza Gualan	2100348529001	Accionista 41,94 % y beneficiario final	Habilitado	NO
4	OLAMAR CONSTRUCTIONS HMBCONST S.A.	1792983347001	Subcontratista	Habilitado	NO

Concluida la apertura de ofertas y habiendo recibido UNA (1) oferta presentada en el Sistema Oficial de Contratación Pública, se suscribe la presente acta en la oficina de Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Loreto el día 10 de septiembre de

2026, en cumplimiento al art. 98 del reglamento General a la LOSNCP y se dispone al profesional encargado del portal de compras públicas, eleve la presente Acta al Portal de Compras.

Se evidencia que, durante la apertura de las ofertas, NO estuvieron presentes los oferentes.

Para constancia de lo actuado se suscribe el presente documento y firma.

Atentamente.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Párraga Intriago Belén Stefanía
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de infraestructura
PROFESIONAL DESIGNADA PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ANEXOS (VERIFICACIÓN DE HABILITACIÓN DEL RUP)

OFERENTE: 1

LORETOGREEN S.A, en calidad de oferente.



Edgar Geovanny Asanza Apolo, en calidad de Representante legal.



Angelo Geovanny Asanza Gualan, en calidad de accionista.



OLAMAR CONSTRUCTIONS HMBCONST S.A., en calidad de Subcontratista.



Jueves 10 de Septiembre del 2026 10:54 | **RUC:** 1560001830001 | **Entidad:** MUNICIPIO DE LORETO | U

Consultar | Entidad Contratante | Administración

»Buscar Empresas

Imprimir

PAÍS	ESTADO / PROVINCIA	CANTÓN	NATURALEZA	RUC / NÚM. IDENTIFICA
ECUADOR	..Todas	..Todas	..Todos	179298334700

UBICACIÓN	EMPRESA	RUC / NÚM.IDENTIF.	FECHA HABILITACIÓN	ESTADO RUP	INFORMACIÓN ADICIONAL
LORETO	OLAMAR CONSTRUCTIONS HMBCONST S.A.	1792983347001	2020-01-22	Habilitado	Mostrar

ACTA 002
CONVALIDACIÓN DE ERRORES

En la Ciudad de Loreto, el 08 de Septiembre de 2026, siendo las 17:30 pm, en la Dirección de Obras Públicas y Mantenimiento, ubicado en el primer piso alto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loreto, en la Av. Rafael Andrade y Gregorio Urapari, Cantón Loreto, Provincia de Orellana, Comparece la ing. Belén Párraga Intriago, Coordinadora de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura designada mediante resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026 a fin de dar cumplimiento con la etapa de Convalidación de errores, relacionada con el proceso LICO-GADML-2026-10 "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA."

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO:

CÓDIGO DE PROCESO	LICO-GADML-2026-10
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ETAPA PRECONTRACTUA:	Ing. Belén Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructuras
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$52.137,96 Cincuenta y dos mil ciento treinta y siete con 96/100 centavos, sin incluir IVA.

1. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026, de 04 de agosto de 2026, la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, el pliego, sus anexos, las condiciones económicas, la metodología de evaluación y el cronograma; autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra Nro. LICO-GADML-2026-10; y designó a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago como servidora responsable de atender, sustanciar y llevar a cabo las actuaciones de la fase precontractual, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General a la LOSNCP.

El procedimiento tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", CPC Nro. 532900011, con presupuesto referencial de USD 52.137,96879 sin incluir IVA, quince (15) rubros, plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, anticipo del treinta y cinco por ciento (35 %) y saldo del sesenta y cinco por ciento (65 %) mediante planillas de avance.

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0749-M-GD, de 08 de septiembre de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió una (1) oferta técnica y económica descargada del Portal de Contratación Pública, en formato MFC-USHAY y con documentos cargados directamente al SOCE.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 001 APERTURA DE OFERTAS, se realizó la apertura de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	CONTIENE:
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001	$ 52.107,36	45 DIAS	28 archivos, 2 Carpetas. 10.1 MB

2. BASE LEGAL

Que**,** El Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala:

Art. 100 Convalidación de errores de forma. – Las ofertas, una vez presentadas no podrán modificarse. No obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la entidad contratante, dentro del término mínimo de dos (2) días o máximo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de notificación.

Dicho término se fijará a criterio de la entidad contratante, en relación con el procedimiento de contratación y al nivel de complejidad y magnitud de la información requerida. El pedido de convalidación será notificado a todos los oferentes, a través del Portal de Contratación Pública.

Se considera error de forma o de naturaleza convalidable, entre otros, lo siguiente:

1. Errores tipográficos, de foliado u organización de la oferta;
2. Certificación de documentos sobre su capacidad legal, técnica o económica;
3. Cualquier error en el llenado del formulario de la oferta. Se considerarán convalidables también todos los requisitos que constituyen la integridad de la oferta;
4. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que, de cualquiera de los documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de presentación de ofertas.
De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de presentación de las ofertas, la misma no será considerada;
5. Las contradicciones o discordancias establecidas entre la información proporcionada por el proveedor en cualquier parte de su oferta y la documentación que lo respalda;

La documentación de soporte que haya sido adjuntada en la oferta pero que no conste expresamente señalada en la oferta, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego, y se podrá pedir convalidación de errores en virtud de la documentación adjunta. No será convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de presentación de ofertas.
Podrá requerirse documentación de soporte respecto de la información que consta en la oferta y que no

se encuentre respaldada. En ningún caso, los documentos adicionales requeridos modificarán el objeto de la oferta;
6. Ilegibilidad o falta de claridad de la información o documentación. Podrán aclarar o ampliar una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. Esto incluye información detallada en los formularios;
7. Cualquier anexo de la oferta que no cuente con firma electrónica. La convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar los anexos con firma electrónica;
8. Cualquier oferta presentada con firma electrónica de un sistema diferente al establecido por el ente rector de las telecomunicaciones, sus anexos o certificados. La convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con la firma electrónica autorizada por el ente rector de las telecomunicaciones.
De igual manera, en el caso de que la entidad contratante no pueda validar la firma electrónica, solicitará al oferente que remita nuevamente el documento suscrito electrónicamente, el mismo que podrá ser firmado con fecha posterior a la presentación de la oferta. Será responsabilidad del oferente verificar que los documentos firmados electrónicamente se encuentren debidamente validados;
9. En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación, difiera con las características, descripciones, detalles o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, la convalidación consistirá en que el oferente presente una nueva muestra; y,
10. En caso de procedimientos de contratación de obra, será convalidable el análisis de precios unitarios que cuente con salarios inferiores a los determinados por la Contraloría General del Estado, en cuanto al personal que integre la mano de obra. El monto del análisis de precio unitario, no podrá variar al monto ofertado.
En los modelos obligatorios de pliegos, el SERCOP podrá establecer otros casos de errores de forma de naturaleza convalidable.
En caso de duda sobre la existencia de errores de forma o de naturaleza convalidable, la Comisión Técnica o el delegado del procedimiento enviará a convalidar la oferta, para lo cual se aplicará los principios de igualdad y racionalidad.

Art. 101.- Errores aritméticos. - Los errores aritméticos de la oferta económica serán corregidos por parte del proveedor, por pedido de la entidad contratante. Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras, el precio unitario ofertado será el constante en el Análisis de Precios Unitarios -APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y precios.
De existir diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios Unitarios.
Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas, se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva, por parte del proveedor.
Si existe contradicción entre la información escrita en letras y números, prevalecerá la información escrita en letras.

Art. 102.- Errores no convalidables. - Son errores no convalidables los siguientes:

1. La falta de documentación e información que no tenga referencia en la oferta.
2. El incumplimiento de requerimientos técnicos de la oferta.
La existencia de errores no convalidables constituirá causal para el rechazo de la oferta.

Art. 103.- Prohibición de convalidación. - Las entidades contratantes no podrán, durante la etapa de convalidación de errores requerir a los oferentes documentos o información que no se encuentre referenciada en la oferta o condiciones que no hubieran estado previstas en el pliego.
Tampoco podrán las entidades contratantes dentro de esta etapa, formular aclaraciones, modificaciones o

nuevos requerimientos respecto de las condiciones establecidas en el pliego, ni sobre las capacidades técnicas, económicas o legales de los oferentes.

3. CONVALIDACIÓN DE ERRORES:

De la revisión realizada de la documentación consignada en cada una de las ofertas presentadas se desprenden los siguientes resultados:

Nro.	OFERENTE / PROCURADOR COMÚN	RUC	DEBE CONVALIDAR	NO DEBE CONVALIDAR
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001		X

4. CONCLUSIONES

En virtud del análisis de las ofertas presentadas, se determina que **NO EXISTEN ERRORES** que deban ser convalidados

Se da por concluida el Acta de Convalidación de Errores.

Para constancia y en fe de lo actuado se suscribe el presente documento por el técnico designado.

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Párraga Intriago Belén Stefanía
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de infraestructura
PROFESIONAL DESIGNADA PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ACTA 003
ACTA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS
ETAPA CUMPLE/NO CUMPLE.

Loreto, 10 de septiembre de 2026

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO:

CÓDIGO DE PROCESO	LICO-GADML-2026-10
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ETAPA PRECONTRACTUA:	Ing. Belén Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructuras
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$52.137,96 Cincuenta y dos mil ciento treinta y siete con 96/100 centavos, sin incluir IVA.

1. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026, de 04 de agosto de 2026, la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, el pliego, sus anexos, las condiciones económicas, la metodología de evaluación y el cronograma; autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra Nro. LICO-GADML-2026-10; y designó a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago como servidora responsable de atender, sustanciar y llevar a cabo las actuaciones de la fase precontractual, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General a la LOSNCP.

El procedimiento tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", CPC Nro. 532900011, con presupuesto referencial de USD 52.137,96879 sin incluir IVA, quince (15) rubros, plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, anticipo del treinta y cinco por ciento (35 %) y saldo del sesenta y cinco por ciento (65 %) mediante planillas de avance.

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0749-M-GD, de 08 de septiembre de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió una (1) oferta técnica y económica descargada del Portal de Contratación Pública, en formato MFC-USHAY y con documentos cargados directamente al SOCE.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 001 APERTURA DE OFERTAS, se realizó la apertura de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	CONTIENE:
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001	$ 52.107,36	45 DIAS	28 archivos, 2 Carpetas. 10.1 MB

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 002 CONVALIDACIÓN DERRORES, se concluyó que no existieron errores que deban ser convalidables.

2. DESARROLLO DEL PROCESO.

En uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a lo establecido en la Sección IV Se realiza el punto 4.1. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS, se evaluará considerando la presentación de los Formularios y requisitos mínimos previstos en el pliego de acuerdo con el siguiente detalle

Parámetro	Resultado	Motivación y evidencia
Integridad de la oferta	CUMPLE	Se verificaron formularios, anexos y documentos obligatorios.
Habilitación RUP y capacidad para contratar	CUMPLE	LORETOGREEN S.A. figura HABILITADA en consulta SOCE del 08/09/2026; también constan habilitados los dos accionistas identificados y el subcontratista propuesto. La consulta se incorpora con su hora real de emisión.
Equipo mínimo	CUMPLE	Conforme al numeral 4.1.1 y artículo 108, el requisito precontractual se satisface con el Formulario de Compromiso; se encuentran parametrizados excavadora, 2 volquetas, compactación, termofusión, concretera y vibrador.
Personal técnico mínimo	CUMPLE	El compromiso contractual cubre Residente de Obra y Especialista Ambiental; la oferta además los individualiza por nombre y título.
Experiencia mínima del personal técnico	CUMPLE	La verificación de experiencia del personal es obligación contractual conforme al pliego y se considera satisfecha en esta etapa con el compromiso debidamente suscrito.
Experiencia general mínima	CUMPLE	Se exige USD 10.427,59376. El monto diferenciado destinado a experiencia general asciende a USD 126.475,97, suficiente para el mínimo y para experiencia adicional.

Parámetro	Resultado	Motivación y evidencia
Experiencia específica mínima	CUMPLE	Se exige USD 5.213,79688. El monto diferenciado destinado a experiencia específica asciende a USD 127.505,84, proveniente de componentes directamente vinculados con cierre técnico, celdas, lixiviados y chimeneas.
Metodología de construcción	CUMPLE	Se cubre con el Formulario de Compromiso y, adicionalmente, existe metodología detallada coherente con los frentes de obra y 45 días.
Cronograma de ejecución	CUMPLE	Se cubre con el Formulario de Compromiso; adicionalmente se presentó cronograma de siete períodos con avance final del 100 %.
Participación ecuatoriana mínima	CUMPLE	Mínimo del proyecto: 70,65 %. La matriz firmada de la oferta reporta 79,27400 %
Patrimonio	NO APLICA	El pliego señala expresamente que no se requiere patrimonio por el monto del presupuesto referencial.
Índices financieros	REFERENCIAL	Solvencia 24,87 y endeudamiento 0,02. Ambos son información de referencia y no causales autónomas de rechazo.
Ley Amazónica	CUMPLE / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	La oferta reconoce el régimen especial y contiene compromiso reforzado. La verificación material de nómina y servicios corresponde a la ejecución contractual.
CONCLUSIÓN: La oferta presentada por el oferente LORETOGREEN S.A., con RUC: Nro. 2290325954001 CUMPLE, con la integridad establecida en los pliegos del procedimiento.		

EXPERIENCIA DEL OFERENTE:

La oferta acredita el contrato Nro. 01-ES-A-GADML-2023-00004, relativo a la "CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE TÉCNICO Y CELDAS EMERGENTES EN EL BOTADERO MUNICIPAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA (FASE 1)", ejecutado por LORETOGREEN S.A. para el GAD Municipal del Cantón Loreto. El Acta de Entrega Recepción Definitiva de 11 de diciembre de 2024 registra monto contractual de USD 253.981,86 y monto total ejecutado de USD 253.981,81. También deja constancia de cero días de retraso y un plazo ejecutado de setenta y nueve (79) días.

El detalle del acta evidencia trabajos directamente relacionados con el objeto actual: movimiento de tierras, conformación de celdas, geomembrana termofundida, drenajes y tuberías para lixiviados, chimeneas de captación de gases, cajas y obras complementarias. En consecuencia, el instrumento es objetivamente

pertinente tanto para la definición de experiencia general en obras sanitarias o ambientales como para la experiencia específica en cierre técnico y celdas de disposición final de residuos sólidos.

REGLA DE NO DOBLE VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN ECONÓMICA DIFERENCIADA:

Para evitar que el mismo valor económico sea utilizado simultáneamente como experiencia general adicional y experiencia específica adicional, la oferta acompaña una matriz que distribuye el monto ejecutado en dos segmentos económicos no superpuestos: USD 127.505,84 destinados a componentes específicos de celdas emergentes, drenajes de lixiviados y chimeneas; y USD 126.475,97 correspondientes a los restantes componentes ambientales del contrato. Ambos valores suman USD 253.981,81, por lo que existe trazabilidad matemática y no se duplica un mismo monto

Uso de experiencia	Monto diferenciado	Mínimo exigido	Resultado
Experiencia general	USD 126.475,97	USD 10.427,59376	CUMPLE
Experiencia específica	USD 127.505,84	USD 5.213,79688	CUMPLE

El cumplimiento de los mínimos no depende de un número determinado de contratos. El pliego permite uno o varios instrumentos y admite que un mismo contrato pueda acreditar simultáneamente los requisitos mínimos cuando satisfaga ambas definiciones. La separación económica se utiliza principalmente para la etapa de puntaje adicional, garantizando que no exista doble contabilización del mismo valor.

3. REVISIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA.

El presupuesto referencial asciende a USD 52.137,96879 sin IVA y la oferta a USD 52.107,36879 sin IVA. La diferencia es de USD 30,60000, equivalente aproximadamente al 0,05869 %. Se verificó que las cantidades de los quince rubros coinciden con el pliego. Catorce precios unitarios son iguales a los referenciales y únicamente el rubro 3, "GEOMEMBRANA TERMOFUNDIDA 1.00 MM", disminuye de USD 9,21106 a USD 9,19906; multiplicada por 2.550 m², esta diferencia explica exactamente la reducción global de USD 30,60000.

		PRESUPUESTO REFERENCIAL			PRESUPUESTO OFERTADO		
Nro.	Rubro	Und.	Cant.	P.U. ref.	P.U. ofert.	Subtotal ofert.	Variación P.U.
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	m²	1200	1,09998	1,09998	1.319,97600	Sin variación
2	CONFORMACIÓN DE MUROS PERIMETRALES (INCLUYE MINADO, CARGADO, TRANSPORTE DE MATERIAL Y COMPACTACIÓN CADA 30CM)	m³	1950	9,96336	9,96336	19.428,55200	Sin variación
3	GEOMEMBRANA TERMOFUNDIDA 1.00 MM	m²	2550	9,21106	9,19906	23.457,60300	-0,01200

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

		PRESUPUESTO REFERENCIAL			PRESUPUESTO OFERTADO		
Nro.	**Rubro**	**Und.**	**Cant.**	**P.U. ref.**	**P.U. ofert.**	**Subtotal ofert.**	**Variación P.U.**
4	RASANTEO DE TALUD A MÁQUINA	m²	804	1,42814	1,42814	1.148,22456	Sin variación
5	MATERIAL DE MEJORAMIENTO (LASTRE) PARA RAMPA DE ACCESO	m³	180	20,04876	20,04876	3.608,77680	Sin variación
6	ESTRUCTURA DE CHIMENEA	u	8	55,63128	55,63128	445,05024	Sin variación
7	TUBERÍA PVC D=110MM PERFORADO	m	32	11,10408	11,10408	355,33056	Sin variación
8	RELLENO PIEDRA BOLA	m³	16	19,90092	19,90092	318,41472	Sin variación
9	EXCAVACIÓN A MANO	m³	30.4	5,46588	5,46588	166,16275	Sin variación
10	DESALOJO DE MATERIAL	m³	30.4	2,57400	2,57400	78,24960	Sin variación
11	EXCAVACIÓN A MANO	m³	5.8	5,46588	5,46588	31,70210	Sin variación
12	DESALOJO DE MATERIAL	m³	5.8	2,57400	2,57400	14,92920	Sin variación
13	HORMIGÓN SIMPLE FC=280 KG/CM2	m³	2.6	291,93966	291,93966	759,04312	Sin variación
14	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	kg	201	2,70574	2,70574	543,85374	Sin variación
15	TUBERÍA PVC D=160MM CORRUGADA DRENAJE	m	40	10,78751	10,78751	431,50040	Sin variación

Conforme al pliego, los APU no son un requisito autónomo Cumple/No Cumple, pero su revisión permite corroborar que existe una estructura de costos asociada a cada rubro. El total calculado en las hojas de trabajo, USD 52.107,368792, y el total visible del Formulario Único, USD 52.107,36879, son equivalentes; la diferencia de millonésimas responde exclusivamente al número de decimales mostrado y no constituye error aritmético material.

4. PARTICIPACIÓN ECUATORIANA Y DESAGREGACION TECNOLÓGICA.

El requisito de participación ecuatoriana mínima se considera satisfecho, sin perjuicio de las verificaciones y obligaciones contractuales posteriores.

VAE DEL PROYECTO	VAE OFERTADO
70.65%	79.27%

5. CONCLUSIONES

Una vez concluida la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, así como la evaluación y calificación conforme a los parámetros establecidos en los pliegos del procedimiento de Licitación de Obras No. LICO-GADML-2026-10, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", se determina que el oferente LORETOGREEN S.A., con RUC No**.** 2290325954001, cumple con los requisitos de integridad de la oferta y los requisitos mínimos de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, por lo tanto pasa a la siguiente metodología EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Párraga Intriago Belén Stefanía
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de infraestructura
PROFESIONAL DESIGNADA PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL

ACTA 004
ACTA DE EVALUACIÓN POR PUNTAJE Y CALIFICACIÓN FINAL

Loreto, 11 de septiembre de 2026

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO:

CÓDIGO DE PROCESO	LICO-GADML-2026-10
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ETAPA PRECONTRACTUA:	Ing. Belén Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructuras
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$52.137,96 Cincuenta y dos mil ciento treinta y siete con 96/100 centavos, sin incluir IVA.

1. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026, de 04 de agosto de 2026, la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, el pliego, sus anexos, las condiciones económicas, la metodología de evaluación y el cronograma; autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra Nro. LICO-GADML-2026-10; y designó a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago como servidora responsable de atender, sustanciar y llevar a cabo las actuaciones de la fase precontractual, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General a la LOSNCP.

El procedimiento tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", CPC Nro. 532900011, con presupuesto referencial de USD 52.137,96879 sin incluir IVA, quince (15) rubros, plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, anticipo del treinta y cinco por ciento (35 %) y saldo del sesenta y cinco por ciento (65 %) mediante planillas de avance.

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0749-M-GD, de 08 de septiembre de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió una (1) oferta técnica y económica descargada del Portal de Contratación Pública, en formato MFC-USHAY y con documentos cargados directamente al SOCE.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 001 APERTURA DE OFERTAS, se realizó la apertura de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	CONTIENE:
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001	$ 52.107,36	45 DIAS	28 archivos, 2 Carpetas. 10.1 MB

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 002 CONVALIDACIÓN DERRORES, se concluyó que no existieron errores que deban ser convalidables.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 003 DE EVALUACIPON DE REQUISITOS MÍNIMOS ETAPA CUMPLE/NO CUMPLE, se concluye que el único oferente LORETOGREEN S.A. con RUC 2290325954001, cumple con todos los requisitos de integridad de la oferta y los requisitos mínimos de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, por lo tanto pasa a la siguiente metodología EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

2. DESARROLLO DEL PROCESO.

La evaluación por puntaje procede únicamente respecto de ofertas que hayan superado íntegramente la etapa "Cumple / No Cumple". Conforme al Acta Nro. 003, LORETOGREEN S.A. cumple los requisitos mínimos y, por tanto, corresponde aplicar la metodología de evaluación aprobada como parte integrante del pliego. La existencia de una sola oferta no elimina las fórmulas ni autoriza una calificación discrecional; simplemente determina que, en los parámetros comparativos, la única oferta habilitada constituye a su vez el valor máximo o mínimo de referencia, según corresponda.

La metodología distribuye:

Parámetro	Valoración
Experiencia general	10
Experiencia especifica	25
Otros parámetros resueltos por la entidad	0
Oferta económica	50
Subcontratación	5
Participación Ecuatoriana	10
TOTAL	

EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL – 10 PUNTOS

MONTO MÍNIMO REQUERIDO: $10.427,59
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL PARA PUNTUAR: $65.172,46


OBJETO DE CONTRATO	MONTO EJECUTADO	MONTO DIFERENCIADO
CONSTRUCCIÓN TÉCNICO Y CELDAS EMERGENTES EN EL BOTADERO MUNCIPAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA (FASE 1)	$253.981,81	+ $ 178.381,76

El Monto diferenciado se produce luego de sustraer el monto mínimo exigido, y el monto de experiencia general adicional para puntuar. El excedente válido acreditado por LORETOGREEN S.A. es superior al techo que el propio expediente fijó para la experiencia general adicional. Por ello, cualquier monto por encima de ese límite carece de efecto incremental y no genera puntaje adicional distinto de los diez puntos previstos.

VERIFICACIÓN DE CPC

CPC DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: 532900011

CPC DE LA EXPERIENCIA: 532900011

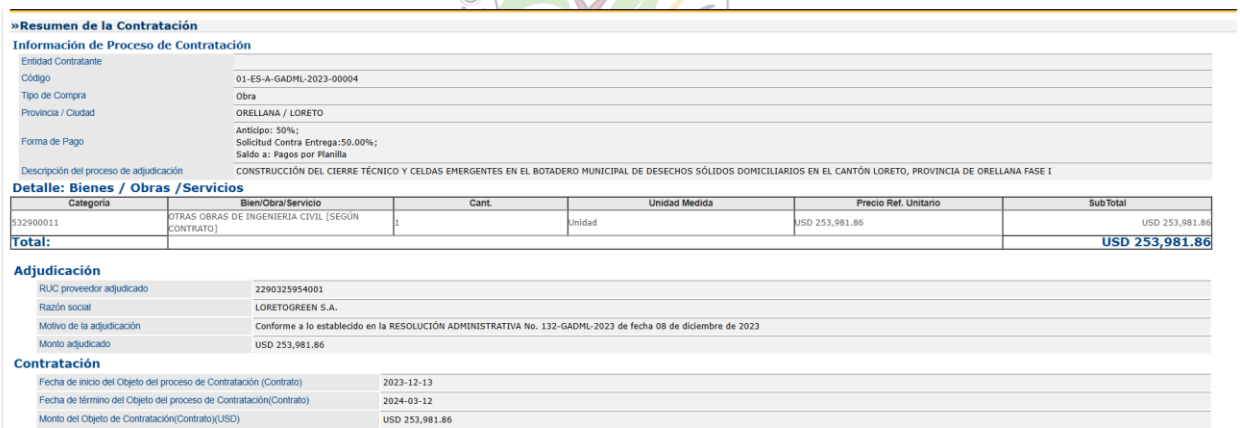

»Resumen de la Contratación

Información de Proceso de Contratación

Entidad Contratante	
Código	01-ES-A-GADML-2023-00004
Tipo de Compra	Obra
Provincia / Ciudad	ORELLANA / LORETO
Forma de Pago	Anticipo: 50%; Solicitud Contra Entrega:50.00%; Saldo a: Pagos por Planilla
Descripción del proceso de adjudicación	CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE TÉCNICO Y CELDAS EMERGENTES EN EL BOTADERO MUNICIPAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA FASE I

Detalle: Bienes / Obras /Servicios

Categoria	Bien/Obra/Servicio	Cant.	Unidad Medida	Precio Ref. Unitario	SubTotal
532900011	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL [SEGÚN CONTRATO]	1	Unidad	USD 253,981.86	USD 253,981.86
Total:					**USD 253,981.86**

Adjudicación

RUC proveedor adjudicado	2290325954001
Razón social	LORETOGREEN S.A.
Motivo de la adjudicación	Conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 132-GADML-2023 de fecha 08 de diciembre de 2023
Monto adjudicado	USD 253,981.86

Contratación

Fecha de inicio del Objeto del proceso de Contratación (Contrato)	2023-12-13
Fecha de término del Objeto del proceso de Contratación(Contrato)	2024-03-12
Monto del Objeto de Contratación(Contrato)(USD)	USD 253,981.86

TIPO DE EXPERIENCIA	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA	EXPERIENCIA PARA PUNTUACIÓN	EXPERIENCIA MÁXIMA PARA PUNTUACIÓN	PUNTAJE PROPORCIONAL
EXPERIENCIA GENERAL	$10.427,59	$253.981,81	$65.172,46	10.00

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL – 25 PUNTOS

MONTO MÍNIMO REQUERIDO: $5.213,79
EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL PARA PUNTUAR: $65.172,46

OBJETO DE CONTRATO	MONTO SOBRANTE DE LA EXPERIENCIA GENERAL	MONTO DIFERENCIADO
CONSTRUCCIÓN TÉCNICO Y CELDAS EMERGENTES EN EL BOTADERO MUNCIPAL DE DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA (FASE 1)	+ $ 178.381,76	+ $107.995.51

TIPO DE EXPERIENCIA	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA	EXPERIENCIA PARA PUNTUACIÓN	EXPERIENCIA MÁXIMA PARA PUNTUACIÓN	PUNTAJE PROPORCIONAL
EXPERIENCIA ESPECIFICA	$5.213,79	$178.381,46	$65.172,46	25.00

La asignación de los 25 puntos no duplica el monto utilizado para experiencia general: la matriz del oferente separa los componentes específicos y los restantes en montos económicos diferentes.

Este calculo permite demostrar que el mismo valor monetario no ha sido utilizado dos veces para obtener puntaje adicional en parámetros distintos.

OFERTA ECONÓMICA – 50 PUNTOS

La oferta económica válida es de USD 52.107,36879 sin IVA. Al existir una sola oferta habilitada, ésta es simultáneamente OEmin y OEi. La fórmula POE = (OEmin / OEi) × 50 se convierte en (52.107,36879 / 52.107,36879) × 50 = 50,00 puntos.

La diferencia frente al presupuesto referencial equivale aproximadamente al 0,058 %. De la revisión de los quince rubros se determinó que catorce precios unitarios coinciden con los precios referenciales y que la única disminución se concentra en el rubro 3, geomembrana termofundida de 1,00 mm: el precio unitario baja en USD 0,01200 y, aplicado a 2.550 m^2, explica exactamente los USD 30,60 de diferencia. Este control permite vincular matemáticamente el valor global con la tabla de cantidades y precios.

SUBCONTRATACIÓN – 5 PUNTOS

La oferta registra un compromiso de subcontratación con OLAMAR CONSTRUCTIONS HMBCONST S.A., RUC 1792983347001, para los rubros 1, 2, 4, 9, 10, 11 y 12, por un valor consolidado de USD 15.632,20 equivalente aproximadamente al 29,99 % del valor ofertado.

La documentación permite identificar al subcontratista, los rubros comprometidos y su habilitación en el RUP.

No obstante, este parámetro no admite una asignación manual distinta de la herramienta oficial: la metodología aprobada dispone expresamente que el puntaje de subcontratación será el que refleje el MFC/SOCE y que la Comisión Técnica o quien haga sus veces deberá incorporar ese resultado sin ponderación, recálculo o sustitución manual. En el reporte "CALIFICACION-SOCE.pdf", generado el 10 de septiembre de 2026 a las 09h31, el Sistema Oficial de Contratación Pública refleja para LORETOGREEN S.A. una calificación automática de 0,00 puntos sobre 5,00 en el parámetro Subcontratación. En consecuencia, se incorpora obligatoriamente el resultado de 0,00/5,00 puntos.

SUBCONTRATACIÓN = 0 PUNTOS.

(VER ANEXOS)

PARTICIPACIÓN ECUATORIANA – 10 PUNTOS

El estudio del procedimiento fijó una participación ecuatoriana mínima de 70,65 %. La matriz firmada de la oferta reporta 79,27400 %, mientras que el archivo MFC/XML registra 79,27 % por precisión interna. Ambos valores superan el mínimo establecido. De conformidad con la metodología del procedimiento, la puntuación de este parámetro debe sujetarse al resultado reflejado por la herramienta informática, sin recálculo manual distinto. El reporte "CALIFICACION-SOCE.pdf", generado el 10 de septiembre de 2026 a las 09h31, refleja en el campo "Agregado Nacional / Participación Ecuatoriana" una calificación automática de 10,00 puntos sobre 10,00. Por tanto, corresponde incorporar 10,00/10,00 puntos.

PARTICIPACIÓN ECUATORIANA = 10 PUNTOS.

RESUMEN DE PUNTAJE

PARÁMETRO	PUNTAJE
Experiencia general adicional	10,00
Experiencia específica adicional	25,00
Oferta económica	50,00
Subcontratación	0,00
Participación ecuatoriana	10,00
TOTAL	**95,00**

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez concluida la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos de la oferta, así como la evaluación y calificación conforme a los parámetros establecidos en los pliegos, se determina que el

único oferente LORETOGREEN S.A. con RUC Nro. 2290325954001 cumple con todos los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, obteniendo una calificación total de 95.00 puntos sobre 100.00

En consecuencia, corresponde remitir el resultado a la máxima autoridad mediante Informe de Evaluación y Recomendación, dejando constancia de que la decisión de adjudicar es competencia de la máxima autoridad y deberá formalizarse mediante la resolución administrativa correspondiente.

ATENTAMENTE,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Párraga Intriago Belén Stefanía
Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de infraestructura
PROFESIONAL DESIGNADA PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL

INFORME DE RECOMENDACIÓN PARA ADJUDICACIÓN

1. INFORMACIÓN DEL PROCESO:

CÓDIGO DE PROCESO	LICO-GADML-2026-10
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"
PLAZO DE EJECUCIÓN:	45 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE INICIO DE OBRA POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA ETAPA PRECONTRACTUA:	Ing. Belén Párraga Intriago Coordinadora de Construcciones y Mantenimiento de Infraestructuras
PRESUPUESTO REFERENCIAL:	$52.137,96 Cincuenta y dos mil ciento treinta y siete con 96/100 centavos, sin incluir IVA.

Señor Alcalde, se ha dado cumplimiento a todas las actividades previstas de acuerdo con el cronograma elaborado para el presente proceso de contratación LICO-GADML-2026-10

2. ANTECEDENTES:

Mediante Resolución Administrativa Nro. 147-GADML-2026, de 04 de agosto de 2026, la máxima autoridad aprobó los documentos de la fase preparatoria, el pliego, sus anexos, las condiciones económicas, la metodología de evaluación y el cronograma; autorizó el inicio del procedimiento de Licitación de Obra Nro. LICO-GADML-2026-10; y designó a la Ing. Belén Stefanía Párraga Intriago como servidora responsable de atender, sustanciar y llevar a cabo las actuaciones de la fase precontractual, de conformidad con el artículo 88 del Reglamento General a la LOSNCP.

El procedimiento tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA", CPC Nro. 532900011, con presupuesto referencial de USD 52.137,96879 sin incluir IVA, quince (15) rubros, plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, anticipo del treinta y cinco por ciento (35 %) y saldo del sesenta y cinco por ciento (65 %) mediante planillas de avance.

Mediante Memorando Nro. GADMCL-CCP-2026-0749-M-GD, de 08 de septiembre de 2026, la Coordinación de Compras Públicas remitió una (1) oferta técnica y económica descargada del

Portal de Contratación Pública, en formato MFC-USHAY y con documentos cargados directamente al SOCE.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 001 APERTURA DE OFERTAS, se realizó la apertura de las ofertas de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	OFERENTE/PROCURADOR COMÚN	RUC	VALOR DE LA OFERTA	PLAZO	CONTIENE:
1	LORETOGREEN S.A.	2290325954001	$ 52.107,36	45 DIAS	28 archivos, 2 Carpetas. 10.1 MB

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 002 CONVALIDACIÓN DERRORES, se concluyó que no existieron errores que deban ser convalidables.

Con fecha 8 de septiembre de 2026, mediante ACTA 003 DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS ETAPA CUMPLE/NO CUMPLE, se concluye que el único oferente LORETOGREEN S.A. con RUC 2290325954001, cumple con todos los requisitos de integridad de la oferta y los requisitos mínimos de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, por lo tanto pasa a la siguiente metodología EVALUACIÓN POR PUNTAJE.

Con fecha 11 de septiembre de 2026, se suscribe el ACTA 004 ACTA DE CALIFICACIÓN POR PUNTAJE Y CALIFICACIÓN FINAL, concluyendo que el único oferente LORETOGREEN S.A. con RUC Nro. 2290325954001 cumple con todos los requisitos de integridad, los requisitos mínimos y los parámetros de evaluación establecidos en los pliegos del procedimiento, obteniendo una calificación total de 95.00 puntos sobre 100.00

RECOMENDACIÓN:

En calidad de Delegado de la máxima autoridad para llevar a cabo la fase Precontractual, y en cumplimiento del Reglamento de la Ley Orgánica Nacional de Contratación Pública en el art. 112 "…..La adjudicación deberá sustentarse en el informe de recomendación,…"

Por lo expuesto RECOMIENDO adjudicar al oferente LORETOGREEN S.A. con RUC 2290325954001, el proceso de Licitación de obras LICO-GADML-2026-10 para la "CONSTRUCCIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CELDAS EMERGENTES OPERATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA" por un monto de USD **$ 52.107,368 (Cincuenta y dos mil ciento siete dólares con 368/100 dólares de los Estados Unidos de América) con un plazo de 45 días** contados a partir del día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador de contrato,

Particular que pongo en su conocimiento para que por su intermedio se disponga a la Coordinación de Compras Públicas del GAD Municipal de Loreto continúe con el proceso administrativo correspondiente.

Loreto, 11 de septiembre del 2026

Atentamente,

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

Ing. Belén Párraga Intriago
COORDINADORA DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS DEL GADML
DESIGNADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA ETAPA PRECONTRACTUAL
PROCESO LICO-GADML-2026-10

Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urapari
Teléfono: (06) 2893-100/ (06) 2893-239
Correo E: gadloreto92@gmail.com. pag. web www.loreto.gob.ec

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA
RUC: 2290320014001



OFICIO N. FRANCAZU-2025-006-O
Loreto, 15 de enero 2026

PARA: LABOCYV
LABORATORIO DE OBRAS CIVILES Y VIALES

ASUNTO: Solicitando servicio de Ensayo de Compresión (hormigón)

En su despacho

Por medio del presente, quien suscribe el presente documento Sr. Juan Pablo Ortega Buenaño REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA la cual me encuentro ejecutando un contrato N° 31 cuyo código es MCO-GADML-2025-05 del proyecto con objeto "CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"; con la entidad del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL LORETO, para lo cual solito de su servicio para realizar el debido control de calidad referente a los hormigones.

Particular que informo fines pertinentes

Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO ORTEGA BUENAÑO
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. Juan Pablo Ortega Buenaño
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

Firmado electrónicamente por:
MARIO ISAAC MORALES VILLARROEL

Dirección: Huataraco ingreso a la Paz
Correo:ciafrancazu@gmail.com
Telf.: 0959860520

LABOCYV S.A.S	Política del Sistema de Gestión	LAB-DE-PO-001 Versión: 00

Descripción de cambios del documento			
Versión	**Motivo del cambio**	**Aprobado por (Cargo – Nombre)**	**Fecha aprobación**
0	Versión inicial	Gerente General/ Representante Legal – Mario Morales	9/10/2023

Laboratorio de Obras Civiles y Viales LABOCYV S.A.S es una empresa proveedora de servicio de ensayos de laboratorio para obras civiles y viales, proporciona condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo. Conoce el contexto de la organización, la naturaleza específica de sus riesgos y oportunidades en que se desempeña tanto para la calidad de servicio al cliente como la seguridad y salud en el trabajo. Desarrolla su dirección estratégica. Por lo tanto la gerencia se compromete a:

- Gestionar su dirección estratégica.

- Proporcionar un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

- Cumplir con los requisitos aplicables, legales y otros requisitos.

- Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.

- Mejorar continuamente los servicios de la empresa, el sistema de gestión de la calidad, seguridad y salud en el trabajo.

- Facilitar la consulta y la participación de los trabajadores.

- Proteger el medio ambiente.

- Contribuir al desarrollo sostenible en relación con la sociedad en la que opera y con su impacto sobre el medio ambiente.

La presente política está disponible para las partes interesadas pertinentes, es comunicada, entendida y se aplica dentro de la organización manteniéndose como información documentada.

Mario Morales
Representante Legal

Factura

001 - 002 - 000000703

RUC: 2293524427001

No. de Autorización:

2001202601229352442700120010020000007034124607612

Fecha y Hora de Autorización:

2026-01-20 10:36:48

Ambiente: PRODUCCIÓN

Emisión: EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO:

2001202601229352442700120010020000007034124607612

LABORATORIO DE OBRAS CIVILES Y VIALES LABOCYV S.A.S.
LABOCYV S.A.S.

Dir. Matriz: EL COCA, BARRIO LOS ROSALES CALLE ANTONIO LLORI Y RIO NEGRO

Dir. Sucursal: Ecuador , Pichincha , Quito

Teléfono: 0999683288

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Cliente: CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

Dirección: ORELLANA / LORETO / SAN JOSE DE DAHUANO / HUATARACU SN Y LA PAZ

RUC/CED/PASS: 2290320014001 **Teléfono:** 0959860520

Fecha de Emisión: 20/01/2026 **Email:** ciafrancazu@gmail.com

Fecha de Vencimiento: 20/01/2026

Observación: OBRA: CONSTRUCCION DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACION DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO.

Codigo	Cantidad	Descripción	Imp	P.Unitario US$	Descuento US$	Valor Total US$
016	6.000	ENSAYO DE COMPRESION DE MUESTRA CILINDRICA DE HORMIGON DE 6X12	*	7.0000	0.00	42.00
024	1.000	EMISION DE INFORME DE RESULTADOS (1 a 20 hojas)	*	5.0000	0.00	5.00

Forma de pago	Valor US
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	54.05

Subtotal:	47.00
Subtotal 15%:	47.00
I.V.A. 15%:	7.05
Valor Total US$:	54.05

****POWERED BY AVAPOS.COM****

Desarrollado por Practisis

INFORME DE MANTENIMIENTO Y DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

DATOS DEL CLIENTE		EQUIPO BAJO PRUEBA		
Cliente	**LABOCYV S.A.S.**	**Equipo**	**Balanza de precisión**	
Dirección	Antonio Llori y Río Negro - El Coca	**Marca**	CAS/HIWEIGH	
Contacto	Mario Morales Villaroel	**CÓDIGO**		
		Modelo	WPS30	
Informe Número	**LABOCYV-0225-WPS30-0104**	**Serie**	XH24030040441	
Ubicación del equipo	Laboratorio de ensayo de materiales	**Max**	30	kg
Condiciones ambientales:		**d=**	0,001	kg
Temperatura ambiente	26 +/- 2 °C **HR** 72 +/- 5 % HR	**e=**	0,001	kg
Fecha de emisión del informe	12 de febrero del 2025	**Clase**	III	

PRUEBAS METROLÓGICAS

EXCENTRICIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Carga Ensayo kg	**Posición** kg	**Lectura** kg	**Desviación Centro** kg
10,000	**10,000**	**Centro**	**10,001**	**0,000**
10,001	**10,000**	Fondo Izquierdo	10,002	0,001
10,001	**10,000**	Fondo Derecha	10,002	0,001
10,000	**10,000**	Frente Derecha	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Frente Izquierda	10,001	0,000
10,000	**10,000**	Centro	10,001	0,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Excentricidad	0,001	kg
Error Máximo Permitido	0,003	kg

LINEALIDAD

Lecturas previas a los ajustes kg	Lecturas obtenidas luego de los ajustes de calibración			
	Valor Nominal kg	**Lectura Ascendente** kg	**Lectura Descendente** kg	**Histéresis** kg
0,000	**0,000**	0,000	0,000	0,000
0,010	**0,010**	0,010	0,010	0,000
0,100	**0,100**	0,100	0,100	0,000
0,500	**0,500**	0,500	0,500	0,000
1,000	**1,000**	1,000	1,000	0,000
5,003	**5,000**	5,000	5,000	0,000
10,004	**10,000**	10,001	10,000	0,001
20,005	**20,000**	20,002	19,999	0,003
30,007	**30,000**	30,000	30,000	0,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Histéresis Máximo	0,003	kg
Error Máximo Permitido	0,002	kg
Desviación Standard	0,001	kg

REPETIBILIDAD

Unidades	**Vacío** kg	**Carga** kg	**Carga - Vacío** kg
	0,0	15,002	15,0
	0,0	15,002	15,0
	0,0	15,002	15,0
	0,0	15,002	15,0
	0,0	15,002	15,0
	0,0	15,002	15,0

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Desviación Standard	0,0	kg
Error Máximo Permitido	0,0	kg

SENSIBILIDAD

Carga de Ensayo	**Lectura**	**Desviación**
30,000	30,000	0,000

Dentro del **EMP**
SI -X- NO --

Error Máximo Permitido	0,003	

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE COMBINADA DE LOS ENSAYOS DE MEDICIÓN

μ cal=	0,0018	kg

La incertidumbre combinada ha sido estimada evaluando todos los factores que influyen sobre el resultado medido. Los factores a considerar son repetibilidad, sensibilidad, no linealidad, carga descentrada, incertidumbre de las pesas patrón y resolución de la balanza.

μ_{cal} = **Incertidumbre típica de calibración**

k = **Factor de cobertura (probabilidad de cobertura de 95,45%)**

U = **Incertidumbre expandida de la medición** $U_{\mu cal} * k$ (**k**=2)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo a los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

CORRECTAMENTE: _X_ USO CONDICIONADO:__ DENTRO DEL EMP: _X_ FUERA DEL EMP: __

Observaciones: EMP (Error Máximo Permisible)

PROCEDIMIENTO UTILIZADO

Se realiza revisión técnica y verificación previa para determinar el estado inicial de la balanza.
Se realizan ajustes de calibración siguiendo el procedimiento dado por los fabricantes o por experiencia adquirida.
Se realiza verificación para obtener los datos suficientes para llenar el Informe Técnico de Mantenimiento y Ajustes de Calibración
La verificación consiste en pruebas de carga excéntrica, linealidad, repetibilidad, sensibilidad, cálculos de la desviación estándar de linealidad y repetibilidad, estimación de la incertidumbre combinada de calibración.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PESAS PATRÓN UTILIZADAS

Juego de Pesas:	B132196801	Certificado No.: SECM-M-2024-255	Clase:	E2
Juego de Pesas:	D21, D22	Certificado No.: SECM-M-2022-256	Clase:	F2
Juego de Pesas:	B149512904	Certificado No.: SECM-M-2022-254	Clase:	F1

Para las pruebas metrológicas de verificación y ajustes de calibración se utilizó pesas con trazabilidad al SI a través del patrón nacional de masa del Laboratorio Nacional de Metrología.


TIPO DE TRABAJO REALIZADO

AJUSTES _X_ MANTENIMIENTO __ REPARACIÓN ____ INSTALACIÓN _X__ VERIFICACIÓN _X_

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se realiza revisión técnica, ajustes de calibración y verificación.
La balanza se encuentra funcionando correctamente y dento de los errores máximos permisibles(emp).
Los resultados están únicamente relacionados con el equipo descrito en el presente informe técnico.
El presente informe técnico debe ser reproducido por entero para evitar posible mala interpretación de los resultados
Se adjunta el certificado de calibración de las masas utilizadas para las pruebas de verificación.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

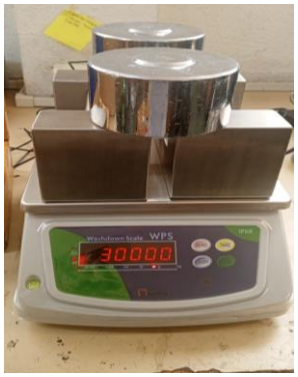

Fecha de revisión 01-febrero-2025 **Próxima revisión** febrero - 2026

Responsable Ing. Andrés Méndez B. **Firma** Firmado electrónicamente por: OLGER ANDRES MENDEZ BEDON

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

CERTIFICADO TÉCNICO DE AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Informe No LABOCYV-0225-TBTCTM.2000-0101
Fecha de calibración 01 de febrero del 2025

Cliente	**LABOCYV S.A.S.**
Ubicación	Antonio Llori y Río Negro - El Coca
Fecha de emisión	12 de febrero del 2025
Condiciones ambientales	26 +/- 2 **°C;** 72 +/- 5 **% HR**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03
Serie	S/N
Resolución	0,01 kN / 0,1 kN

PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL

Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	TBTCTM - 2000(N)
Serie	2105
Capacidad	2 000 kN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO DE CALIBRACIÓN

UNIDAD DIGITAL DE LECTURA

Marca	MATEST
Modelo	C138PN295
Serie	C138PN295/AI/0001
Resolución	0,00 1 kN / 0,01 kN

TRANSDUCTOR DE FUERZA 3 000 kN

Marca	MATEST
Modelo	C140-08
Serie	C140-08/AI/0006

RANGO de 20 kN a 200 kN

Certificado INEN	LNM-F-2023-28
Fecha de calibración	2023/04/10

RANGO de 300 kN a 3 000kN

Certificado INEN	LNM-F-2023-27
Fecha de calibración	2023/04/10

REFERENCIAS Y NORMAS UTILIZADAS

Documentos
Norma ASTM E74-04: Standard Practice of Calibration of Force-Measuring Instruments for Verifying the Force Indication of Testing Machines.

Criterio de aceptación
Error máximo aceptable **+/-**1 % de la carga aplicada **(**ASTM E4-03)

Vigencia
Se recomienda realizar una nueva verificación y/o ajustes de calibración en 12 meses o menos y no más de 18 meses, cuando el equipo es movido a otro sitio y/o se tenga duda de su precisión **(**ASTM E4-03)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

De acuerdo con los resultados obtenidos y tolerancias estimadas el equipo se encuentra trabajando:

Correctamente _X_ En tolerancias _X_ Uso condicionado __

Observaciones
Se realiza revisión técnica, ajustes de calibración y verificación.
Se utiliza un transductor digital certificado en 200 kN y 3000 kN con trazabilidad al INEN.

Procedimiento utilizado: MVC-PRENSA-010-REV.12

Realizado Ing. Andrés Méndez B.
ASISTENCIA TÉCNICA

Firma
Firmado electrónicamente por:
OLGER ANDRES MENDEZ BEDON

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

HOJA DE DATOS DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO BAJO PRUEBA			
UNIDAD DIGITAL DE LECTURA		**PRENSA DE COMPRESIÓN UNIAXIAL**	
Marca	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT	**Marca**	NANJING SCIENTECH EQUIPMENT
Modelo	RFP-03	**Modelo**	TBTCTM - 2000(N)
Serie	S/N	**Serie**	2105
Resolución	0,01 kN / 0,1 kN	**Capacidad**	2 000 kN

LECTURAS OBTENIDAS ANTES DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

Rango compresión 50 kN a 2 000 kN

LECTURAS FUERZA	PRENSA APLICADA	LECTURAS PATRÓN TEST 1	*ERROR ABSOLUTO*	ERROR %	EMP %
kN	*kgf*	*kN*	*kN*		
50	5099	49,10	0,90	**1,80**	**1,0**
100	10197	99,68	0,32	**0,32**	**1,0**
200	20394	200,69	0,69	**-0,34**	**1,0**
400	40788	400,71	0,71	**-0,18**	**1,0**
600	61182	599,77	0,23	**0,04**	**1,0**
800	81576	799,46	0,54	**0,07**	**1,0**
1000	101970	999,43	0,57	**0,06**	**1,0**
1200	122364	1198,65	1,35	**0,11**	**1,0**
1400	142758	1398,45	1,55	**0,11**	**1,0**
1600	163152	1598,51	1,49	**0,09**	**1,0**
1800	183546	1798,51	1,49	**0,08**	**1,0**
2000	203940	1999,46	0,54	**0,03**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible


Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

LECTURAS OBTENIDAS DESPUÉS DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN

LECTURAS PRENSA		CELDA DIGITAL PATRÓN 3 000 kN				*ERROR*	*INCERTIDUMBRE*		ERROR	EMP
FUERZA	APLICADA	TEST 1	TEST 2	TEST 3	*PROMEDIO*	*PROMEDIO*	*U (k=2)*		%	%
kN	*kgf*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*	*kN*		*kN*		
50	5099	49,83	49,91	49,87	**49,87**	0,13	+/-	0,09	**0,26**	**1,0**
100	10197	99,98	100,11	100,23	**100,11**	-0,11	+/-	0,26	**-0,11**	**1,0**
200	20394	200,22	200,60	200,42	**200,41**	-0,41	+/-	0,40	**-0,21**	**1,0**
400	40788	400,49	401,02	400,63	**400,71**	-0,71	+/-	0,60	**-0,18**	**1,0**
600	61182	600,91	601,45	601,12	**601,16**	-1,16	+/-	0,66	**-0,19**	**1,0**
800	81576	800,29	802,14	801,34	**801,26**	-1,26	+/-	1,92	**-0,16**	**1,0**
1000	101970	1000,77	1002,48	1001,23	**1001,49**	-1,49	+/-	1,87	**-0,15**	**1,0**
1200	122364	1201,01	1202,68	1201,43	**1201,71**	-1,71	+/-	1,88	**-0,14**	**1,0**
1400	142758	1401,52	1401,53	1401,40	**1401,48**	-1,48	+/-	0,85	**-0,11**	**1,0**
1600	163152	1601,63	1601,11	1601,41	**1601,38**	-1,38	+/-	1,09	**-0,09**	**1,0**
1800	183546	1801,92	1800,90	1801,23	**1801,35**	-1,35	+/-	1,50	**-0,08**	**1,0**
2000	203940	2003,12	2001,31	2002,21	**2002,21**	-2,21	+/-	2,17	**-0,11**	**1,0**

EMP=Error Máximo Permisible

Curva: (Error +/- Incertidumbre) en % vs (Fuerza Aplicada Celda Patrón) en kN

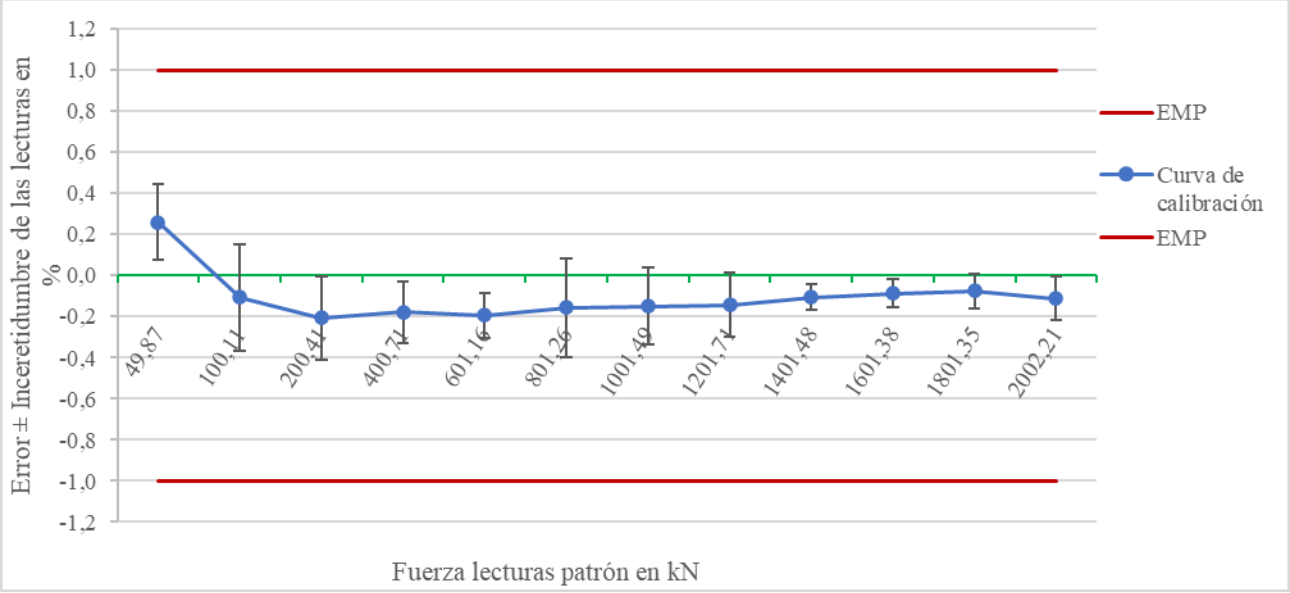

EMP=Error Máximo Permisible


Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Compresión





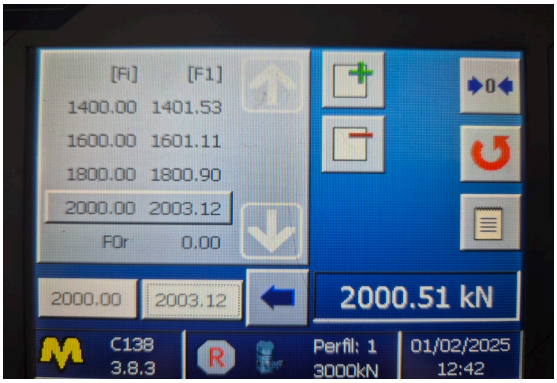

Av. Eloy Alfaro N44-349 y Río Coca
Telf.: (593-2) 3340991
0999442186
E-mail: servicio-tecnico@metrexlab.net
Quito - Ecuador

LABOCYV S.A.S	**Control de resistencia a la compresión simple**	LAB-EN-RG-008 Versión: 02	AMER15862

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".

UBICACIÓN: COMUNIDAD 24 DE MAYO.
CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA.
FISCALIZADOR: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS - GADMCL
FECHA DE INFORME: 5/1/2026

CALIBRACIÓN DE PRENSA: TBTCTM-2000-0101
REFRENTADO: NO ADHERIDO
INFORME LABOCYV #: 001 - CFCL
1 KN = 101,97 Kilogramos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE - F´c = 180 Y 210 Kg./cm2

NORMA: INEN 1573 - ASTM C 39

N° Muestra	ELEMENTO FUNDIDO	Asentamiento cms.	ϕ muestra cms.	Altura muestra cms.	Peso muestra gr.	Area muestra cm2	Fecha de Fundicion	Edad dias	Fecha de Rotura	Carga KN	Carga Kgr.	Resistencia obtenida Kg:/cm2	Resistencia Maxima a 28 dias Kg./cm2	% de resistencia obtenida	% de resistencia requerida	Tipo de Fract.
1	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO		14,9	30	11659	174,4	20/12/2025	7	27/12/2025	208,54	21265	**122,0**	180	**67,8**	60	5
2	HORMIGÓN SIMPLE EN REPLANTILLO		14,8	30	11439	172,0	20/12/2025	14	3/1/2026	259,76	26488	**154,0**	180	**85,5**	80	3
3	F´c= 180 Kg./cm2		14,7	30		169,7	20/12/2025	28	17/1/2026		0	**0,0**	180	**0,0**	100	
1	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS		15,1	30	12601	179,1	23/12/2025	7	30/12/2025	239,56	24428	**136,4**	210	**65,0**	60	5
2	HORMIGÓN SIMPLE EN PLINTOS		15,3	30		183,9	23/12/2025	14	6/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	80	
3	F´c= 210 Kg.Cm2		15,2	30		181,5	23/12/2025	28	20/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	100	
1	HORMIGÓN CICLÓPEO		15,1	30	12758	179,1	23/12/2025	7	30/12/2025	243,76	24856	**138,8**	180	**77,1**	60	5
2	HORMIGÓN CICLÓPEO		15,4	30		186,3	23/12/2025	14	6/1/2026		0	**0,0**	180	**0,0**	80	
3	F´c= 180 Kg./cm2		15,2	30		181,5	23/12/2025	28	20/1/2026		0	**0,0**	180	**0,0**	100	

OBSERVACIONES: **MUESTRAS TOMADAS Y TRAIDAS AL LABORATORIO POR EL CONTRATISTA.**

AGREGADOS UTILIZADOS: TRITURADO PREMEZCLADO PASANTE DE 1 PULGADA Y ARENA + CEMENTO CAMPEÓN

LAS MUESTRAS ENSAYADAS, SI CUMPLEN CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA A LOS 7 Y 14 DIAS DE CURADO


Presente en los ensayos de compresión: Ing. Andres Chiquito - CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA. e Ing. Carlos Velez Burgos - FISCALIZADOR GADMCL

Nota: El valor en cero corresponde a muestras que aun no cumplen los días de curado para el ensayo de compresión.

LABOCYV S.A.S
RUC: 2293524427001
ORELLANA - ECUADOR

FRANK LEONEL ALCIVAR HERRERA
INGENIERO CIVIL
Nro. Reg.: 1016-15-1435692





Tlgo. Mario Morales Villarroel
LABORATORISTA
ACI - Nº 1888783

Tec. Mario Morales Villarro..
LABORATORISTA
ACI # 01888783

Ing. Civil Frank Alcívar Herrera
COORD. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SENESCYT: 1016-15-1435692

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA.

LABOCYV S.A.S	**Control de resistencia a la compresión simple**	LAB-EN-RG-008 Versión: 02	AMER15862

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SHINCHI LLANKAK WARMIKUNA, COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA".

UBICACIÓN: COMUNIDAD 24 DE MAYO.
CONTRATANTE: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LORETO
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA.
FISCALIZADOR: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS - GADMCL
FECHA DE INFORME: 5/1/2026

CALIBRACIÓN DE PRENSA: TBTCTM-2000-0101
REFRENTADO: NO ADHERIDO
INFORME LABOCYV #: 002 - CFCL
1 KN = 101,97 Kilogramos

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE - F´c = 210 Kg./cm2

NORMA: INEN 1573 - ASTM C 39

Nº Muestra	ELEMENTO FUNDIDO	Asentamiento cms.	ϕ muestra cms.	Altura muestra cms.	Peso muestra gr.	Area muestra cm2	Fecha de Fundicion	Edad dias	Fecha de Rotura	Carga KN	Carga Kgr.	Resistencia obtenida Kg:/cm2	Resistencia Maxima a 28 dias Kg./cm2	% de resistencia obtenida	% de resistencia requerida	Tipo de Fract.
1	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS		15,2	30	12154	181,5	30/12/2025	6	5/1/2026	239,76	24448	**134,7**	210	**64,2**	54	5
2	HORMIGÓN SIMPLE EN CADENAS		15,0	30		176,7	30/12/2025	14	13/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	80	
3	F´c= 210 Kg./cm2		15,3	30		183,9	30/12/2025	28	27/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	100	
1	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS		15,1	30	12538	179,1	30/12/2025	6	5/1/2026	241,76	24652	**137,7**	210	**65,6**	54	3
2	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS		15,3	30		183,9	30/12/2025	14	13/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	80	
3	F´c= 210 Kg.Cm2		15,2	30		181,5	30/12/2025	28	27/1/2026		0	**0,0**	210	**0,0**	100	

OBSERVACIONES: **MUESTRAS TOMADAS Y TRAIDAS AL LABORATORIO POR EL CONTRATISTA.**

AGREGADOS UTILIZADOS: TRITURADO PREMEZCLADO PASANTE DE 1 PULGADA Y ARENA + CEMENTO CAMPEÓN


LAS MUESTRAS ENSAYADAS, SI CUMPLEN CON LA RESISTENCIA ESTABLECIDA A LOS 6 DIAS DE CURADO


Presente en los ensayos de compresión: Ing. Andres Chiquito - CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA. LTDA. e Ing. Carlos Velez Burgos - FISCALIZADOR GADMCL

Nota: El valor en cero corresponde a muestras que aun no cumplen los días de curado para el ensayo de compresión.

LABOCYV S.A.S
RUC: 2293524427001
ORELLANA - ECUADOR

FRANK LEONEL ALCIVAR HERRERA
INGENIERO CIVIL
Nro Reg. 1016-15-1435692

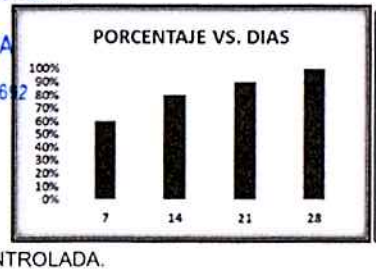



Tlgo. Mario Morales Villarroel
LABORATORISTA
ACI - Nº 1888783

Tec. Mario Morales Villarroel
LABORATORISTA
ACI # 01888783

Ing. Civil Frank Alcívar Herrera
COORD. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
SENESCYT: 1016-15-1435692

Una vez impreso el documento será considerado como COPIA NO CONTROLADA.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CONTRATO N 31 :	**MCO-GADML-2025-05**
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA
FISCALIZADOR:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
ADMINISTRADOR:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO
UBICACIÓN	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO
MONTO CONTRATO USD.	**$ 88,234.93380**
INVERSION ACUMULADA REPROGRAMADA	
% ANTICIPO DOLARES	50%
MONTO ANTICIPO DOLARES	**$ 44,117.47000**

PLANILLA N°	**AVANCE DE OBRA**	**1**
PERIODO:	17-12-2025 al 31-12-2025	
PLAZO EJECUTADO		15 Días
FECHA DE CONTRATO		21-jul-25
FECHA INICIO OBRA		17-dic-25
PLAZO		90 dias
AMPLIACION		
SUSPENSIÓN		
FECHA DE PRESENTACION		05-ene-26

N°	RUBROS	UND	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDADES/VOLUMEN				INVERSION		
						TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
	PRELIMINARES											
1	Replanteo y nivelacion	m2	247.45	$ 1.45	358.80250		247.45		100.00%		$ 358.80	$ 358.80
2	Excavacion manual en suelo sin clasificar. 0<h<2m	m3	47.95	$ 11.35	544.23250		50.84		106.03%		$ 577.03	$ 577.03
	CIMENTACION											
3	Relleno piedra bola (manual)	m3	6.48	$ 27.46	177.94080		12.96		200.00%		$ 355.88	$ 355.88
4	relleno compactado con material de mejoramiento de suelo	m3	18.48	$ 34.59	639.22320		6.48		35.06%		$ 224.14	$ 224.14
5	Replantillo de h.simple	m3	1.80	$ 184.91	332.83800		1.30		72.22%		$ 240.38	$ 240.38
6	Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado	m3	7.50	$ 188.24	1,411.80000		6.48		86.40%		$ 1,219.80	$ 1,219.80
7	H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado	m3	5.20	$ 241.66	1,256.63200		3.96		76.15%		$ 956.97	$ 956.97
8	Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p) inc. Encofrados	m3	13.50	$ 183.39	2,475.76500		9.53		70.59%		$ 1,747.71	$ 1,747.71
9	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado	m3	5.33	$ 246.24	1,312.45920		4.56		85.55%		$ 1,122.85	$ 1,122.85
10	Hormigon s. f'c=210 kg/cm2 en vigas inc. Encofrado	m3	3.40	$ 225.60	767.04000							
11	H. simple en riostras y dinteles f'c=210 kg/cm2 inc. Enconfrado	m3	0.70	$ 240.43	168.30100							
	ACERO DE REFUERZO											
12	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	3285.50	$ 2.47	8,115.18500		2,196.99		66.87%		$ 5,426.57	$ 5,426.57
	MAMPOSTERIAS Y ENLUCIDOS											
13	Mamposteria bloque liviano e=15 cm	m2	210.10	$ 18.37	3,859.53700							
14	Mamposteria bloque liviano e=10 cm	m2	12.50	$ 15.37	192.12500							
15	Enlucido vertical (paleteado)mortero 1:3	m2	445.05	$ 6.40	2,848.32000							
	ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS											
16	Provision de correa para montaje de cubierta y fachada frontal	kg	2512.18	$ 4.92	12,359.92560							
17	Cubierta de galvalumen e= 0.40 mm	m2	350.48	$ 14.52	5,088.96960							

N°	RUBROS	UND	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDADES/VOLUMEN				INVERSION		
						TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
18	CUMBRERO DE GALVALUMEN e=40mm, prepintado	M	22.50	$ 9.00	202.50000							
19	Canal recolector de aguas lluvias (tol 1/32)	ml	46.40	$ 14.16	657.02400							
20	Bajantes de agua lluvia (pvc 4")	ml	9.00	$ 50.14	451.26000							
	PISOS Y CONTRAPISOS											
21	Relleno con matrial petreo (compactado)	m3	125.05	$ 34.59	4,325.47950		106.42		85.10%		$ 3,681.07	$ 3,681.07
22	Relleno compactado con material de sitio	m3	37.15	$ 13.45	499.66750		17.46		47.00%		$ 234.84	$ 234.84
23	Contrapiso h.s. f'c=180 kg/cm2	m2	245.60	$ 18.79	4,614.82400							
24	Vereda perimetral, f'c=180 kg/cm2	m2	74.88	$ 32.31	2,419.37280							
	INSTALACIONES SANITARIAS											
25	Sum. e inst. de tuberia desg. 110mm(inc. accesorios)	m	17.60	$ 7.20	126.72000							
26	Sum. e inst tuberia de desg. 75 mm	m	11.44	$ 5.99	68.52560							
27	Sum. e inst tuberia de desg. 50 mm	m	4.40	$ 3.21	14.12400							
28	Inodoro blanco (con accesorios)	u	3.00	$ 113.35	340.05000							
29	Lavamanos (inc accesorios)	u	3.00	$ 102.57	307.71000							
30	Urinario economico inc. Accesorios	u	2.00	$ 117.82	235.64000							
31	Rejilla de piso 3" aluminio	u	3.00	$ 20.39	61.17000							
32	Cajas de revision (60x60 cm)	u	4.00	$ 98.97	395.88000							
33	Fregadero de cocina (2 pozos sin faldon)	u	1.00	$ 179.23	179.23000							
34	Manguera negra 3/4" reforzada (tendido aapp)	ml	40.00	$ 0.74	29.60000							
35	Suministro e instalacion de tuberia pr pvcø=1/2"	m	20.62	$ 4.24	87.42880							
36	Punto bajo de agua tuberia pr pvcø=1/2"	u	10.00	$ 9.38	93.80000							
37	Suminstro e instalacion de codos 90x1/2" pvc pr	u	6.00	$ 2.29	13.74000							
38	Suminstro e instalcion de tee 1/2" pvc pr	u	8.00	$ 2.53	20.24000							
39	Suminstro e instalcion de universal de 1/2" pvc pr	u	2.00	$ 3.44	6.88000							
40	Llave de paso de 1/2 pulg	u	5.00	$ 27.59	137.95000							
	INSTALACIONES ELECTRICAS											
41	Acometida principal cable electrico 3x10	ml	50.00	$ 8.97	448.50000							
42	Tablero de control de 2 breakers	u	1.00	$ 96.16	96.16000							
43	Sum. e inst. de interruptores simples (inc. picado y corchado))	u	4.00	$ 9.20	36.80000							
44	Sum. e inst. de interruptores dobles (inc. picado y corchado))	u	3.00	$ 10.40	31.20000							
45	Sum. e inst. de conductor tipo thhn # 12awg	m	220.44	$ 1.18	260.11920							
46	Instalación eléctrica (tomacorriente doble)	pto	11.00	$ 13.69	150.59000							
	HERRERIA Y CERRAJERIA											
47	Puerta panelada pa (0.90*2.10)	u	6.00	$ 246.13	1,476.78000							
48	Puerta de tol 2 hojas (2.10x2.00)	u	2.00	$ 236.98	473.96000							
49	Ventana de aluminio anodizado pl-4p-vidrio 4mm	m2	73.51	$ 86.53	6,360.82030							
50	Ventanas (protector) con varilla de hierro cuadrada	m2	73.51	$ 60.82	4,470.87820							
	REVESTIMIENTOS Y ACABADOS											
51	Pasteado de paredes	m2	451.52	$ 5.60	2,528.51200							
52	Pintura de caucho interior/exterior (permalatex)	m2	451.52	$ 7.11	3,210.30720							
53	Ceramica de pared 25x50 cm	m2	45.48	$ 30.44	1,384.41120							

N°	RUBROS	UND	CANTIDAD CONTRATO	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	CANTIDADES/VOLUMEN				INVERSION		
						TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA	% AVANCE	TOTAL ANTERIOR	TOTAL ESTA PLANILLA	TOTAL A LA FECHA
54	Ceramica de piso 50x50 cm, antideslizante	m2	245.60	$ 30.69	7,537.46400							
55	Barredera de ceramica e=10cm	m	79.94	$ 4.47	357.33180							
56	Meson de hormigon armado para lavamanos	m	6.20	$ 57.26	355.01200							
	INSTALACION DE BIODIGESTOR											
57	Adquisicion e instalacion de biodigestor de 1300 lt.	u	1.00	$ 801.74	801.74000							
58	Excavacion a maquina en tierra h=0-2 m	m3	4.75	$ 1.47	6.98250							
59	Relleno compactado manual (pizon)	m3	2.50	$ 4.53	11.32500							
60	Colchon arena fina	m3	0.23	$ 43.34	9.96820							
61	Construccion de camara de infiltracion	gbl	1.00	$ 427.58	427.58000							
	DESALOJOS											
62	Desalojo de material sin clasificar restante de excavaciones	m3	18.54	$ 9.74	180.57960		18.60		100.32%		$ 181.16	$ 181.16
63	Letrero informativo de obra	u	1.00	$ 420.00	420.00000							
				TOTAL CONTRATADO ==> $	**88,234.93**			**TOTAL PLANILLADO ==> $**			**$ 16,327.20**	**$ 16,327.20**

% AVANCE OBRA PARCIAL **18.50%**

% AVANCE OBRA ACUMULADO **18.50%**

CONTROL DEL ANTICIPO	
MONTO RECIBIDO (SPI)	$ 44,117.47
MONTO DEVENGADO PLANILLA AVANCE DE OBRA N.01	$ 8,163.60
MONTO POR DEVENGAR	$ 35,953.87

DESCUENTOS			
AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ 8,163.60	$ 8,163.60
DESCUENTOS POR LEY		AREA FINANCIERA	
LIQUIDO A RECIBIR (SIN IVA)		**$ 8,163.60**	

Son: Ocho Mil ciento sesenta y tres con 60/100 dolares Americanos (Sin IVA)

Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO ORTEGA BUENAÑO
Validar únicamente con FirmaEC

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

CONTRATISTA

Firmado electrónicamente por:
CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
Validar únicamente con FirmaEC

ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

FISCALIZADOR DE OBRA

Firmado electrónicamente por:
BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUCIPAL DEL CANTÓN LORETO

PROYECTO: "CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA"

PLANILLA AVANCE DE OBRA N. 01

ANEXOS CALCULO VOLUMENES DE OBRA

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO No: MCO-GADML-2025-05

ADMINISTRADORA DE CONTRADO: ING. BELÉN STEFANÍA PÁRRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VÉLEZ BURGOS

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

MONTO DEL CONTRATO: **USD $** 88,234.93380

FECHA DE INICIO CONTRATO miércoles, 17 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCION: 90 días
FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL: lunes, 16 de marzo de 2026

PERIODO EJECUCION: 17 de Diciembre de 2025 - 31 de diciembre de 2025

Firmado electrónicamente por:
JUAN PABLO ORTEGA BUENAÑO
Validar únicamente con FirmaEC

Firmado electrónicamente por:
CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
Validar únicamente con FirmaEC

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA.
CONTRATISTA

ING. CARLOS VELEZ BURGOS
FISCALIZADOR - GADM LORETO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**


		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Replanteo y nivelacion

UNIDAD: m2

PRECIO UNITARIO: $ 1.45

GRAFICO:

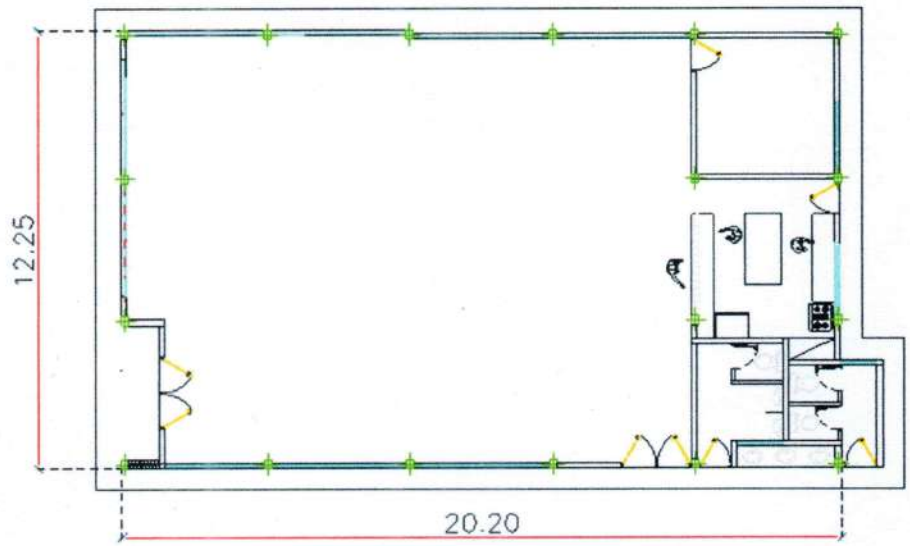

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M2)	(M2)
IMPLANTACION OBRA	1.00	20.20	12.25		247.45	247.45
				SUBTOTAL		247.45

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	247.45	m2
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m2
EJECUTADO ESTE PERÍODO	247.45	m2
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	247.45	m2
A COBRAR ESTE PERIODO	247.45	m2

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 358.80**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias

FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25

RUBRO: Excavacion manual en suelo sin clasificar. 0<h<2m

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 11.35

GRAFICO:

VER DETALLE ADJUNTO

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
EXCAVACION PLINTOS EJE 6-5-4-3	10	1.20	1.20	1.83	2.64	26.40
EXCAVACION PLINTOS EJE 2-1	8	1.20	1.20	1.92	2.76	22.08
EXCAVACION CICLOPEO EJE: D-A-6	11	2.80	0.40	0.05	0.06	0.66
EXCAVACION CICLOPEO EJE: A-B-C-D Y 1-2	10	2.80	0.40	0.15	0.17	1.70
				SUBTOTAL		**50.84**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	47.95	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	50.84	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	50.84	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	50.84	m3
VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$	**$**	**577.03**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**


		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO	**FECHA DE REINGRESO:**	
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		


RUBRO: Excavacion manual en suelo sin clasificar. 0<h<2m


UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 11.35

GRAFICO:

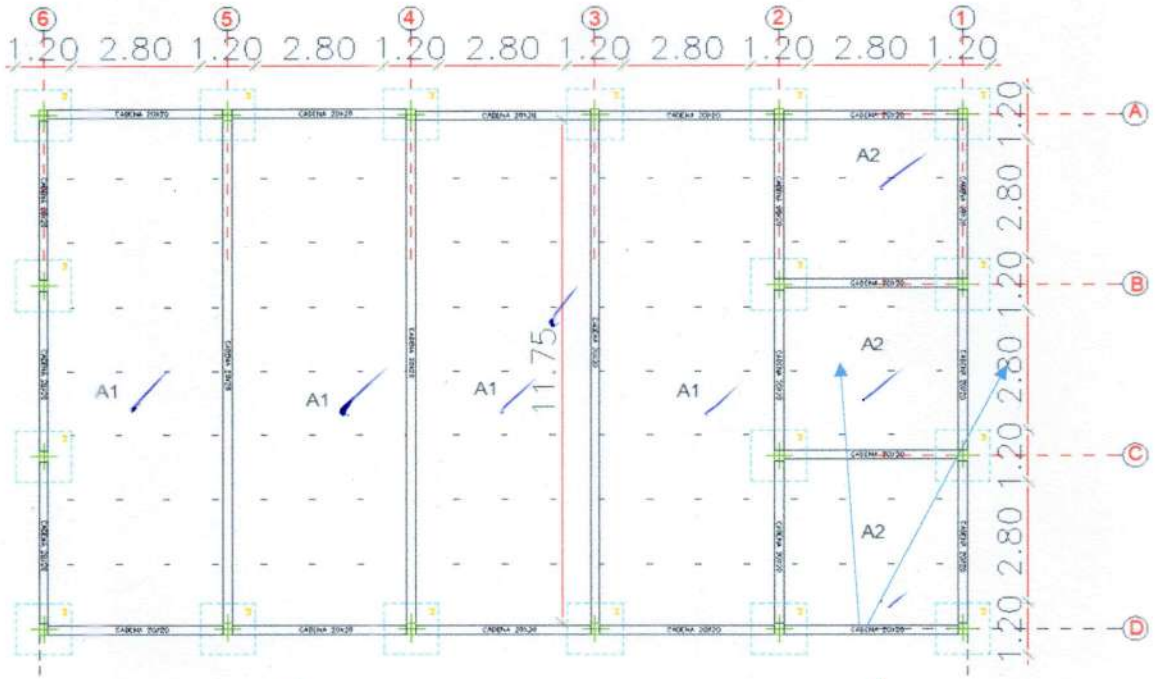

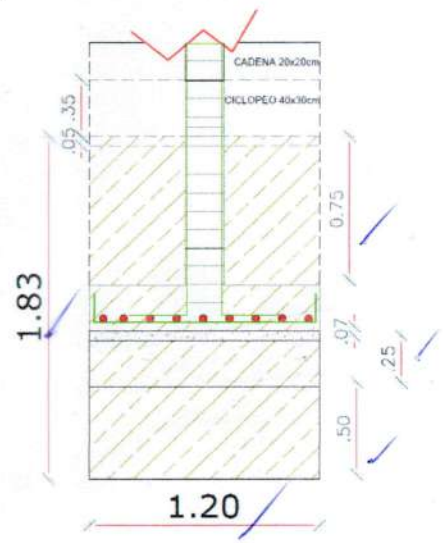

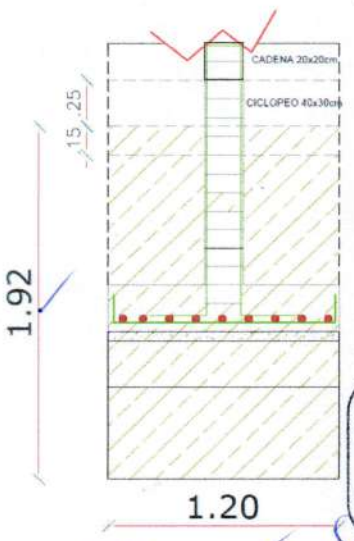

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25


RUBRO: Relleno piedra bola (manual)

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 27.46

GRAFICO:

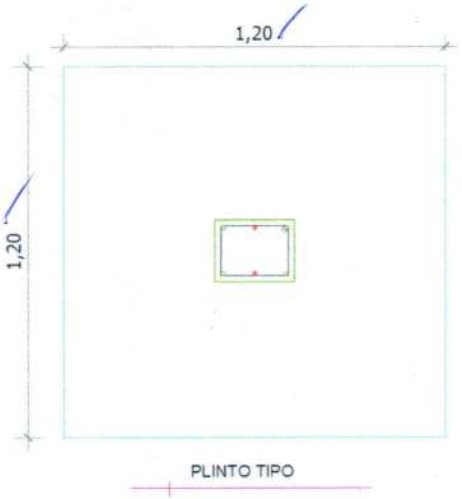

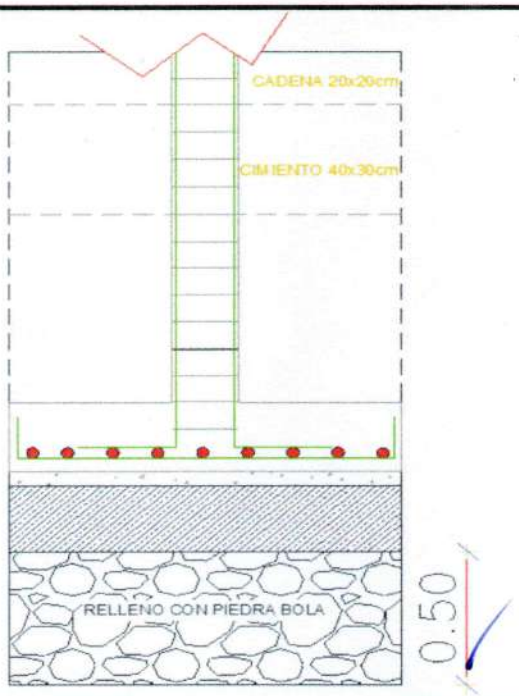

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
PLINTO (RELLENO PIEDRA BOLA)	18	1.20	1.20	0.50	0.72	12.96
				SUBTOTAL		12.96

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	6.48	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	12.96	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	12.96	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	12.96	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 355.88**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - NAPO - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25


RUBRO: relleno compactado con material de mejoramiento de suelo

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 34.59

GRAFICO:

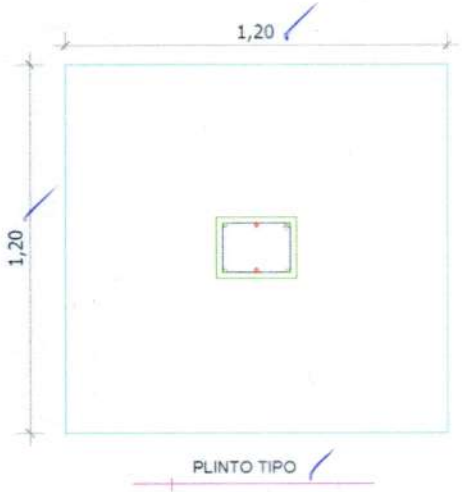

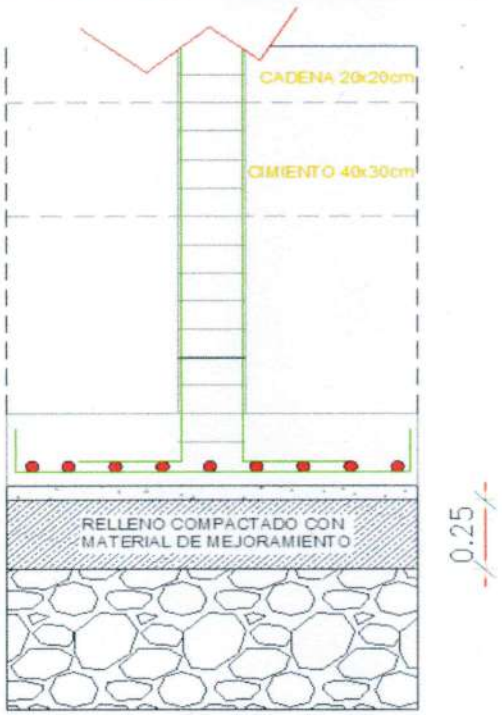

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
PLINTO (RELLENO MATERIAL MEJORAMIENTO)	18	1.20	1.20	0.25	0.36	6.48
				SUBTOTAL		**6.48**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	18.48	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	6.48	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	6.48	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	6.48	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 224.14**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1


UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Replantillo de h.simple

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 184.91

GRAFICO:

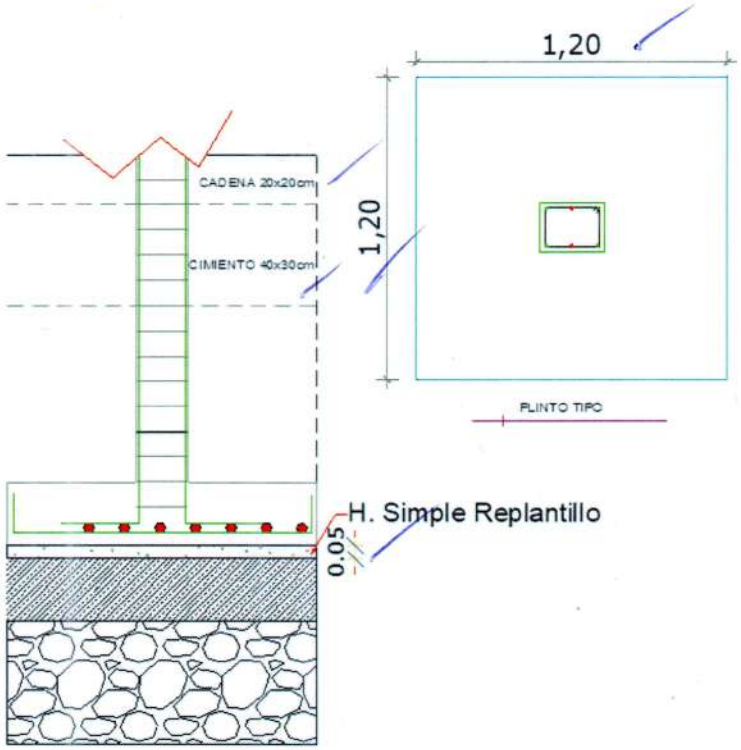

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
REPLANTILLO (PLINTOS)	18	1.20	1.20	0.05	0.07	1.30
				SUBTOTAL		1.30

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	1.80	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	1.30	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	1.30	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	1.30	m3
VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$	$	240.38

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA
CONTRATISTA

ING. ANDRES CHIQUITO
RESIDENTE

ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN ORELLANA - ECUADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25


RUBRO: Hormigón simple en plintos f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 188.24

GRAFICO:

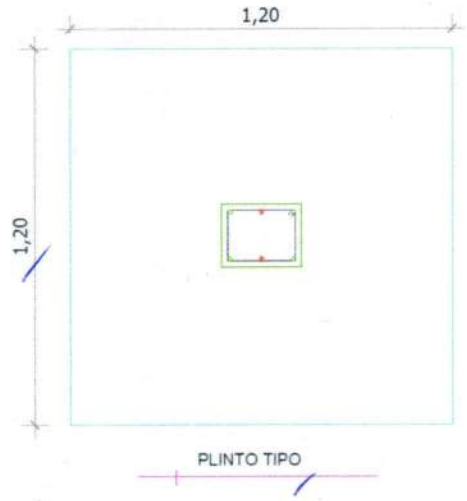

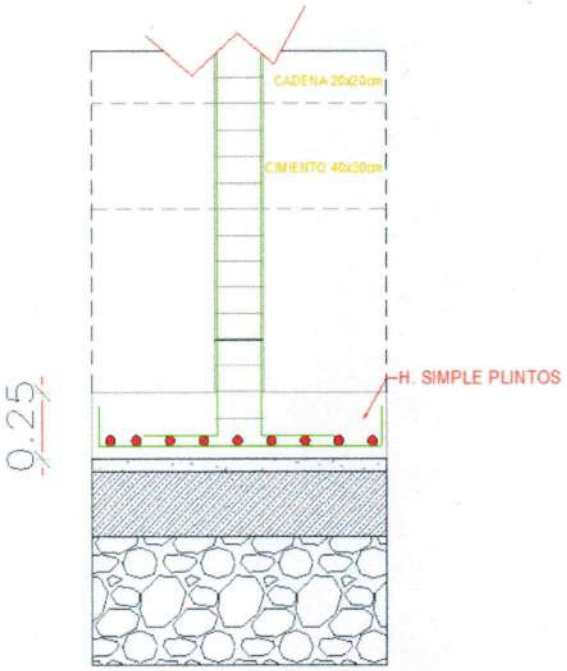

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
PLINTOS	18	1.20	1.20	0.25	0.36	6.48
				SUBTOTAL		6.48

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	7.50	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	6.48	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	6.48	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	6.48	m3
VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$	$	**1,219.80**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA AVANCE DE OBRA 1


UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: H. simple en columnas f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado


UNIDAD: m3


PRECIO UNITARIO: $ 241.66

GRAFICO:



COLUMNA TIPO
U:18

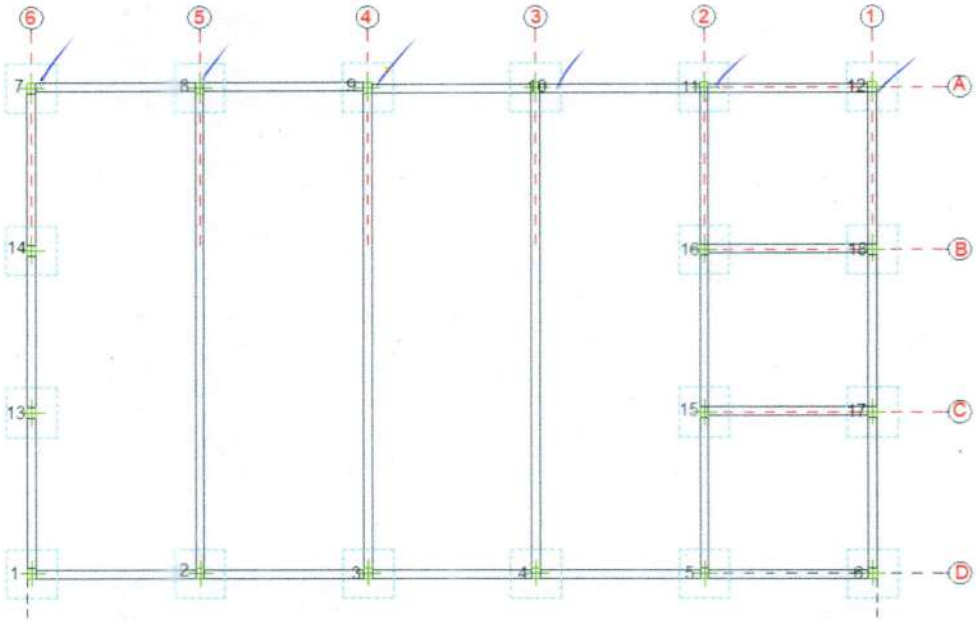

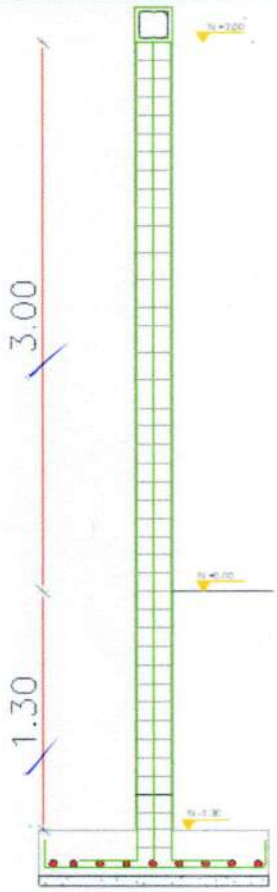

DETALLE COLUMNA

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
COLUMNAS EJE A B C D- 1 2 3 4 5 6	18	0.20	0.25	4.3	0.22	3.96
				SUBTOTAL		3.96

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	5.20	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	3.96	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	3.96	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	3.96	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 956.97**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAG(

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25

RUBRO: Hormigón ciclópeo(50% h.s.f'c=180 kg/cm2-50%p) inc. Encofrados

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 183.39

GRAFICO:

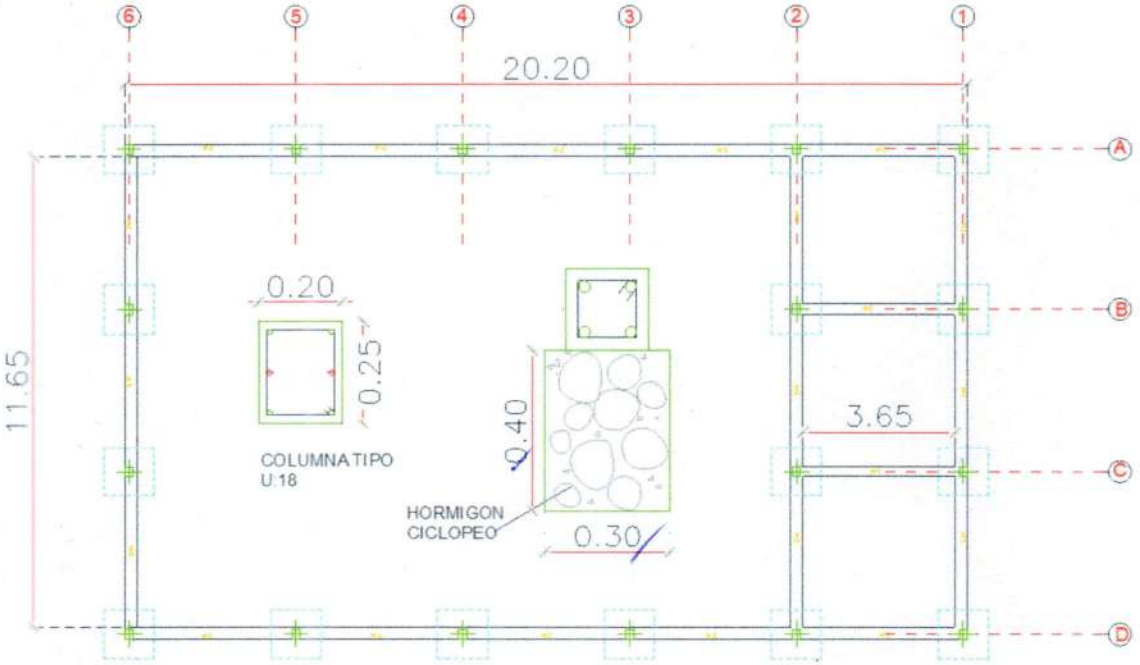

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS (U)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD PARCIAL (M3)	CANTIDAD TOTAL (M3)
H. CICLOPEO EJE A-D	2	20.20	0.30	0.4	2.42	4.84
H. CICLOPEO EJE B-C	2	3.65	0.30	0.4	0.44	0.88
H. CICLOPE EJE 6-2-1	3	11.65	0.30	0.4	1.40	4.20
DESCUENTO COLUMNA	18	0.20	0.25	0.40	0.02	0.36
				SUBTOTAL		**9.56**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	13.50	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	9.56	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	9.56	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	9.56	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 1,753.21**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25

RUBRO: H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2 inc. Encofrado

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 246.24

GRAFICO:

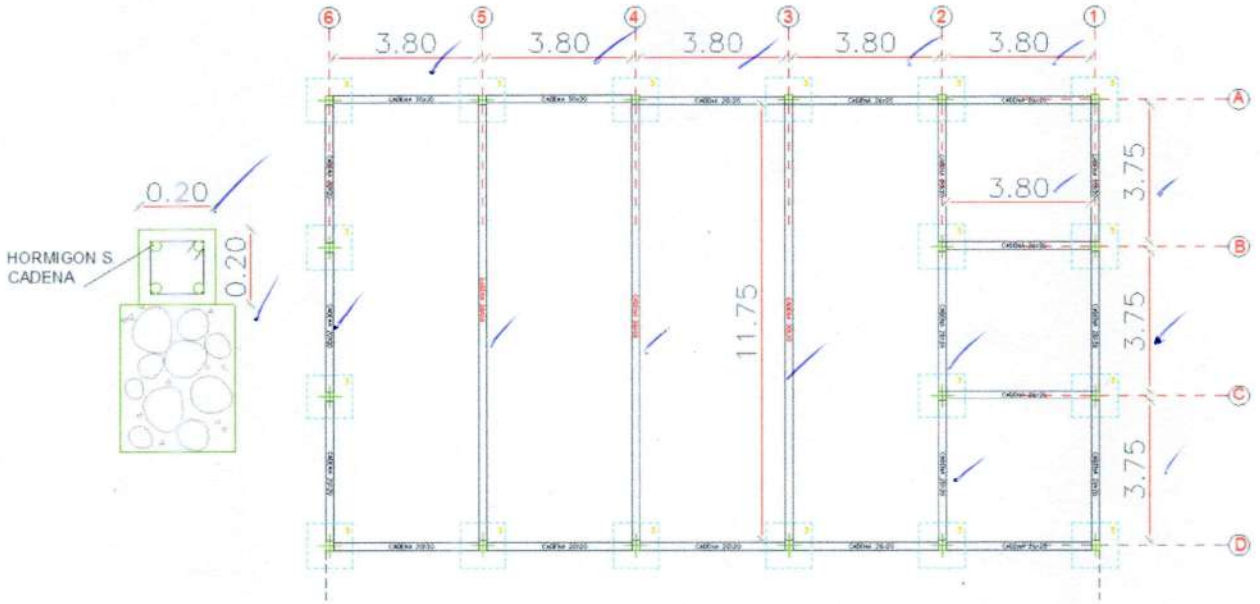

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS (U)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD PARCIAL (M3)	CANTIDAD TOTAL (M3)
CADENA EJE A-D	10	3.80	0.20	0.20	0.15	1.50
CADENA EJE B-C	2	3.80	0.20	0.20	0.15	0.30
CADENA EJE 1-2-6	9	3.75	0.20	0.20	0.15	1.35
CADENA EJE 3-4-5	3	11.75	0.20	0.2	0.47	1.41
				SUBTOTAL		4.56

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	5.33	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	4.56	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	4.56	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	4.56	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ $ 1,122.85

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAG(		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Hierro estructural fy=4200 kg/cm2

UNIDAD: kg

PRECIO UNITARIO: $ 2.47

GRAFICO:

VER ANEXO ADJUNTO

DESCRIPCION					PESO PARCIAL (kg)	PESO TOTAL (kg)
ACERO DE REFUERZO VER ANEXO ADJUNTO					2196.99	2196.99
				SUBTOTAL		**2,196.99**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	3285.50	kg
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	kg
EJECUTADO ESTE PERÍODO	2,196.99	kg
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	2,196.99	kg
A COBRAR ESTE PERIODO	2196.99	kg

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 5,426.57**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZ...

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO

CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA

PLANILLA DE HIERRO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N.1

Mc	ϕ (mm)	Tipo	No.	DIMENSIONES						Longitud desarrollo	Longitud total	Peso Kg
				a	b	c	d	g	Tras			
PLINTOS												
100	12	C	324	1.10	0.15	0.15				1.40	453.60	402.80
CADENAS												
200	12	L	24	11.90	0.10					12.00	288.00	255.74
201	12	L	24	0.95	0.10					1.05	25.20	22.38
202	12	L	8	11.90	0.10					12.00	96.00	85.25
203	12	L	8	8.30	0.10				0.60	9.00	72.00	63.94
204	12	C	8	4.20	0.10	0.10				4.40	35.20	31.26
205	8	O	576	0.15	0.15	0.15	0.15	0.10		0.70	403.20	159.26
COLUMNAS												
300	14	L	48	4.64	0.30					4.94	237.12	286.44
301	12	L	24	4.64	0.30					4.94	118.56	105.28
303	14	L	12	6.69	0.30					6.99	83.88	101.33
304	12	L	12	6.69	0.30					6.99	83.88	74.49
305	14	L	12	5.69	0.30					5.99	71.88	86.83
306	12	L	12	5.69	0.30					5.99	71.88	63.83
302	10	O	861	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10		0.80	688.80	424.99
CHICOTES												
18	8	L	168	0.40	0.10					0.50	84.00	33.18

RESUMEN DE HIERRO

Diam		6	8	10	12	14	16	18	20	25	28	RESUMEN TOTAL HIERRO (Kg)
Elemen												
Peso/ml		0.222	0.395	0.617	0.888	1.208	1.578	1.998	2.466	3.853	4.834	
Long	(m)	0.00	487.20	688.80	1244.32	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Peso	(Kg)	0.00	192.44	424.99	1104.96	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2196.99

CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

ING. ANDRES CHIQUITO
RESIDENTE

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓ

ING. CARLOS VELEZ
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**


PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1


UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Hierro estructural fy=4200 kg/cm2
UNIDAD: kg
PRECIO UNITARIO: $ 2.47


GRAFICO:

DETALLE PARILLLA PLINTO

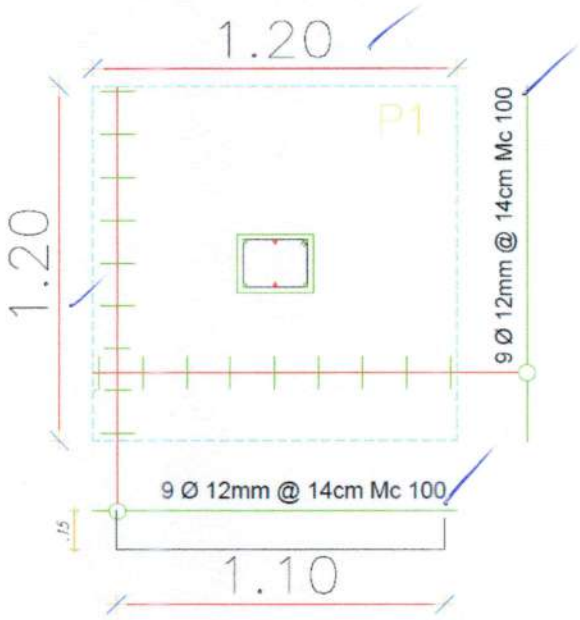



DETALLE CADENA



DETALLE COLUMNA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAG(		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Hierro estructural fy=4200 kg/cm2

UNIDAD: kg

PRECIO UNITARIO: $ 2.47

GRAFICO:





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		


RUBRO: Hierro estructural fy=4200 kg/cm2

UNIDAD: kg

PRECIO UNITARIO: $ 2.47

GRAFICO:



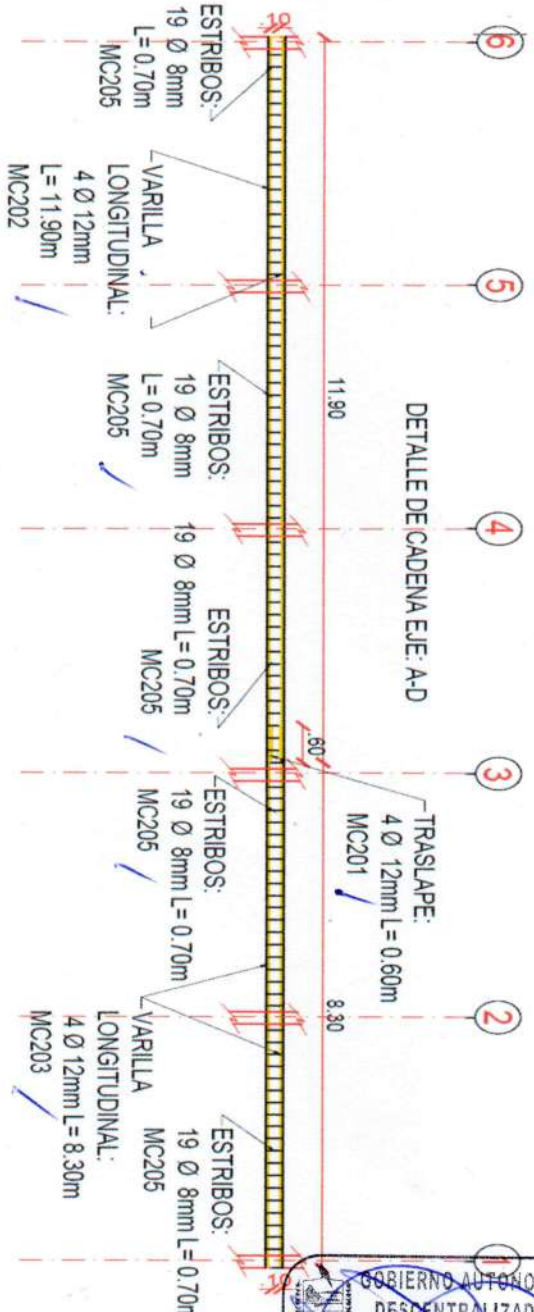

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1


UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Hierro estructural fy=4200 kg/cm2

UNIDAD: kg

PRECIO UNITARIO: $ 2.47

GRAFICO:

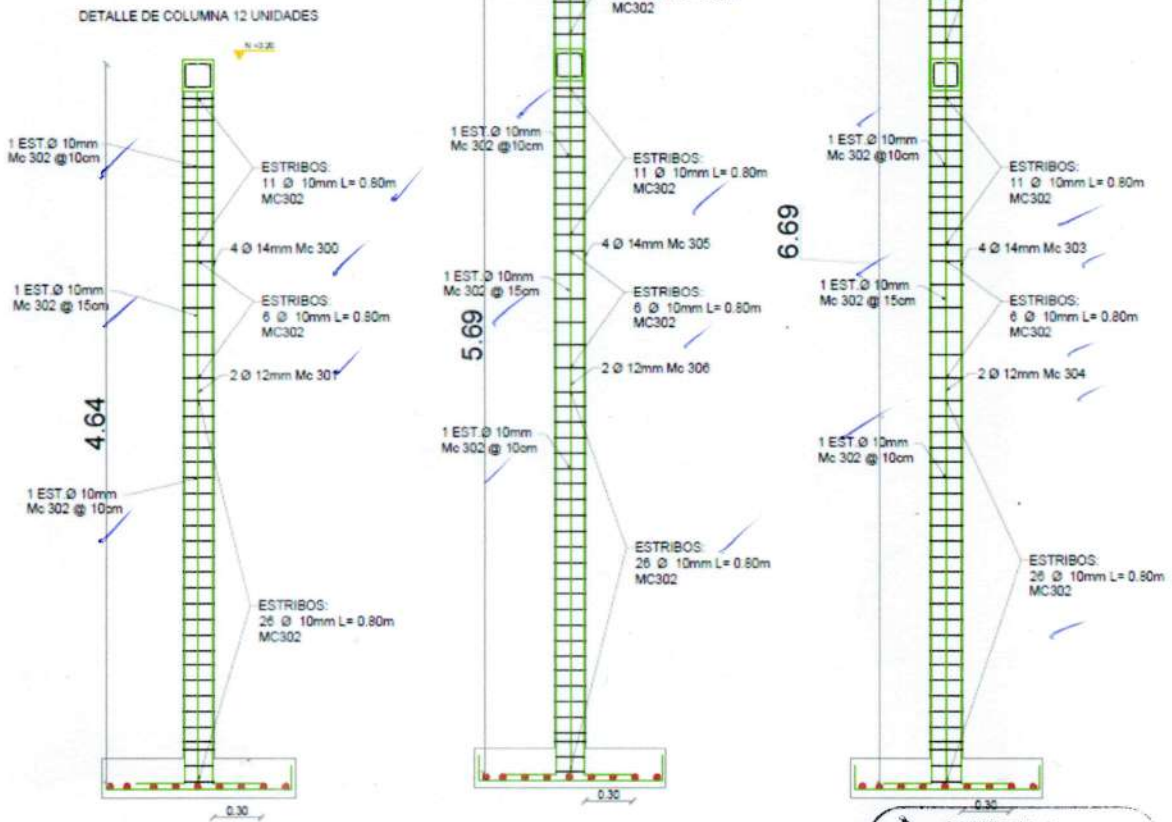

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAG(		
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Relleno con matrial petreo (compactado)

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 34.59

GRAFICO:

VER DETALLE ADJUNTO

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
AREA A1: EJE: 6-5-4-3-2	4	3.80	11.75	0.50	22.33	89.32
AREA: A2 EJE: 1-2	3	3.80	3.75	0.40	5.70	17.10
				SUBTOTAL		**106.42**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	125.05	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	106.42	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	106.42	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	106.42	m3
VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$	**$**	**3,681.07**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

PLANILLA No. AVANCE DE OBRA 1

UBICACIÓN : PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO

FECHA DE PRESENTACION : 05-ene-26

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA

PERIODO DE EJECUCION : 17-12-2025 al 31-12-2025

ADMINISTRADORA CONTRATO: ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO

FISCALIZADOR DE OBRA: ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS

MONTO CONTRATO: $ 88,234.93380

PLAZO EJECUCION : 90 Dias


FECHA DE SUSCRIPCION: 21-jul-25

RUBRO: Relleno con matrial petreo (compactado)

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 34.59

GRAFICO:

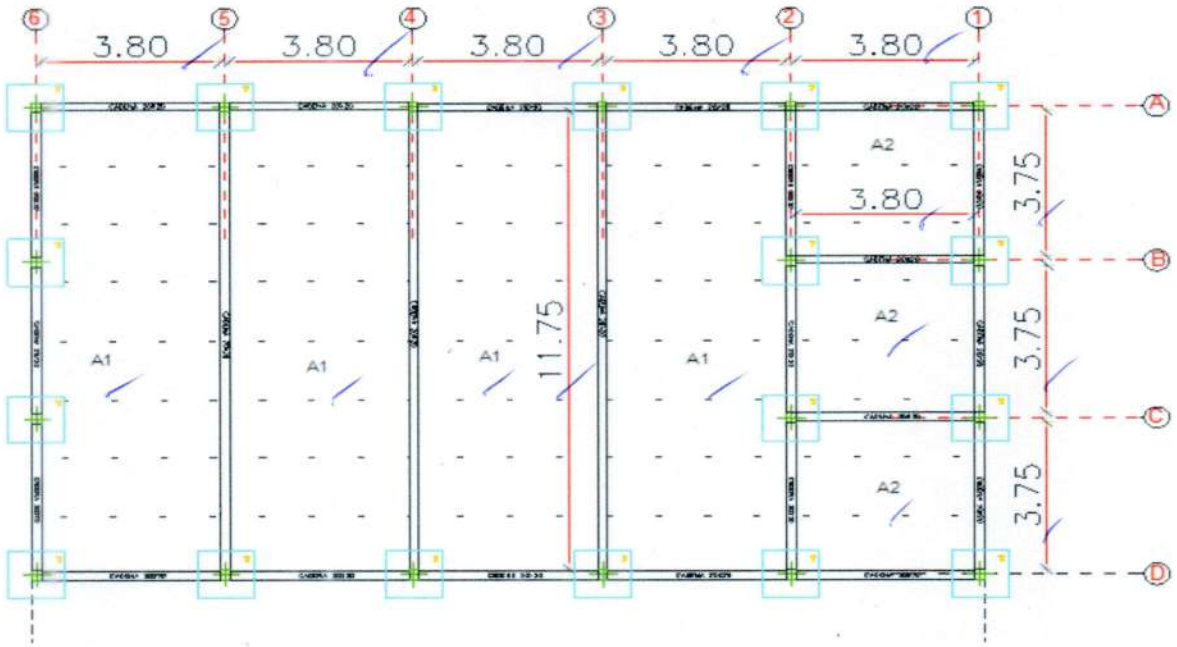





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**


		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAG(	**FECHA DE REINGRESO:**	
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		


RUBRO: Relleno compactado con material de sitio

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 13.45

GRAFICO:

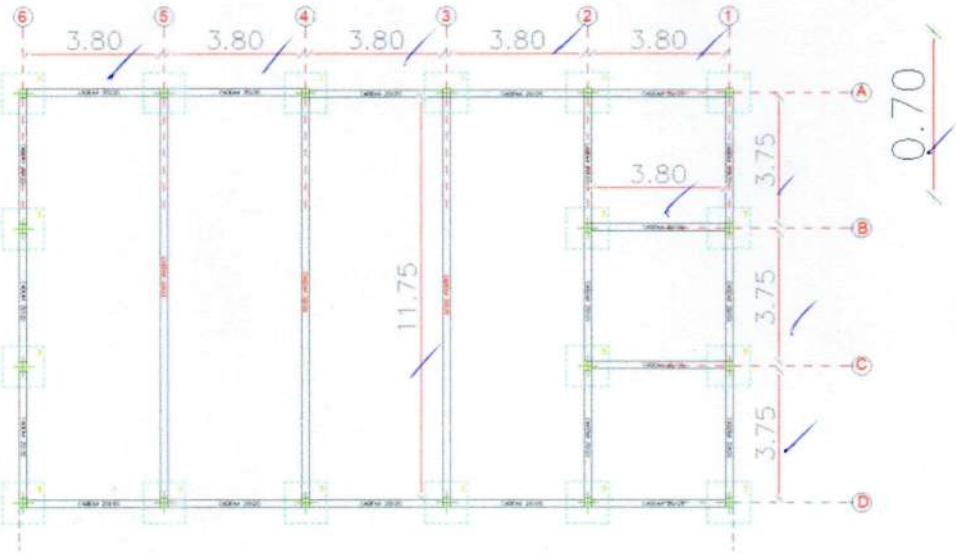

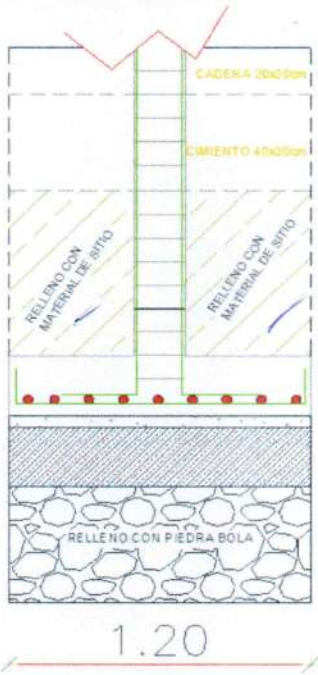

DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS (U)	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANTIDAD PARCIAL (M3)	CANTIDAD TOTAL (M3)
Relleno de plintos	18	1.20	1.20	0.70	1.01	18.18
Descuento Area columna	18	0.25	0.20	0.70	0.04	0.72
				SUBTOTAL		**17.46**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	37.15	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	17.46	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	17.46	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	17.46	m3

VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$ **$ 234.84**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO UNIDAD DE FISCALIZACIÓN LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO.

CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

PROYECTO :	**CONTRATO PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA TALLER PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES SINCHI LLANKAK WARMIKUNA, EN LA COMUNIDAD 24 DE MAYO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE DAHUANO, CANTÓN LORETO, PROVINCIA DE ORELLANA**

		PLANILLA No.	AVANCE DE OBRA 1
UBICACIÓN :	PARROQUIA SAN JOSE DE DAHUANO-COMUNA 24 MAYO	**FECHA DE PRESENTACION :**	05-ene-26
CONTRATISTA :	CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	**PERIODO DE EJECUCION :**	17-12-2025 al 31-12-2025
ADMINISTRADORA CONTRATO:	ING. BELEN STEFANIA PARRAGA INTRIAGO	**FECHA DE REINGRESO:**	
FISCALIZADOR DE OBRA:	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS		
MONTO CONTRATO:	$ 88,234.93380	**PLAZO EJECUCION :**	90 Dias
FECHA DE SUSCRIPCION:	21-jul-25		

RUBRO: Desalojo de material sin clasificar restante de excavaciones

UNIDAD: m3

PRECIO UNITARIO: $ 9.74

GRAFICO:





DESCRIPCION	NUMERO ELEMENTOS	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD PARCIAL	CANTIDAD TOTAL
	(U)	(M)	(M)	(M)	(M3)	(M3)
Desalojo	1	4.00	3.00	1.55	18.60	18.60
				SUBTOTAL		**18.60**

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
CANTIDAD CONTRATADA	18.54	m3
TOTAL EJECUTADO ANTERIOR	0.00	m3
EJECUTADO ESTE PERÍODO	18.60	m3
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	18.60	m3
A COBRAR ESTE PERIODO	18.60	m3
VALOR DEL RUBRO EN ESTA PLANILLA USD.$	**$**	**181.16**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LORETO
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
LORETO - ORELLANA - ECUADOR

CONSTRUCCIONES FRANCAZU CIA LTDA	ING. ANDRES CHIQUITO	ING. CARLOS NORBERTO VELEZ BURGOS
CONTRATISTA	**RESIDENTE**	**FISCALIZADOR**
